



Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Projektant: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zhotoviteľ stav. objektu: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Dodatok – v zmysle pripomienok STD

Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt : SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“

Vypracoval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. STRABAG s.r.o.	Kontroloval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Schválil za stavebný dozor: Mgr. Ivana Šimková, PhD. Slovenská správa ciest - IVSC
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Dátum: 1.10.2018	Dátum: 1.10.2018	Dátum: 29.10.2018
Zväzok č.:		



OBSAH DOKUMENTÁCIE KVALITY STAVBY

V dodatku dokumentácie kvality boli doplnené:

1. Vyhodnotené KSP, TP
2. Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k štrkodrvine a UMŠD z Čiernych Kľačian
3. Bolo zrealizované zatrávnenie svahov hydroosevom

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Dneňova 27, 826 56 Bratislava							Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -			
boprastrav		STRABAG								
Hodnotený prvok		Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania		Početnosť skúšok	Počet skúšok			
A		B	C	D	F	H	I			
Prípravné práce										
1	Geodetické a vytyčovací práce	1	kpl	vytyčovací protokol protokol o vytyčení IS		pred začatím	1			
2	Dopravné a inžinierske opatrenia	1	kpl	vizuálne		pred začatím	1			
3	Zabezpečenie staveniska	1	kpl	vizuálne		priebežne	1			
Zemné práce										
4	Zlepšenie zeminy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix hr. 500 mm	5 139,0	m3	posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch		1/druh	1			
				pevnosť hydraulického spojiva		1 x mesačne	1 x mesačne			
				vlhkosť		2x denne	2x denne			
				kalifornský pomer únosnosti CBR		1x za dva dni	1x za dva dni			
				dávkovanie spojiva		1 x denne	zápis v SD			
				únosnosť		1 sk./2000 m2	6			
5	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením (sanácia podložia) + násyp (mimo aktívnej zóny)	11 228,0	m2	miera zhutnenia		1 sk./1000 m3 (1sk./1500 m2)	6			
				index okamžitej únosnosti IBI		1x denne	1x denne			
				posúdenie vhodnosti materiálu		každý druh sypaniny	1			
				miera zhutnenia/únosnosť		1 sk./2000 m3	5			
				zrntosť		1sk/5000 m3	2			

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo Únieňova 27 826 56 Bratislava  									
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -									
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Vyhodnotenie		
A	B	C	D	F	H	I	Vyhovujúce	Nevyhovujúce	Opravné
6	Násyp so zhutnením (mimo aktívnej zóny)	112	m3	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	x	x
				mera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m3	1	dokladované v rámci sanácie	x	x
				zrznosť	1sk/5000 m3	1		x	x
				posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	x	x
7	Aktívna zóna vozovky - úprava pláne so zhutnením v násypoch	4 250	m3	mera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	9	7 SZS	x	x
				rovinatosť priečna	po 100 m	priebežne	1	x	x
				rovinatosť pozdĺžna	po 100 m	priebežne	1	x	x
				zrznosť	1sk/5000 m3	1	15 SZS	x	x
		8 407	m2	celistvosť povrchu	priebežne vizuálne		priebežne	x	x
				posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	priebežne	x	x
8	Úprava pláne so zhutnením v násypoch	9 029	m2	mera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	9	10 SZS	x	x
				zrznosť	1sk/5000 m3	2	2	x	x
				celistvosť povrchu	priebežne vizuálne		1	x	x
9	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie geotextiliou a geomrežovinou	11 231	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x
10	Spevňovanie hornín a konštrukcii - Geotextilie, geomreže	550	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56, Bratislava							Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -			
Hodnotený prvok		Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok				
A	B	C	D	F	H	I				
11	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosevom	3 535	m2	miešací protokol, skúšky kľúčivosti, uznávací list, posúdenie vzorky osiva	každá dodávka	1				
Vozovka a prístupov										
12	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra UMŠD 0-31,5 Gc	1569,72 m3; 7998m2	m3	posúdenie vhodnosti materiálu; vyhlásenie o parametroch	1/ druh	1				
				zrinitosť	1 sk./1000m3	2				
				vlhkosť zmesi	2 sk/ deň	2 sk/ deň				
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1500 m2	6				
				hrúbka vrstvy, odchýlka od priečného sklonu max. (%) (niveláciou)	po 100 m	geodetické zameranie				
13	Spevnenie krajnic štrkodrinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.200 mm	266 + 119	m3	nerovnosť - priečna	po 100 m	po 100 m				
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne				
				posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1				
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m2 (pre nepriame metódy je potrebný trojnásobný počet skúšok)	6 x LDD (po o100m)				
				posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch	1/druh	1				

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Drienčova 27, 826 56, Bratislava doprastav STRABAG Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -						
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok
Vyhodnotenie						
A	B	C	D	F	H	I
19	Ložné vrstvy z asfaltových zmesasfaltový betón modifikovaný AC 22 L; PMB 45/80-75;I,hr. 60mm	432,73m ³ ; 1058,4t; 6151 m ²	m ² t m ³	vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	1sk/600t	2
				vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	1sk/300t	3
				rozbor asfalt. zmesi	1 sk./ 500 t	2
				objemová hmotnosť, medzerovitost'	1 sk./ 500 t	2
				pomer pevnosti v priečnom ťahu (citlivosť na vodu)	1 sk./ 5000 t	1
				miera zhutnenia vrstvy na vyvrtoch	1 sk./ 2000 m ²	4
				meranie teploty zmesi	1sk/auto	
				hrúbka vrstvy (vývrt alebo niveľáciou)	1 sk./ 2000 m ²	4
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne
				nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m
				max.pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air	1/3000 t	1
				max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air	1/3000 t	1
				geodetické zameranie	každú vrstvu	geodeticky
				vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	variant asfaltovej zmesi	1
				zhutňovací pokus	variant asfaltovej zmesi	1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Dnešná 27, 826 96 Bratislava										Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -									
 																			
Hodnotený prvok		Množstvo		M.j.		Opis skúšky/merania		Početnosť skúšok		Počet skúšok									
A	B	C	D	F	H	I													
20	Obrusné vrstvy z asfaltových zmesí, asfaltový koberec masťový modifikovaný SMA 11 O; PMB 45/80-75; I, hr. 40 mm	243,24m3; 595,9t; 6081m2	m2 t m3	vstupné matriály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	1sk/2000t	1													
				vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/600t	1													
				vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/300t	1													
				rozbor asfalt. zmesi	1 sk./ 500 t	1													
				miera zhutnenia vrstvy (resp. vodonepriepustnosť)	1 sk./ 1000 m2	4													
				objemová hmotnosť, medzerovitost'	1 sk./ 500 t	1													
				hrúbka vrstvy (niveláciou)	1 sk./ 2000 m2	2													
				meranie teploty zmesi	1sk/auto														
				stekavost'	5000t	1													
				min a max. percento medzier v kam. vyplnených asfaltom	500t	1													
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne													
				nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m													
				max.pomerčná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air	1/5000 t	1													
				pomer pevnosti v prietom ťahu (citlivosť na vodu)	1 sk./ 3000 t	1													

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Dnešova 27 820 56 Bratislava  										Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -			
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Vyhodnotenie						
							Vyhovujúce	Nevyhovujúce	Opravné				
A	B	C	D	F	H	I							
				max. sklon vyjazdenej kolaje WTS air	1/5000 t	1	1	x	x				
				geodetické zameranie	každú vrstvu	každú vrstvu	každú vrstvu	x	x				
21	Zvodidlá oceľové		m	TPV výrobca + vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
22	Smerový stĺpik	428	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
23	Zvodidlá - príslušenstvo	34	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
24	Studne, betónové skruže celokruhové	3	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
25	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné gombíky	46	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
26	Dopravné značky, zvislé + veľkorozmerové	84 + 1	kus	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
27	Dopravné značky, vodorovné striekané a náterové	302,67	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
28	Otvorené žľaby z bet.tvárníc	8	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
29	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	68	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x				
30	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných	28	m2	STV betón + VoP	trieda a typ betónu	1	1	x	x				

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27 826 56 Bratislava  		Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ - KSP -					Vyhodnotenie		
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Vyhovujúce	Nevyhovujúce	Opravné
A	B	C	D	F	H	I			
31	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	388	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x

Predmet: RE: stanovisko ku zmene nivelety - vysok SO 114-00

Od: Filo Ladislav Ing. <FILO@dopravoprojekt.sk>

Dátum: 11. 6. 2018 12:43

Pre: "putirka.dusan@gmail.com" <putirka.dusan@gmail.com>

Kópia: Kodajová Marta Ing. <KODAJOVA@dopravoprojekt.sk>

Dobrý deň,

posielam stanovisko projektanta SO 114 k zmene nivelety vozovky:

Kedže zmenou výšky nivelety vozovky v lokálnych úsekoch (miestach) SO 114 voči PD (o max. 20 mm) nedošlo k zmene sklonových pomerov vozovky voči PD, a zároveň to nemá vplyv na súvisiace stavebné objekty, voči zmene nivelety výšky vozovky SO 114 nemáme námietky.

S pozdravom

Ing. Ladislav Filo

- projektant pozemných komunikácií -

DOPRAVOPROJEKT a.s.

DIVÍZIA Bratislava I

Kominárska 2,4 832 03 Bratislava

e-mail: filo@dopravoprojekt.sk

tel.: +421-2-502 34 255

mobil: 0915 834 008

fax: +421-2-555 74 396

From: Kodajová Marta Ing.

Sent: Monday, June 11, 2018 12:17 PM

To: Filo Ladislav Ing.

Subject: FW: stanovisko ku zmene nivelety - vysok SO 114-00

Odoslané z môjho smartphonu Sony Xperia™

----- Pôvodná správa -----

Predmet: stanovisko ku zmene nivelety - vysok SO 114-00

Odoslané: 11. 6. 2018 11:22 AM

Od: Dušan Putirka <putirka.dusan@gmail.com>

Komu: "Kodajová Marta Ing."

<KODAJOVA@dopravoprojekt.sk>, marta.kodajova@dopravoprojekt.sk

Kópia:

Dobrý deň pani Ing. Kodajová,

pri realizácii vrstvy CBGM na SO 114-00 došlo k jej navýšeniu v lokálnych úsekoch (miestach) o hrúbku +20mm orpoti PD, čo bolo zistené následne až po zrealizovaní vrstvy AC 22 P, kde lokálne hrúbky vrstvy ACP boli miestami 55 mm (namiesto 70mm resp 0,9h= 63mm). Zhotoviteľ preto navýšil hrúbku vrstvy AC 22 L v lokálnych úsekoch max. 20mm, aby bola dodržaná hrúbka asfaltových vrstiev vozovky. Uvedeným navýšením nedochádza ku zmene sklonových pomerov komunikácie (tie sú zrealizované

v súlade s PD) však dochádza ku zmene nivelety vozovky. Dovoľujem si Vás preto požiadať o písomné stanovisko ku zmene výšky nivelety vozovky.

ďakujem a prajem pekný deň

D. Putírka




Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Projektant: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zhotoviteľ stav. objektu: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt : SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“

Vypracoval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. Doprastav a.s.	Kontroloval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Schválil za stavebný dozor: Mgr. Ivana Šimková, PhD. Slovenská správa ciest - IVSC
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Dátum: 15.6.18	Dátum: 15.6.18	Dátum: 29.10.2018
Zväzok č.:		



OBSAH DOKUMENTÁCIE KVALITY STAVBY

1. Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov
2. Protokoly skúšok
3. Vyhodnotené KSP, TP
4. Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k použitým materiálom



1. SPRÁVA K DOKUMENTÁCII KVALITY STAVEBNÝCH PRÁČ A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)
Kraj, VÚC: Nitriansky
Okres: Nitra
Katastrálne územie: k.ú. Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor
Charakter stavby: novostavba
Kategória cesty: MZK 12/40

Stavebník:

Názov a adresa: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Projektant:

Hlavný projektant: Ing. Marta Kodajová
Názov a adresa: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava



ZAKLADNÉ ÚDAJE

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra - Sever, v blízkosti obcí Lužianky, Drážovce a katastrálnych územiach: Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor. Z dôvodu zvýšenia dopravných nárokov, súvisiacich s výstavbou a prevádzkou strategického parku bolo potrebné vybudovať novú cestnú infraštruktúru aj mimo samotný priemyselný park s napojením na nadradenú cestnú sieť (cesta I/64 a rýchlostná cesta R1A) ale aj na ostatné jestvujúce komunikácie v dotknutom území. Predmetom tohto projektu bolo zriadenie trvalej cestnej infraštruktúry pre tento strategický park, vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien, prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do ciest.

Predmetom tohto projektu je zriadenie trvalej cestnej infraštruktúry pre tento priemyselný park, vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do budúcich ciest.

Prepojenie obchvatu Dražoviec (SO 101) v mieste napojenia so strategickým parkom - vstup „VACP4“ bude zabezpečené prostredníctvom účelovej komunikácie vybudovanej v rámci stavebného objektu 114. Jedná sa o komunikáciu s krajnicami kategórie MZK 12/40. Komunikácia bude na začiatku úseku nadväzovať na areálovú komunikáciu priemyselného parku (vstup „VACP4“). Na konci úseku sa bude navrhovaná miestna komunikácia napájať prostredníctvom okružnej križovatky „B“ (rieši SO 106) na

obchvat Dražoviec (rieši SO 101).

Súčasťou objektu 114 (v km 0,029) je aj vetva „B“, t. j. zárodok komunikácie, ktorá bude výhľadovo slúžiť pre prepojenie komunikácie s parkoviskom TIP navrhovaným severne od objektu 114. Vetva „B“ je navrhnutá v kategórii MZK 12/40. Do doby kým sa na zárodok nenapojí plánovaná komunikácia, vybuduje sa v rámci objektu 114 na konci vetvy „B“ zjazd pre vozidlá na úroveň existujúceho terénu, čím sa zabezpečí prístup na pozemky.

Súčasťou objektu 114 je aj vybudovanie zjazdov pre vozidlá údržby (vetvy „C“ a „D“) k šachtám na vodovodoch (riešia objekty SO 551 a SO 552) v km 0,390 vľavo aj vpravo z navrhovanej účelovej komunikácie.

Súčasťou objektu 114 je aj vybudovanie zjazdu pre zabezpečenie prístupu vozidiel (vetva „E“) k inžinierskym sieťam v km 0,016 vľavo z navrhovanej účelovej komunikácie.

Základné údaje:

Kategória: MZK 12/40

Celková dĺžka: 0,435 km (celková dĺžka riešeného úseku)

Križovatky: napojenie trasy na KÚ na okružnú križovatku
v km 0,025 výhľadovo 1x styková križovatka

SO 114 - účelová komunikácia komunikácia MZK12/40. Dĺžka v osi je 458,42 m (vrátane kruhového objazdu); dĺžka stavebnej úpravy je 435,42 m. Na ZÚ (km 0,000) smerovo aj výškovo nadväzuje miestna komunikácia na areálovú komunikáciu (vstup „VACP4“) do areálu priemyselného parku. Ďalej komunikácia vedie pravotočivým oblúkom $R=16$ m (vjazd do areálu), následne v priamej a pokračuje dvomi protismernými oblúkmi o polomere $R=190$ m. Na KÚ stavebná úprava smerovo aj výškovo nadväzuje na kruhový objazd okružnej križovatky „B“ (SO 106).

Odhumusovanie

Pri trvalom zábere pôdy, ktorý bude slúžiť pre konštrukciu cestného telesa sa humózná vrstva odstránila a uložila na skládky humusu. V rámci stavby boli plochy určené pre skládky humusu navrhnuté rovnomerne po celej dĺžke trasy. Zhrnutá vrstva humusu sa z časti použila pre ďalšie stavebné práce v rámci SO 114 (zahumusovanie svahov cestného telesa). Prebytok humusu sa použil na zahumusovanie v iných objektoch stavby resp. na zahumusovanie plôch medzi objektmi.



V rámci predmetného objektu bolo zrealizované odhumusovanie v hrúbkach podľa Pedologického prieskumu. Odhumusovanie je riešené v trvalom zábere trasy SO 107.

Sanácia podložia TYP 0

Sanačné opatrenie typu 0 predstavovalo zlepšenie podložia zemného telesa s hrúbkou cca 0,95 m, zeminu zlepšenú hydraulickým spojivom, 1x dvojsoú geomrežu a vrstvu štrkodrvy s hrúbkou 0,45 m. Pôvodný terén sa najprv odhumusovalo v hrúbke podľa pedologického prieskumu. Na takto pripravenom podloží sa zlepšili parametre zeminy hydraulickým spojivom pomocou prefrézovania do hĺbky 0,50 m. Následne sa uložil a zhutnil presyp so štrkodrvy s hrúbkou 0,15 m. Položila sa dvojsoú geomreža ARMATEX G65/65. Následne sa zrealizovala 0,30 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutnená. Štrkodrava sanačnej vrstvy podložia je fr.0-63 mm. Na takto pripravené vymenené podložie sa umiestnila prvá vrstva násypu s hrúbkou 0,30 m.

Sanácia podložia TYP 0 je navrhnutá na celom úseku SO107 úsek I. aj II.:

Zemné teleso

Plán násypu bola tvorená sanačnou vrstvou. Požiadavky na druh podkladu a minimálny modul deformácie $E_{def,2}$ boli stanovené normou STN 73 61 33 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií. Vzhľadom na roznos zaťaženia, veľkosť zaťaženia od dopravy, ako aj skutočnosť, že úprava podložia bola v mnohých prípadoch súčasťou zemného telesa, bola únosnosť navrhovaná na hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. V miestach nízkych násypov, kde dochádza ku kontaktu zemnej pláne a podložia bolo nevyhnutné dosiahnuť hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 90 \text{ MPa}$.

Zemné teleso sa budovalo so sklonom svahov 1:2. Zemné teleso sa budovalo po vrstvách. V úsekoch, kde je medzi sanačnou vrstvou a pláňou vozovky mocnosť vrstvy menšia ako 0,80 m, bolo potrebné zemné teleso budovať z vhodného štrkovitého materiálu.

Konštrukcia vozovky

- asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5
 - spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 22 L; PMB 45/80-75; I; 70 mm; STN EN 13108-1
 - spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 22 P; 35/50; I; 70 mm; STN EN 13108-1
 - infiltračný postrek PI; PMB 0,8 kg/m²; STN 73 6129
 - cementom stmelená zmes CBGM C5/6 0/31,5; 200 mm; TKP časť 5; STN 73 6124-1
 - štrkodrvina UM ŠD; 0/31,5 Gc; min. 220 mm; TKP časť 5; STN 73 6126
- Celková hrúbka konštrukcie min. 600 mm

Dopravný deliaci ostrovček medzi vjazdom a výjazdom do/z okružnej križovatky bol riešený ako vyvýšený spevnený a farebne (červená farba) odlišený od vozovky. Konštrukcia asfaltovej vozovky bola od spevnených ostrovčekov oddelená cestnými nájazdovými betónovými obrubníkmi v betónovom lôžku s bočnou oporou v úrovni vozovky, čím vzniklo prevýšenie + 10 cm na obrubníku voči vozovke.

Konštrukcia asfaltovej vozovky na kruhovom objazde je od konštrukcie spevneného prstenca oddelená cestným betónovým nájazdovým obrubníkom výšky 10/15 cm uloženým vodorovne do betónového lôžka s bočnou oporou v úrovni vozovky, čím vzniklo prevýšenie +5 cm na obrubníku voči vozovke.

Riešenie odvodnenia

Vo všeobecnosti je odvodnenie navrhnuté pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky v zmysle dodržania minimálneho výsledného sklonu 0,50 %. Dažďová voda je odvádzaná samovoľným odtokom z vozovky



do uličných vpustí.

Proti škodlivému pôsobeniu podzemných vôd je plán vozovky navrhnutá v základnom priečnom sklone 3,00 % v zmysle normy STN 73 6101. Cez ochrannú vrstvu vozovky s drenážnou funkciou dôjde v prípade veľmi nepriaznivého vodného režimu k odtekaniu podzemnej vody po svahu násypu do príslušného terénu.

Vodiace bezpečnostné zariadenia

Ako vodiace bezpečnostné zariadenia boli zrealizované na oceľových zvodidlách smerové nadstavce zvodidlové. Keďže hranicu voľnej šírky bude vymedzovať zvodidlo, umiestnili sa odrazky vo funkčnom usporiadaní stanovenom smerovými stĺpikmi na nadstavci smerového stĺpika zvodnice, kvôli zabezpečeniu plynulého výškového optického vedenia. V úsekoch, kde neboli osadené v nespevnenej krajnici oceľové zvodidlá, boli pozdĺž komunikácie po oboch stranách, v nespevnenej krajnici, osadené plastové smerové stĺpiky, vo vzdialenostiach podľa STN 73 6101. Vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov sa vždy meria v osi jazdného pásu. Z dôvodu správnej orientácie vodiča sa smerové stĺpiky osadzujú oproti sebe, t.j. v tom istom priečnom reze. Vodiace dopravné zariadenia boli osadené v odstupe v súlade s STN 73 6101. Vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov bola zrealizovaná podľa nasledovných zásad:

- v priamej a pri smerových oblúkoch $R \geq 1250$ m 50 m
- v smerových oblúkoch $1250 > R \geq 850$ m 40 m
- v smerových oblúkoch $850 > R \geq 450$ m 30 m
- v smerových oblúkoch $450 > R \geq 250$ m 20 m
- v smerových oblúkoch $250 > R \geq 50$ m 10 m
- v smerových oblúkoch $R \leq 50$ m 5 m

Ako vodiace bezpečnostné zariadenia boli zrealizované aj retroreflexné dopravné gombíky bielej farby (trvalé liatinové oká so zapustením do vozovky odolné voči pluhovaniu pluhom s oceľovým britom).

Dopravné značenie

Komunikácia bola vybavená zvislým a vodorovným dopravným značením. Požadovalo sa vodorovné dopravné značenie realizovať z dvojzložkového materiálu, v plastovom prevedení, vodiace čiary s akustickým prevedením. Pred použitím plastového VDZ bude realizovaný nástrek jednozložkovou farbou. Definitívne (trvalé) dopravné značenie celej stavby bude realizované po vyzretí ohrsenej asf.vrstvy.

Trvalé dopravné značky boli zrealizované v stupni reflexnosti 2.

Zahumusovanie

Na záver prác sa zahumusovali všetky svahy cestného telesa humusom hrúbky min. 0,20 m. Stredový ostrovček sa zahumusoval humusom hrúbky min. 0,40 m. Plocha nad zasypaným korytom potoka sa zahumusovala v hrúbke min. 0,20. Po výstavbe objektov druhej fázy sa zahumusujú plochy medzi objektmi v hrúbke min. 0,20 m a následne sa zatravnia hydroosevom. Zemina určená na zahumusovanie pochádza zo skládky, na ktorej bola zemina riadne ošetrovaná.

Zatravnenie

Na pripravených plochách, z ktorých boli vyzbierané kamene nachádzajúce sa na povrchu a, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatravnenie metódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom nanosení osiva, vody, umelých hnojív, rašeliny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií.

Zatravnenie svahov ku dňu odovzdávania dokumentácie kvality nebolo realizované.

Na zatravnenie bola navrhovaná zmes trávnych semien pre suché a extenzívne podmienky v zmysle TP04/2010 v zložení:



- 30 % kostrava červená trsnatá Festuca rubra commutata
- 30 % kostrava ovčia Festuca ovina
- 20 % kostrava červená výbežkatá Festuca rubra rubra
- 10 % lipnica lúčna Poa pratensis
- 10 % mätonoh trváci Lolium perenne

Odrody navrhovaných druhov tráv budú vyberané z listiny povolených odrôd a pred výsevom budú odsúhlasené s obstarávateľom stavby. V prípade, že plocha určená na zakladanie trávniku bude zaburinená pýrom, alebo inými agresívnymi burinami, bude jednorázovo, alebo opakovane vykonaný postrek neselektívnym herbicídmi. Pre kvalitný vývoj trávniku je rozhodujúca intenzita údržby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a vyhrabávanie trávniku. Predmetné práce budú potrebné vykonávané dodávateľom až do doby preberacieho konania.

Záverečné hodnotenie

Výstavba stavebného objektu SO 114 Účelová komunikácia medzi Strategickým parkom a križovatkou „B“ bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie stupňa DRS s výnimkou zmien zakreslených v DSRS, zmluvných podmienok, platných TKP, STN. Všetky materiály boli zdokladované preukaznými skúškami, skúškami typu, príslušnými certifikátmi, vyhláseniami o parametroch, vyhláseniami o zhode a ich zabudovanie bolo overené kontrolnými a preberacími skúškami v zmysle kontrolno-skúšobného plánu stavebného objektu.

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



2. PROTOKOLY SKÚŠOK

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/Nevyhovuje
25.10.2017	249/1/2017/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, obsyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
7.2.2018	017/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, obsyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
12.2.2018	030/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, obsyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
20.2.2018	037/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, obsyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
12.6.2018	200/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
27.6.2018	219/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, obsyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
9.7.2018	233/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, obsyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
10.10.2017	231/1/2017/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	sanačná vrstva, násyp	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
24.10.2017	247/1/2017/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	-	-	v súlade s PST
25.10.2017	246/1/2017/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-125mm	1	-	-	v súlade s PST
20.2.2018	036/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	násyp, pláš	zrntosť	štrkodrvina fr. 0-125mm	1	-	-	v súlade s PST
9.11.2017	282/1/2017/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	nestmelená vrstva	zrntosť	UMŠD 0-31,5	1	-	-	v súlade s PST
17.11.2017	291/1/2017/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	nestmelená vrstva	zrntosť	UMŠD 0-31,5	1	-	-	v súlade s PST
27.6.2018	218/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	nestmelená vrstva	zrntosť	UMŠD 0-31,5	1	-	-	v súlade s PST
9.7.2018	234/1/2018/4.4/ZV	Objekty radu 100	stavba	nestmelená vrstva	zrntosť	UMŠD 0-31,5	1	-	-	v súlade s PST

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number: 249/1/2017/4.4/ZV

denník č./number of diary: 1/2017/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt/Object:	SO radu 100
Staničenie:	skládky	Konštrukcia/Construction:	násyp, obsyp, pláň
Názov výr./Product Name:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu/Date of sampling:	25.10.2017
Trieda / symgol	G3 G-F	Dátum skúšky/test date:	26.10.2017
Lokalita/Locality:	Pohranice	Dátum vystavenia/Date reported:	31.10.2017
Odobral/Sampler:	Zošiak	Odborný listok/Markings of sample:	235/2017/K 105/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure: žiadne	
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	
Merací prístroj/Measuring instrument:	sada sít	ZV1132-ZV1149	
	váha	ZV 1008	

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sít-size of sieve (mm)	základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku weight of residue (kg)	podiel zostatkov part of residues M _r (%)	celkový podiel prepadov-total part of ofqsiftings (%)
		0,0	0,0	100,0
125		0,000	0,0	100,0
90		0,000	0,0	100,0
63		0,000	0,0	100,0
45		3,650	5,8	94,2
31,5		9,364	15,0	79,2
22,4		8,156	13,0	66,1
16		8,062	12,9	53,3
11,2		6,315	10,1	43,2
8		6,028	9,6	33,5
5,6		5,210	8,3	25,2
4		3,157	5,0	20,1
2		2,445	3,9	16,2
1		1,953	3,1	13,1
0,5		1,736	2,8	10,3
0,25		1,167	1,9	8,5
0,125		0,615	1,0	7,5
0,063		0,203	0,3	7,2
Dno	0,0010	0,031	0,0	0,0

Čiara zrnitosti - grading curve

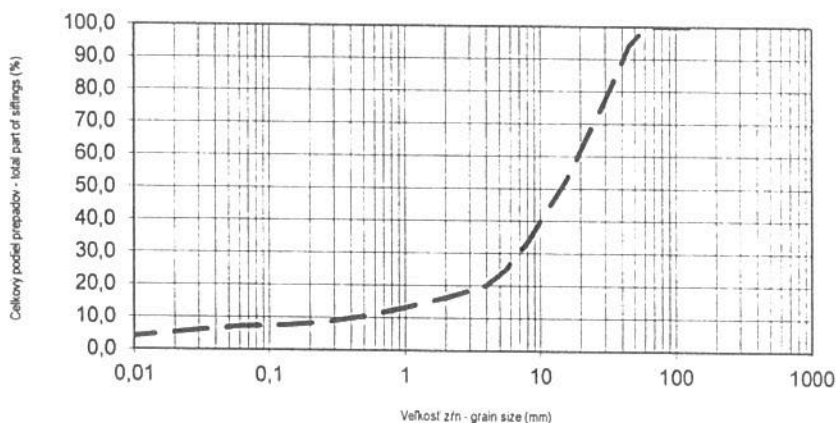

Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm	f = 7,2 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

Hmotnosť vz. M2	58,092	92,9
pod sítom 0,063	4,445	7,1
hmotn. vz. M1	62,537	100,0
Hmotnosť vz. M2	58,092	

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prírodná vlhkosť (%)	

Vyhodnotenie/Evaluation:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka :

veľkosť otvorov sít : základný súbor+súbor 1

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiaková
Skúšal/ Tested by:

Róbert Szúdor-vedúci OL
Kontroloval/Controlled by:

Doprastav

Odtlačok pečiatky/copy stamp

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Protokol o skúške


číslo: 017/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV

STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Staničenie:	skládka	Konštrukcia:	násyp, obsyp, pláň
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	7.2.2018
Trieda:	G3 G-F	Dátum skúšky:	13.2.2018
Lokalita:	lom Pohranice	Dátum vystavenia:	14.2.2018
Odobral ^{1/} :	Zošiak	Odborný listok:	15/2018/Z/ZV 9/2018/Nr
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:	Ev. karta meradla:		
sada sit	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť siete (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _x (%)	celkový podiel prepádov (%)	Číslo zrnitosti
	0,0	0,0	100,0	
	125	0,000	0,0	100,0
	90	0,000	0,0	100
D	63	0,620	1,3	99
	45	4,588	9,8	89
	31,5	6,375	13,7	75
	22,4	4,158	8,9	66
	16	4,317	9,3	57
	11,2	6,285	13,5	44
	8	3,024	6,5	37
	5,6	2,765	5,9	31
	4	2,884	6,2	25
	2	3,328	7,1	18
	1	1,983	4,3	14
	0,5	1,650	3,5	10
	0,25	0,875	1,9	8
	0,125	0,523	1,1	7
	0,063	0,216	0,5	6,6
Dno	0,0010	0,063	0,1	0,0
Hmotnosť vz. M2	43,654	93,6		
pod sílom 0,063	2,998	6,4		
hmotn. vz. M1	46,652	100,0		
Hmotnosť vz. M2	43,655			

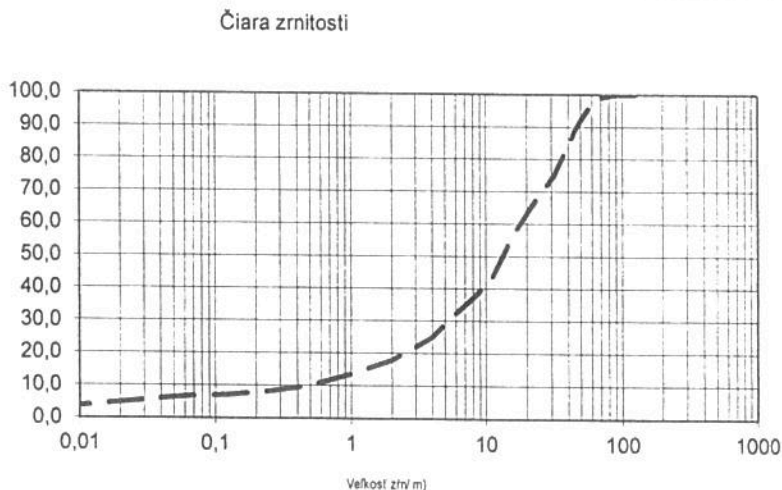

Podiel jemných zrn pod sílom < 0,063 mm	f = 6,6 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity/ limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný.

Hrončiaková
Skúšal:

Róbert Szúdor-vedúci OL
Kontroloval:

Protokol o skúške

číslo: 030/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Staničenie:	trasa km 0,860	Konštrukcia:	násyp , obsyp, pláň
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	12.2.2018
Trieda :	G3 G-F	Dátum skúšky:	20.2.2018
Lokalita:	lom Pohranice	Dátum vystavenia:	21.2.2018
Odobral ¹⁾ :	Zošiak	Odborný listok:	16/2018/Z/ZV 10/2018/Nr
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu: žiadne	
Merací prístroj:	Ev. karta meradla:		
sada sit	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sít (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _x (%)	celkový podiel prepadov (%)
	0,0	0,0	100,0
	125	0,000	100,0
	90	0,000	100
D	63	1,089	97
	45	3,987	87
	31,5	5,267	73
	22,4	3,624	64
	16	3,971	53
	11,2	4,993	41
	8	2,548	34
	5,6	1,875	29
	4	1,347	26
	2	2,841	18
	1	1,615	14
	0,5	1,220	11
	0,25	0,583	9
	0,125	0,211	9
	0,063	0,097	8,5
Dno	0,0010	0,041	0,0
Hmotnosť vz. M2	35,309	91,6	
pod sílom 0,063	3,231	8,4	
hmotn. vz. M1	38,540	100,0	
Hmotnosť vz. M2	35,309		

Čiara zrnitosti

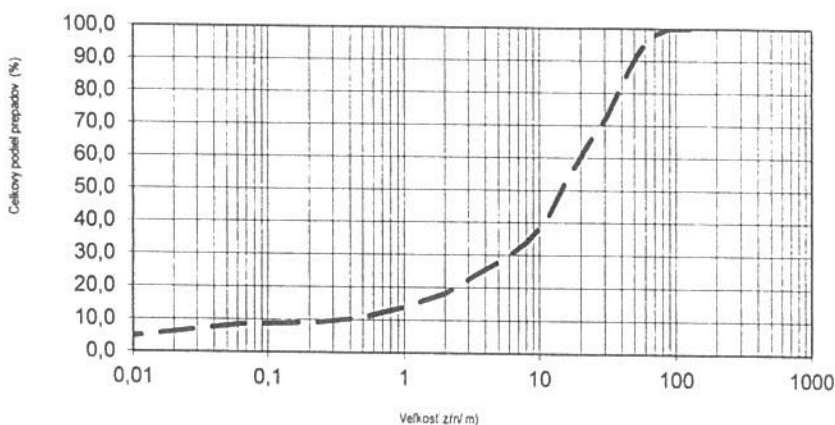

Podiel jemných zrn pod sílom < 0,063 mm	f = 8,5 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrmitosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sít : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť"

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný!

Hrončiaková
Skúšal:

Róbert Szűdor-vedúci OL
Kontroloval:

TESS
control

TESScontrol, s. r. o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Číslo účtu: 44110000000000000000

Protokol o skúške


číslo: 037/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV

STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Staničenie:	trasa -skládka	Konštrukcia:	násyp , obsyp, pláň
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	20.2.2018
Trieda :	G3 G-F	Dátum skúšky:	23.2.2018
Lokalita:	lom Pohranice	Dátum vystavenia:	26.2.2018
Odobral :	Zošiak	Odborný listok:	23/2018/Z/VZ 17/2018/Nr
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:	Ev. karta meradla:		
sada sít	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sít (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _x (%)	celkový podiel prepadov (%)
	0,0	0,0	100,0
	125	0,000	100,0
	90	0,000	100
D	63	1,584	96
	45	4,216	85
	31,5	5,378	71
	22,4	3,961	60
	16	3,768	50
	11,2	4,213	39
	8	2,576	32
	5,6	1,758	28
	4	2,445	21
	2	1,180	18
	1	1,026	16
	0,5	0,977	13
	0,25	0,785	11
	0,125	0,536	10
	0,063	0,207	9,0
Dno	0,0010	0,009	0,0
Hmotnosť vz. M2	34,619	91,0	
pod sítom 0,063	3,421	9,0	
hmotn. vz. M1	38,040	100,0	
Hmotnosť vz. M2	34,620		

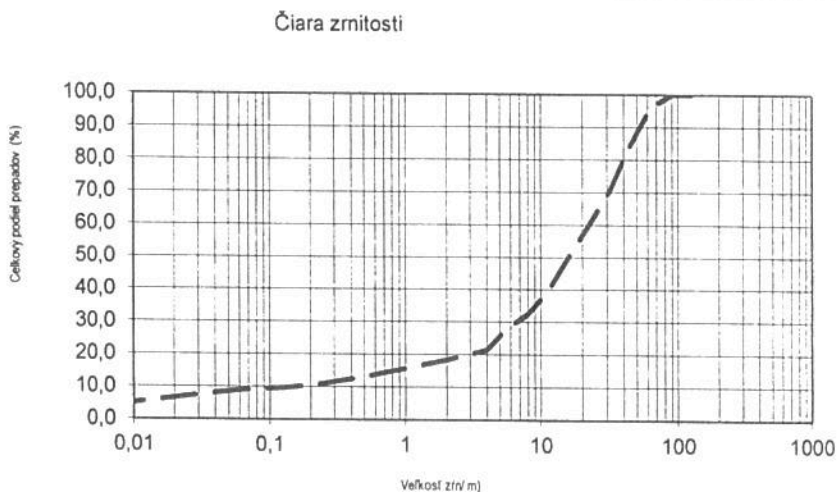

Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm	f = 9,0 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti / limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity / limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sít : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť "

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný i

Protokol o skúške

číslo: 200/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO radu 100
Staničenie:	skládka	Konštrukcia:	násyp
Názov výrobku:	ŠD 0/125 mm	Dátum odberu:	12.6.2018
Trieda:	G3 G-F	Dátum skúšky:	15.6.2018
Lokalita:	lom Hostie	Dátum vystavenia:	19.6.2018
Odobral:	Zošiak	Odborný listok:	141/2018/Z/ZV 80/2018/Nr
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:	Ev. karta meradla:		
sada sit	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sita (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _s (%)	celkový podiel prepádov (%)
	0,0	0,0	100,0
D 125	1,314	1,9	98,1
90	4,235	6,2	92
63	3,711	5,4	86
45	6,924	10,1	76
31,5	9,365	13,7	63
22,4	7,483	10,9	52
16	9,036	13,2	39
11,2	4,158	6,1	33
8	5,062	7,4	25
5,6	2,867	4,2	21
4	4,212	6,1	15
2	1,678	2,4	12
1	1,543	2,3	10
0,5	1,056	1,5	9
0,25	0,762	1,1	7
0,125	0,534	0,8	7
0,063	0,178	0,3	6,4
Dno 0,0010	0,102	0,1	
Hmotnosť vz. M2	64,220	93,7	
pod sitom 0,063	4,285	6,3	
hmotn. vz. M1	68,505	100,0	
Hmotnosť vz. M2	64,304		

Čiara zrnitosti

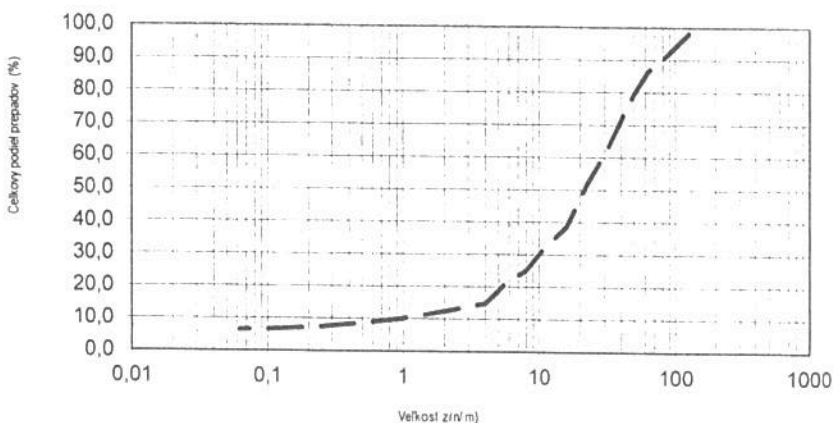

Podiel jemných zrn pod sitom < 0,063 mm	f = 6,4 %
Platnosť výsledkov:	0,1 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť "

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL

Hrončiaková
Skúšal:

Róbert Szúdor-vedúci OL
Kontroloval:

TESS
control
TESScontrol, s. r. o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Calláček poďakky

Protokol o skúške


číslo: 219/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV

STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Staničenie:	skládka	Konštrukcia:	násyp, obsyp, pláň
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	27.6.2018
Trieda:	G3 G-F	Dátum skúšky:	28.6.2018
Lokalita:	lom Pohranice	Dátum vystavenia:	29.6.2018
Odobral:	Zošiak	Odborný listok:	173/2018/Z
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		94/2018/Nr
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:		Ev. karta meradla:	
sada sit			ZV1132-ZV1149
váha			ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sita (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _x (%)	celkový podiel prepadov (%)
	0,0	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100
D 63	1,056	2,1	98
45	3,887	7,9	90
31,5	7,961	16,1	74
22,4	6,892	13,9	60
16	7,312	14,8	45
11,2	4,936	10,0	35
8	3,127	6,3	29
5,6	1,965	4,0	25
4	2,325	4,7	20
2	1,467	3,0	17
1	1,036	2,1	15
0,5	0,891	1,8	13
0,25	0,627	1,3	12
0,125	0,355	0,7	11
0,063	0,217	0,4	10,9
Dno	0,0010	0,2	
Hmotnosť vz. M2	44,158	89,3	
pod sitom 0,063	5,283	10,7	
hmotn. vz. M1	49,441	100,0	
Hmotnosť vz. M2	44,286		

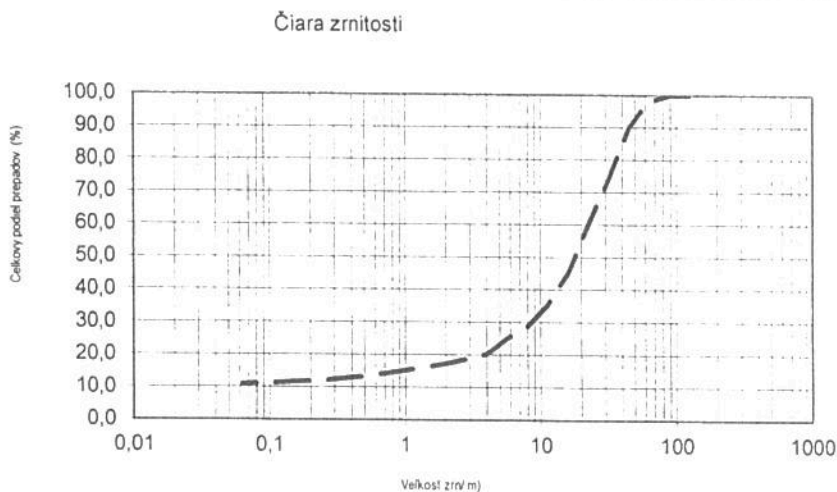

Podiel jemných zrn pod sitom < 0,063 mm	f = 10,9 %
Platnosť výsledkov:	0,3 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť"

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.

Hrončiaková
Skúšal:

Th

Róbert Szúdor-vedúci OL ZV
Kontroloval:

f

TESS
control

TESScontrol, s. r. o.

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Protokol o skúške

číslo 233/1/2018/4 4/ZV
denník číslo 1/2018/4 4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO rady 100
Staničenie:	skládky	Konštrukcia:	násyp, obsyp, plaň
Názov výrobku:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu:	9.7.2018
Trieda:	G3 G-F	Dátum skúšky:	17.7.2018
Lokalita:	lom Polhranice	Dátum vystavenia:	18.7.2018
Odoberal:	Zošiak	Odborný listok:	180/2018/Z 95/2018/Nr
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP:	SP-4.4	Odchytky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:	Ev. karta meradla		
sada sit	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sita (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _i (%)	celkový podiel prepadov (%)
	0,0	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100
63	0,316	0,7	99
45	3,985	9,3	90
31,5	7,216	16,9	73
22,4	6,352	14,9	58
16	5,216	12,2	46
11,2	4,085	9,6	36
8	2,312	5,4	31
5,6	3,222	7,5	24
4	1,852	4,3	19
2	0,996	2,3	17
1	0,998	2,3	15
0,5	0,856	2,0	13
0,25	0,658	1,5	11
0,125	0,451	1,1	10
0,063	0,285	0,7	9,2
Dno	0,0010	0,2	
hmotnosť M ₁	38,868	90,9	
hmotnosť M ₂	3,886	9,1	
hmotnosť M ₃	42,754	100,0	
hmotnosť M ₄	38,884		

Čiara zrnitosti

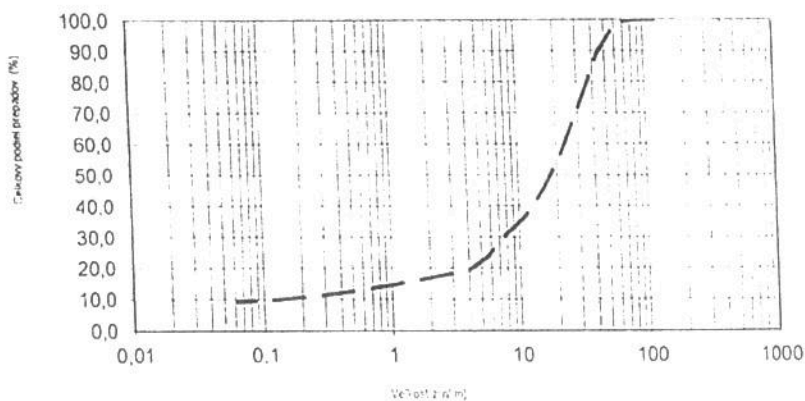

Podiel jemných zrn pod sitom < 0,063 mm	f = 9,2 %
Platnosť výsledkov	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo merania zrnitosti	Cu = nest.
STN 72 1004	číslo krivostí krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti limit of fluidity W _L (%)	nest.
STN 72 1015	medza plasticity limit of plasticity W _P (%)	nest.
STN 72 1002	prírodná vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka :

veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a neobsahujú iné dokumenty (napr. správy, účty, atď.). Protokol môže byť reprodukovatelný len vtedy, ak je dostatočne podrobný, súhlasí s údajmi, ktoré sú v dokumente uvedené.

Širáňová
Skúšal:

Róbert Szűdor-vedúci OL ZV
Kontroloval:

TESS
control
TESScontrol, s. r. o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number: 231/1/2017/4.4/ZV

denník č./number of diary: 1/2017/4.4/ZV

STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD


Objednávateľ/Client:	Združenie infraštrukt. Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie infraštrukt. Nitra
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštr. strateg. park Nitra	Objekt/Object:	SO rady 100
Staničenie:	trasa km - skládka	Konštrukcia/Construction:	sanačná vrstva, násyp
Názov výr./Product Name:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu/Date of sampling:	10.10.2017
Trieda / symgol	G3 G-F	Dátum skúšky/test date:	12.10.2017
Lokalita/Locality:	lom Hostie	Dátum vystavenia/Date reported:	16.10.2017
Odobral/Sampler:	Zošiak	Odberný listok/Markings of sample:	214/2017/Z 99/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure:	žiadne
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV1132-ZV1149
Merací prístroj/Measuring instrument:	sada sit váha		ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sít/sieve size of sieve (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku/weight of residue (kg)	podiel zostatkov/ part of residues Mx (%)	celkový podiel prepadov-total part of siftings (%)
	0,0	0,0	100,0
125	0,0	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100,0
63	0,937	2,0	98,0
45	2,046	4,3	93,8
31,5	3,481	7,3	86,5
22,4	6,112	12,8	73,7
16	7,948	16,6	57,1
11,2	4,937	10,3	46,8
8	7,004	14,6	32,1
5,6	3,284	6,9	25,3
4	2,538	5,3	20,0
2	1,935	4,0	15,9
1	1,024	2,1	13,8
0,5	1,346	2,8	11,0
0,25	0,958	2,0	8,9
0,125	0,735	1,5	7,4
0,063	0,227	0,5	6,9
Dno	0,0010	0,2	0,0

Hmotnosť vz. M2	44,588	93,2
pod sítom 0,063	3,242	6,8
hmotn. vz. M1	47,830	100,0
Hmotnosť vz. M2	44,590	

Čiara zrnitosti - grading curve

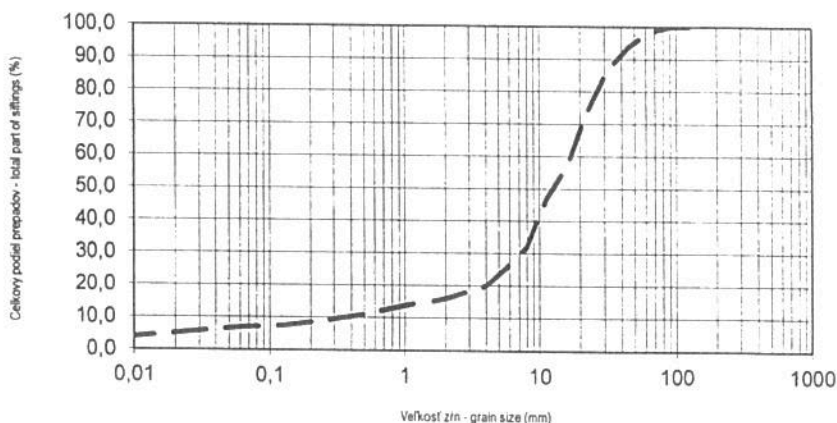

Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm	f = 6,9 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	
STN 72 1002	prírodná vlhkosť (%)	

Vyhodnotenie/Evaluation:

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín

G3 G-F

štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka :

veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiaková Skúšan/Tested by:	Róbert Szúdor-vedúci OL Kontroloval/Controlled by:	Doprastav a.s. Technický a skúšobný servis Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
----------------------------------	---	---

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number: 247/1/2017/4.4/ZV

denník č./number of diary: 1/2017/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt/Object:	SO radu 100
Staničenie:	neurčené	Konštrukcia/Construction:	násyp
Názov výr./Product Name:	ŠD 0/63 mm	Dátum odberu/Date of sampling:	24.10.2017
Trieda / symgol	G3 G-F	Dátum skúšky/test date:	26.10.2017
Lokalita/Locality:	Pohranice	Dátum vystavenia/Date reported:	31.10.2017
Odobral/Sampler:	Zošiak	Odborný listok/Markings of sample:	234/2017/K 104/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4		
Merací prístroj/Measuring instrument:	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure: žiadne		
sada sit	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:		
váha	ZV1132-ZV1149		
	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sít/sieve size of súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku weight of residue (kg)	podiel zostatku part of residues M _r (%)	celkový podiel prepadoz-total part of siftings (%)
	0,0	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100,0
63	0,785	1,3	98,7
45	2,936	4,8	93,9
31,5	10,624	17,5	76,4
22,4	8,875	14,6	61,8
16	6,684	11,0	50,9
11,2	5,736	9,4	41,4
8	5,265	8,7	32,8
5,6	4,851	8,0	24,8
4	3,267	5,4	19,4
2	2,568	4,2	15,2
1	2,135	3,5	11,7
0,5	1,593	2,6	9,1
0,25	1,234	2,0	7,1
0,125	0,715	1,2	5,9
0,063	0,362	0,6	5,3
Dno	0,0010	0,0	0,0

Čiara zrnitosti - grading curve

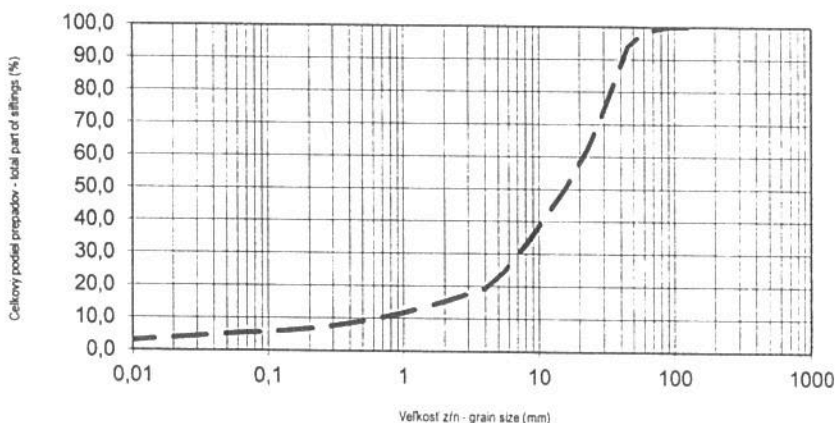

Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm	f = 5,3 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

Hmotnosť vz. M2	57,650	94,7
pod sítom 0,063	3,202	5,3
hmotn. vz. M1	60,852	100,0
Hmotnosť vz. M2	57,650	
STN 72 1001	číslo nerovnomernosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)	

Vyhodnotenie/Evaluation:

STN 72 1001 Klasifikácia zemin a skalných hornín

G3 G-F

štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka :

veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiaková Skúšal/Tested by:	Róbert Szúdor-vedúci OL Kontroloval/Controlled by:	Doprastav Oblasťné laboratórium Zvolen Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava 0994 -
----------------------------------	---	--

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number: 246/1/2017/4.4/ZV
 denník č./number of diary: 1/2017/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SÍTOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt/Object:	SO rady 100
Staničenie:	neuvedené	Konštrukcia/Construction:	násyp, pláň
Názov výr./Product Name:	ŠD 0/125 mm	Dátum odberu/Date of sampling:	25.10.2017
Trieda / symgol	G3 G-F	Dátum skúšky/test date:	26.10.2017
Lokalita/Locality:	lom Hostie	Dátum vystavenia/Date reported:	31.10.2017
Odberateľ/Sampler:	Zošiak	Odberný listok/Markings of sample:	233/2017Z 103/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4		
Merací prístroj/Measuring instrument:	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure: žiadne Ev. karta meradla/Registration card of gauge:		
sada sit	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sít/sieve size of sieve (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku/weight of residue (kg)	podiel zostatkov part of residues Mx (%)	celkový podiel prepadov-total part of siftings (%)
	0,0	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	4,613	5,8	94,2
63	11,897	14,9	79,4
45	10,045	12,5	66,8
31,5	9,513	11,9	55,0
22,4	7,422	9,3	45,7
16	5,670	7,1	38,6
11,2	4,335	5,4	33,2
8	4,127	5,2	28,1
5,6	3,652	4,6	23,5
4	3,225	4,0	19,5
2	2,647	3,3	16,2
1	2,053	2,6	13,6
0,5	1,815	2,3	11,3
0,25	0,936	1,2	10,2
0,125	0,614	0,8	9,4
0,063	0,225	0,3	9,1
Dno	0,0010	0,1	0,0

Čiara zrnitosti - grading curve

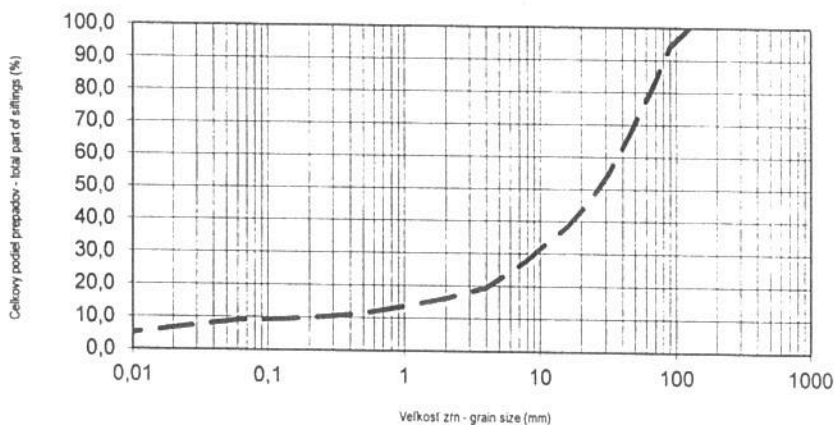

Podiel jemných zŕn pod sítom < 0,063 mm	f =	9,1	%
Platnosť výsledkov:	0,0	< 1	%

Hmotnosť vz. M2	72,862	91,0
pod sítom 0,063	7,240	9,0
hmotn. vz. M1	80,102	100,0
Hmotnosť vz. M2	72,870	

STN 72 1001	číslo nerovnomernosti	Cu =	nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc =	nest.
STN 72 1014	medza tekutosti/ limit of fluidity WL (%)		nest.
STN 72 1013	medza plasticity /limit of plasticity WP (%)		nest.
STN 72 1002	prirodzená vlhkosť (%)		

Vyhodnotenie/Evaluation:

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín

G3 G-F

štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka :

veľkosť otvorov sít : základný súbor+súbor 1

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiaková
 Skúšal/Tested by:

Róbert Szúdor-vedúci OL
 Kontroloval/Controlled by:

Doprastav

Technický a skúšobný servis
 Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
 0994 -

Protokol o skúške

číslo: 036/1/2018/4.4/ZV
denník číslo: 1/2018/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ:	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberteľ:	Združenie
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt:	SO radu 100
Staničenie:	skládka	Konštrukcia:	násyp
Názov výrobku:	ŠD 0/125 mm	Dátum odberu:	20.2.2018
Trieda:	G3 G-F	Dátum skúšky:	22.2.2018
Lokalita:	lom Hostie	Dátum vystavenia:	23.2.2018
Odobral ^{1/} :	Zošiak	Odberný listok:	22/2018/Z/VZ 16/2018/Nr
Metóda merania:	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP:	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu:	žiadne
Merací prístroj:	Ev. karta meradla:		
sada sit	ZV1132-ZV1149		
váha	ZV 1008		

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sita (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku (kg)	podiel zostatkov M _x (%)	celkový podiel prepadov (%)
	0,0	0,0	100,0
D 125	2,235	4,2	95,8
90	3,870	7,2	89
63	5,035	9,4	79
45	4,217	7,9	71
31,5	5,232	9,8	62
22,4	5,147	9,6	52
16	4,011	7,5	45
11,2	3,570	6,7	38
8	2,435	4,5	33
5,6	2,104	3,9	29
4	2,078	3,9	26
2	1,976	3,7	22
1	2,453	4,6	17
0,5	1,736	3,2	14
0,25	0,679	1,3	13
0,125	0,417	0,8	12
0,063	0,265	0,5	11,5
Dno 0,0010	0,102	0,2	0,0

Čiara zrnitosti

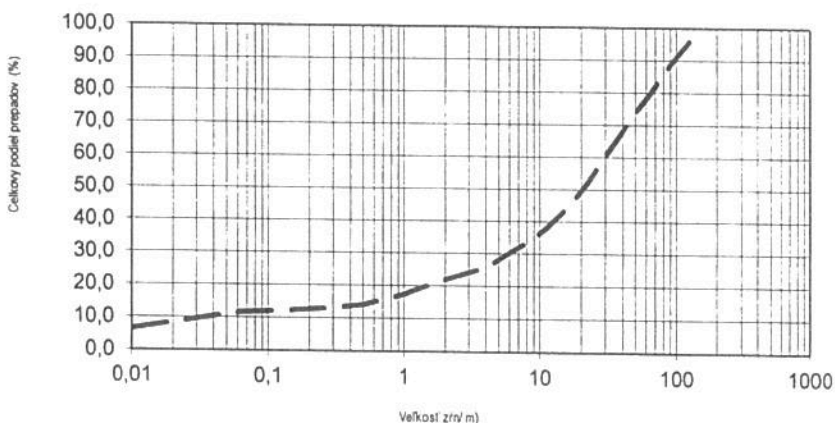

Podiel jemných zrn pod sitom < 0,063 mm	f = 11,5 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

Hmotnosť vz. M2	47,562	88,6
pod sitom 0,063	6,092	11,4
hmotn. vz. M1	53,654	100,0
Hmotnosť vz. M2	47,562	

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = nest.
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = nest.
STN 72 1014	medza tekutosti / limit of fluidity WL (%)	nest.
STN 72 1013	medza plasticity / limit of plasticity WP (%)	nest.
STN 72 1002	prírodná vlhkosť (%)	nest.

Vyhodnotenie:

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín

G3 G-F

Štrk s prímiesou jemnozrnej zeminy

Poznámka : veľkosť otvorov sit : základný súbor+súbor 1
" neakreditovaná činnosť "

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný i

Hrončiaková
Skúšal:

Róbert Szúdor-vedúci OL
Kontroloval:

TESScontrol, s. r. o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Odtlačok pečiatky

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number: 282/1/2017/4.4/ZV
denník č./number of diary: 1/2017/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštr. strategický park Nitra	Objekt/Object:	objekty rady 100 /SO 123-00/
Staničenie:	skládka - trasa	Konštrukcia/Construction:	nestmelená podkladná vrstva
Názov výr./Product Name:	UMŠD STN EN 13285- 0/31,5- Gc-OC ₉₀ -UF ₅ -LF ₂	Dátum odberu/Date of sampling:	9.11.2017
Výrobca:	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zl.Moravce	Dátum skúšky/test date:	22.11.2017
Lokalita/Locality:	lom Pohranice	Dátum vystavenia/Date reported:	30.11.2017
Odobral/Sampler:	Zošiak	Odborný listok/Markings of sample:	257/2017/K/ZV 116/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure:	žiadne
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV1132-ZV1149 ZV 1008
Merací prístroj/Measuring instrument:	sada sit váha		

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sita-size of sieve (mm)	hmotnosť zvyšku- weight of residue (kg)	podiel zvyškov- part of residues Mx (%)	celkový podiel prepadov-total part of siftings (%)
200	0,000	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100,0
2D 63	0,000	0,0	100,0
1/4D 45	0,000	0,0	100,0
D 31,5	0,506	1,6	98,4
22,4	4,935	15,3	83
D/2 16	5,114	15,9	67
11,2	2,913	9,0	58
8	2,885	9,0	49
5,6	2,436	7,6	42
4	3,758	11,7	30
2	2,417	7,5	22
1	1,856	5,8	17
0,5	1,550	4,8	12
0,25	1,264	3,9	8
0,125	0,846	2,6	5
0,063	0,309	1,0	4,4
Dno 0,0010	0,027	0,1	0,0
Hmotnosť vz. M2	30,816	95,7	
pod sílom 0,063	1,383	4,3	
hmotn. vz. M1	32,199	100,0	
Hmotnosť vz. M2	30,816		

Čiara zrnitosti

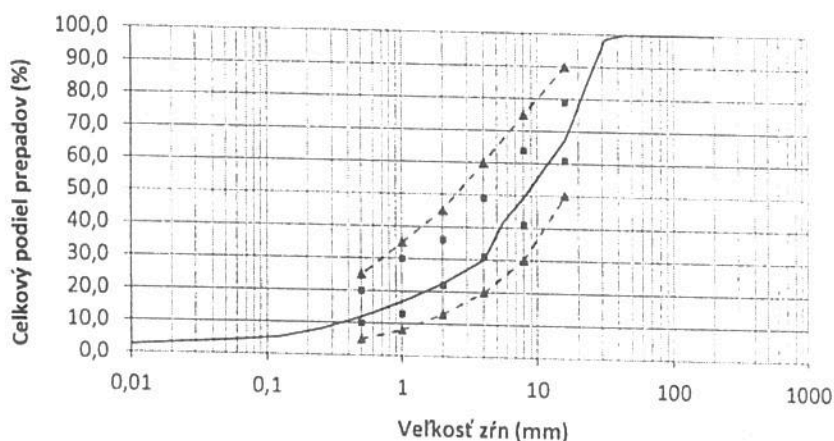

Podiel jemných zrn pod sílom < 0,063 mm	f = 4,4 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

STN 72 1001 číslo nerovnoznalosti Cu = 32,70
STN 72 1001 číslo krivosti krivky Cc = 3,47

Kategória podľa / Category according to:	deklarované	STN EN 13285
Sito [-]		2D 1,4D D D/2 d f
Frakcia kameniva [mm]	0/31,5	63 45 31,5 16 - 0,063
Hmot. podiel prepadu :		100 100 98,4 67 - 4,4
Odchýlky typickej triedy zrnitosti	G _C	G _C
Optimálna vlhkosť	3,50%	nestanovené
Trieda zrnitosti	OC ₉₀	OC ₉₀
maximálny obsah jemných častíc	f ₅	UF ₅
minimálny obsah jemných častíc	f ₂	LF ₂

Prehlásenie :

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiková Skúšal/Tested by:	Szúdor Kontroloval/Controlled by:	Odtlačok pečiatky/Copy stamp
---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number: 291/1/2017/4.4/ZV
denník č./number of diary: 1/2017/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštr. strategický park Nitra	Objekt/Object:	objekty rady 100 /SO 104-00/
Staničenie:	skládka - trasa	Konštrukcia/Construction:	nestmelená podkladná vrstva
Názov výr./Product Name:	UMŠD STN EN 13285- 0/31,5- Gc-OC ₉₀ .UF ₅ -LF ₂	Dátum odberu/Date of sampling:	17.11.2017
Výrobca:	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. ZI.Moravce	Dátum skúšky/test date:	28.11.2017
Lokalita/Locality:	lom Pohranice	Dátum vystavenia/Date reported:	30.11.2017
Odberateľ/Sampler:	Zošiak	Odberný lístok/Markings of sample:	272/2017/K/ZV 121/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure:	žiadne
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV1132-ZV1149
Merací prístroj/Measuring instrument:	sada síť váha		ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sít/size of sieve (mm)	základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku weight of residue (kg)	podiel zostatkov part of residues Mx (%)	celkový podiel prepadov total part of siftings (%)
	200	0,000	0,0	100,0
	125	0,000	0,0	100,0
	90	0,000	0,0	100,0
2D	63	0,000	0,0	100,0
1/4D	45	0,000	0,0	100,0
D	31,5	0,296	0,9	99
	22,4	5,317	15,4	84
D/2	16	4,188	12,1	72
	11,2	3,714	10,7	61
	8	3,052	8,8	52
	5,6	2,658	7,7	44
	4	4,005	11,6	33
	2	2,865	8,3	25
	1	2,318	6,7	18
	0,5	1,741	5,0	13
	0,25	1,356	3,9	9
	0,125	0,936	2,7	6
	0,063	0,576	1,7	4,5
Dno	0,0010	0,008	0,0	0,0
Hmotnosť vz. M2	33,030	95,5		
pod síťom 0,063	1,540	4,5		
hmotn. vz.M1	34,570	100,0		
Hmotnosť vz. M2	33,030			

Čiara zrnitosti

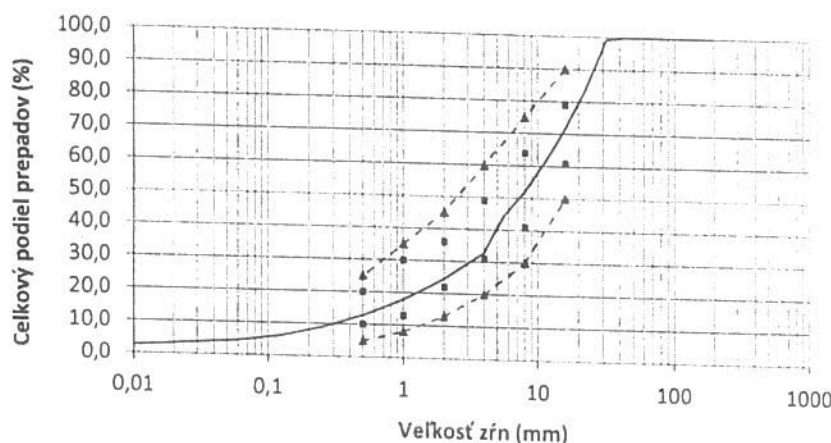

Podiel jemných zrn pod síťom < 0,063 mm	f = 4,5 %
Platnosť výsledkov:	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = 34,70
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = 3,10

Katégorie podľa / Category according to:	deklarované	STN EN 13285
Sito [-]		2D 1,4D D D/2 d f
Frakcia kameniva [mm]	0/31,5	63 45 31,5 16 - 0,063
Hmot. podiel prepadu:	100	100 99 72 - 4,5
Odchýlky typickej triedy zrnitosti	G _c	G _c
Optimálna vlhkosť	3,50%	nestanovené
Trieda zrnitosti	OC ₉₀	OC ₉₀
maximálny obsah jemných častíc	f _s	UF ₅
minimálny obsah jemných častíc	f ₂	LF ₂
		f = 4,5 %

Prehľadanie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiaková Skúšal/Tested by:	Szúdor Kontroloval/Controlled by:	Odtlačok pečiatky/Copy stamp:
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Protokol o skúške

číslo/number: 218/1/2018/4.4/ZV

denník č./number of diary: 1/2018/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ :	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberteľ :	Združenie
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt :	objekty radu 100
Staničenie :	neudané	Konštrukcia :	UMŠD-podtyp
Názov výrobku :	UMŠD STN EN 13285- D 31,5- G _C -OC ₉₀ -UF ₅ -LF ₂	Dátum odberu :	27.6.2018
Výrobca :	Pohranice	Dátum skúšky :	28.6.2018
Lokalita :	skládky	Dátum vystavenia :	29.6.2018
Odobral :	Zošiak	Odberný listok :	172/2018/Z/ZV
Metóda merania :	STN EN 933-1 + A1		91/2018/Nr
Číslo SP :	SP- 4.4	Odchýlky od skúšobného postupu: žiadne	
Merací prístroj :		Ev. karta meradla:	
sada sit			ZV1132-ZV1149
váha			ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sita-size of sieve (mm) základný súbor + súbor 1	hmotnosť zostatku weight of residue (kg)	podiel zostatkov part of residues M _i (%)	celkový podiel prepadov-total part of siftings (%)
200	0,000	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100,0
2D 63	0,000	0,0	100,0
1,4D 45	0,000	0,0	100,0
D 31,5	0,283	1,6	98
22,4	3,124	18,2	80
D/2 16	1,963	11,4	69
11,2	2,865	16,7	52
8	1,047	6,1	46
5,6	1,448	8,4	37
4	1,237	7,2	30
2	1,482	8,6	22
1	0,657	3,8	18
0,5	0,912	5,3	12
0,25	0,748	4,4	8
0,125	0,470	2,7	5
0,063	0,223	1,3	4,1
Dno 0,0010	0,017	0,1	

Čiara zrnitosti

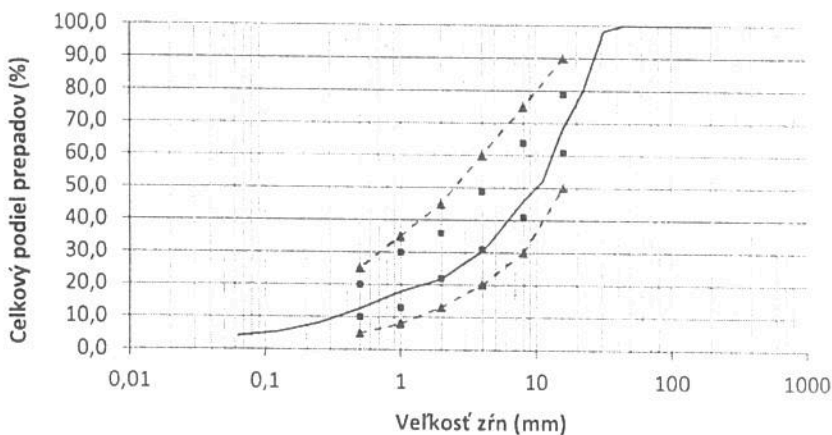

Podiel jemných zrn pod sitom < 0,063 mm

f = 4,1 %

Platnosť výsledkov:

0,2 < 1 %

Hmotnosť vz. M2	16,476	96,0
pod sitom 0,063	0,683	4,0
hmotn. vz. M1	17,159	100,0
Hmotnosť vz. M2	16,504	

STN 72 1001

číslo nerovnoznitosti

Cu = 51,27

STN 72 1001

číslo krivosti krivky

Cc = 4,53

Katégorie podľa :	VoP	STN EN 13285					
Sito [-]		2D	1,4D	D	D/2	d	f
Frakcia kameniva [mm]	0/31,5	63	45	31,5	16	-	0,063
Hmot. podiel prepadu :		100	100	98	69	-	4,1
Odchýlky typickej triedy zrnitosti	G _C			G _C			
Optimálna vlhkosť	4,00%			nest.			
Trieda zrnitosti	OC ₉₀			OC ₉₀			
maximálny obsah jemných častíc	f ₅			UF ₅			f = 4,1 %
minimálny obsah jemných častíc	f ₂			LF ₂			

Prehlásenie :

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OI.

Hrončiaková
Skúšal :

Szúdor - vedúci OL ZV
Kontroloval :

Protokol o skúške

číslo/number 234/1/2018/4.4/ZV
denník č./number of diary 1/2018/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SITOVÝ ROZBOR

Objednávateľ :	Združenie "Infraštruktúra Nitra"	Odberateľ :	Združenie
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry strat.park Nitra	Objekt :	objekty radu 100
Staničenie :	neudané	Konštrukcia :	UMŠD-podsyp
Názov výrobku :	UMŠD STN EN 13285- D 31,5- G _C -OC ₉₀ -UF ₅ -LF ₂	Dátum odberu :	9.7.2018
Výrobca :	Pohranice	Dátum skúšky :	17.7.2018
Lokalita :	skládka	Dátum vystavenia :	18.7.2018
Odobral :	Zošiak	Odborný listok :	181/2018/ZV 100/2018/Nr
Metóda merania :	STN EN 933-1 + A1		
Číslo SP :	SP- 4.4	Odchytky od skúšobného postupu :	žiadne
Merací prístroj :		Ev. karta meradla :	
sada sit			ZV1132-ZV1149
váha			ZV 1008

VÝSLEDKY SKÚŠOK

veľkosť sieťovej veľkosti (mm) / základný sítový súčet	hmotnosť zvyšku / weight of residue (g)	podiel zvyšku / part of residue (%)	celkový podiel prepados / total part of siftings (%)
200	0,000	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100,0
63	0,000	0,0	100,0
45	0,000	0,0	100,0
31,5	0,196	1,4	99
22,4	2,152	15,5	83
16	1,232	8,9	74
11,2	1,652	11,9	62
8	1,824	13,2	49
5,6	1,216	8,8	40
4	0,898	6,5	34
2	1,129	8,2	26
1	0,956	6,9	19
0,5	0,854	6,2	13
0,25	0,554	4,0	9
0,125	0,412	3,0	6
0,063	0,186	1,3	4,3
Dno	0,0310	0,4	
hmotnosť M ₂	13,313	96,1	
hmotnosť M ₁	0,539	3,9	
hmotnosť M ₀	13,852	100,0	
hmotnosť M ₂	13,336		

Čiara zrnitosti

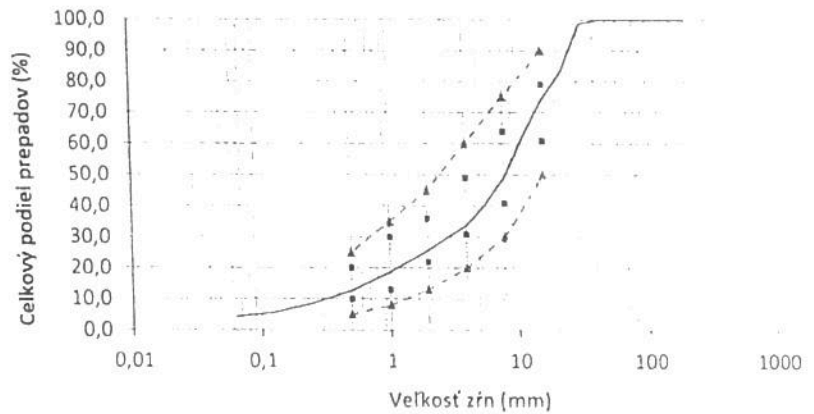

Podiel jemných zrn pod sítom < 0,063 mm

f = 4,3 %

Platnosť výsledkov

0,2 < 1 %

STN 72 1001

číslo pre zrnitosť

Cu = 47,54

STN 72 1001

číslo krivky

Cc = 4,03

Katégorie podľa :	VoP	STN EN 13285					
Sito [-]		20	1,40	D	D/2	d	f
Frakcia kameniva [mm]	0/31,5	63	45	31,5	16	-	0,063
Hmot. podiel prepadu		100	100	99	74		4,3
Odchytky typickej triedy zrnitosti	G _C	G _C					
Optimálna vlhkosť	4,00%	4,60					
Trieda zrnitosti	OC ₉₀	OC ₉₀					
maximálny obsah jemných častíc	f ₅	UF ₅				f = 4,3 %	
minimálny obsah jemných častíc	f ₂	LF ₂					

Prehlásenie

Výsledky skúšok sú výsledky skúšky a nemajú charakter dokumentu, majú správneho charakteru. Protokol má byť reprodukovovaný len celým, jeho časť nie je platná.

ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Doplnok STRABAG										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
9.6.2017	17/5/2017/2.7/ZV	114-00	0,150-0,390	vápnené podložie	troxler	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	7	97%	98,3 - 101,00%	Vyhovuje
3.7.2017	24/5/2017/2.7/ZV	114-00	0,045	vápnené podložie	troxler	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	3	97%	98,1 - 100,3%	Vyhovuje
17.8.2017	34/5/2017/2.7/ZV	114-00	0,410	vápnené podložie	troxler	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	3	97%	98,5 - 101%	Vyhovuje
9.6.2017	97/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,350 (0,150-0,390)	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	30MPa	42,8	Vyhovuje
9.6.2017	98/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,250 (0,150-0,390)	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	30MPa	34,12	Vyhovuje
15.6.2017	121/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,100 (0,150-0,390)	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	45 MPA	47,08	Vyhovuje
5.7.2017	160/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,045	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	45 MPA	47,10	Vyhovuje
5.7.2017	161/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,035 vetva B2	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	45 MPA	49,04	Vyhovuje
18.8.2017	283/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,410	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	30MPa	50,09	Vyhovuje
26.6.2017	32/1/2017/2.16/ZV	114-00	km 0,100	vápnené podložie	CBR	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	-	22,00	Vyhovuje
14.6.2018	43/1/2017/2.16/ZV	114-00	km 0,100	vápnené podložie	IBI	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	-	23,00	Vyhovuje
8.6.2018	38/1/2017/2.16/ZV	114-00	km 0,100	vápnené podložie	IBI	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	-	13,00	Vyhovuje
9.6.2017	99/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,160(0,150-0,390)	vápnené podložie	SZS	IL F 8 CH miestny IL F 8 CH	1	45 MPA	46,16 MPA	Vyhovuje

**Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15,
811 04 Bratislava, závod Žirany
951 74 Žirany**

Osvedčenie o kvalite

Názov výrobku: **Vzdušné biele vápno 90 nehasené - EN 459-1 CL 90 - Q (R4,Psv)**

ES Certifikát zhody systému riadenia výroby číslo **1301 - CPR - 0046**

Akreditované skúšobné laboratórium TSÚS, n.o. Bratislava, SK

EN 459-1 :2010

Výrobca : **Calmit spol. s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, závod Žirany**

Odberateľ : **Doprastav a.s.**

ŠPZ auta	PD825CD	ZA664GZ	ZA664GZ	ZA664GZ	ZA664GZ
Expedícia	5.6.2017	5.6.2017	7.6.2017	8.6.2017	8.6.2017
Čas	11h	16,15h	11,15h	10h	17h
CO ₂ (%)	3,5	3,3	3,7	3,3	3,5
Reaktivita 2.min. (°C)	32,9	34,4	33	32,8	33,2
t ₆₀ (min.)	14min.21s.	14 min.36s.	16 min.06s.	16 min.06s.	14 min.46s.
Reaktivita Tmax./min.	65/30	66/30	64/30	64/30	64/30

Vzorku analyzoval : S.Báreková

Osvedčenie vystavil: S.Báreková

Dňa : 26.7.2017



Ďakujeme za prejavovaný záujem o náš výrobok, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Protokol č.:12/2017/NITRA - meranie dávkovania spojiva

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Úsek: SO 114 00

Spojivo: Vápno CL 90-Q


Požadovaná hodnota: 11,5kg/m² - 30MPa
18,8kg/m² - 45MPa
25kg/m² - 60MPa

Spôsob merania: Meranie dávkovania spojiva sa vykonalo nadávkovaním spojiva na štvorcový plech s bočnicami so stranou 0,5m a následným odvážením.

dátum	váha/kg	váha/kg	váha/kg	kg/m ²
3.7.2017	4,6	4,7		18,6

Dátum: 27.07.2017

Vypracoval: Ing. Juraj Kováčik



Doprastav, a.s.
826 56 BRATISLAVA
Drieňová 27 Bratislava

Protokol o skúške - Protocol about the test


číslo : 160/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo : 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odberateľ/Customer:	1505
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,045 PS	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým. spojivom
Skušany materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 22°C
Lokalita/Localita:	miestny	Dátum skúšky/ Test date:	3.7.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,40$	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.7.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	23,54
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121
Údaje o skúške - Information about the test:	Zaťažovací cyklus - Load cycle		

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,25	0,72	1,70	2,73	2,25	1,90	1,24	1,47	1,72	2,22	1,34

$h_1 = 0,98$ $0,5$ $h_2 = 0,5$ mm
 $E_{def1} = 24,02$ MPa $E_{def2} = 47,08$ MPa
 $E_{def2} / E_{def1} = 1,96$

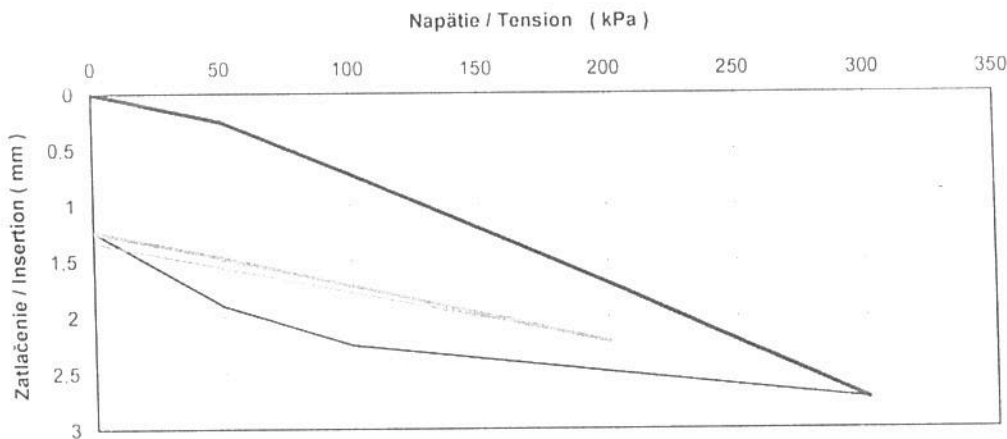

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 45$ Mpa

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba na písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skušal/Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava Otláčok 0994
----------------------------	--------------------------------------	--


Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 161/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odberteľ/Customer:	1505
Stavba/Buiding:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,035 vetva B2 OS	Konštrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým. spojivom
Skušany materiál/Tested material:	F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 22°C
Lokalita/Localita:	miestny	Datum skúšky/ Test date:	3.7.2017
Poissonovo číslo/Poisson No:	$\nu = 0,40$	Datum vystavenia / date of issuance:	31.7.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value:	$k = 23,54$
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121
Údaje o skúške - Information about the test:		Zaťažovací cyklus - Load cycle	

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,24	0,67	1,58	2,59	2,15	1,81	1,18	1,40	1,64	2,12	1,30
$h_1 =$	0,91	0,5					$h_2 =$	0,48 mm			
$E_{def1} =$	25,87 MPa						$E_{def2} =$	49,04 MPa			
					$E_{def2} / E_{def1} =$		1,90				

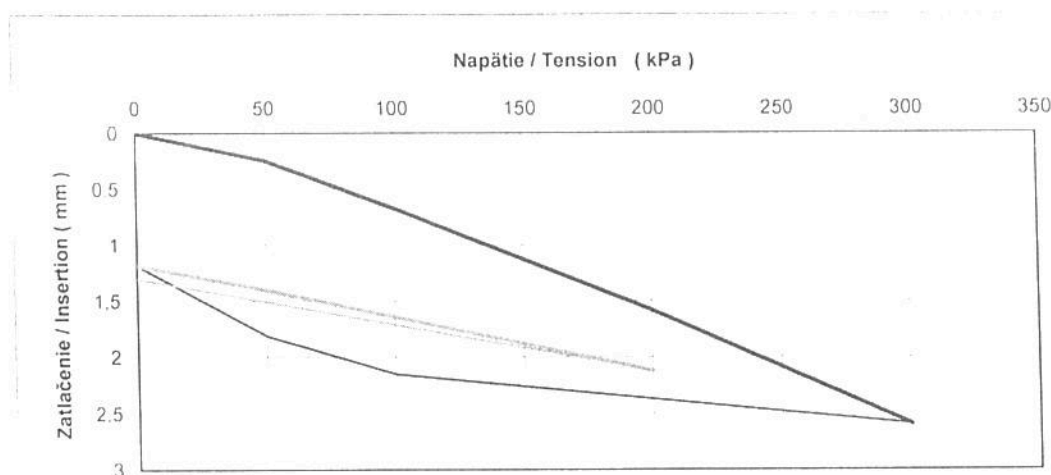

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.
 Požadované hodnoty /Required value: $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 45 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$
 Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba so písomným súhlasom laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, ner part can be used only with the written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava Otláčok pečiatky
-----------------------------	--------------------------------------	---

Protokol o skúške / Protocol about the test

číslo / number: 24/5/2017/2.7/ZV

Denník č. / Number of dairy: 5/2017/2.7/ZV

číslo / number PNI:

MIERA ZHUTNENIA ZEMÍN, SYPANÍN A PODKLADNÝCH VRSTIEV VOZOVKY DEGREE OF COMPACTION

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s. Bratislava závod 15	Objekt/Object: SO 114-00
Odberateľ/Customer: 1505	Konštrukcia/Construction: zlepšené podložie hydraulickým. spojivom
Stavba/Building: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Počet meraní: 3
Staničenie/Stationing: km: 0,045 PS, LS / vetva B2 km: 0,035 OS	
Skúšaný materiál/Tested material: F8 CH (ChO)	Povet. podm./Atm. Conditions: pohoľasno 24°C
Z lokality/ From quarry locality: miestny	Dátum skúšky/ Test date: 3.7.2017
Max. objemová hmotnosť $\rho_{d,max}$ [kg.m ⁻³]: 1453	Dátum vystavenia / Date of issuance: 31.7.2017
Optimálna vlhkosť w_{opt} [%]: 24,0	
Normy / Norms: STN 73 1375 Radiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti a súv.	
Číslo SP/Number of TP: SP-2.7	
Merací prístroj/Measuring instrument: Radiálny hutnomer TROXLER	
Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 22	

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

číslo m. number	Miesto a staničenie / point and stationing	Objemová hmotnosť/Bulk density [kg/m ³]		Vlhkosť/ Dampness w [%]	Miera zhutnenia/ measured value D [%]
		vlhká/damp pw	suchá/dry pd		
1	3.7.2017 km 0,045 PS priemer z troch meraní	1794	1444	24,2	99,4
		1819	1470	23,7	101,2
		1801	1457	23,6	100,3
		1805	1457	23,8	100,3
2	3.7.2017 km 0,045 LS priemer z troch meraní	1791	1433	25,0	98,6
		1764	1417	24,5	97,5
		1773	1428	24,1	98,3
		1776	1426	24,5	98,1
3	3.7.2017 km 0,035 vetva B2 OS priemer z troch meraní	1813	1463	23,9	100,7
		1815	1454	24,8	100,1
		1807	1444	25,1	99,4
		1812	1454	24,6	100,1
4					
5					
6					
7					

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6124 (tab. č. 15)

Požadovaná hodnota - Required value

D [%] = min 97 %

Dosiahnutá Ø D [%]

99,5

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN 73 6124 / Controlled bed conforms to the requirements STN 73 6124

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný

len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they

aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošíak

[Signature]

Skušal/ Tested by:

Jozek

[Signature]

Kontroloval/Controlled by:

Doprastav


Doprastav a.s.
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
0994 50994



KALIFORNSKÝ POWER ÚNOSNOSTI - CBR

Objednávateľ/Client: Zdrúženie infraštruktúra Nitra	Objekt/Object: SO 114-00	Konštrukcia/Construction: zlepšené podlažie	Názov zeminy/Specif. soil: F6 CI + CaO	Druh / Type: saturované	Lokality/locality: miestny	Metóda merania/Test method: STN EN 13286-47	Číslo SP/Number of TP: SP-2.16	Ev. karta meradla/Registration card: ZV 2163 ZV 1008	Stavba/Building: Príprava cestnej infraštruktúry - str. park Nitra	Staničenie/Stationing: km 0,100	Objednávateľ/Client: 1505
---	--------------------------	---	--	-------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---	--	---------------------------------	---------------------------

Penetrácia (mm)	Standardná sila (kN)	Zaťaženie F (kN)	Korekcia F'	CBR (%)	Hodnota	Objemová hmotnosť suchá (kg.m ⁻³)	Objemová hmotnosť suchá - max. P.S (kg.m ⁻³)	Vlhkosť vzorky (%)	Optimálna vlhkosť (%)	Čas ošetrovania
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5	0,61	0,98	1,33	1,67	1,90	2,51	3,38	4,31	7,01	10,26
1,0	1,0	1,33	1,67	2,0	2,51	3,38	4,31	7,01	10,26	13,2
2,0	2,0	2,66	3,33	4,0	5,02	6,76	8,76	14,02	21,02	20,0
3,0	3,0	3,99	5,00	6,0	7,53	10,14	13,14	21,02	21,02	21,6
4,0	4,0	5,32	6,67	8,0	10,04	13,52	17,52	21,02	21,02	22,0
5,0	5,0	6,65	8,33	10,0	12,55	16,90	20,90	21,02	21,02	22,0
7,5	7,5	9,98	12,50	15,0	18,83	25,38	28,38	21,02	21,02	22,0
10,0	10,0	13,31	16,67	20,0	25,10	33,86	36,86	21,02	21,02	22,0

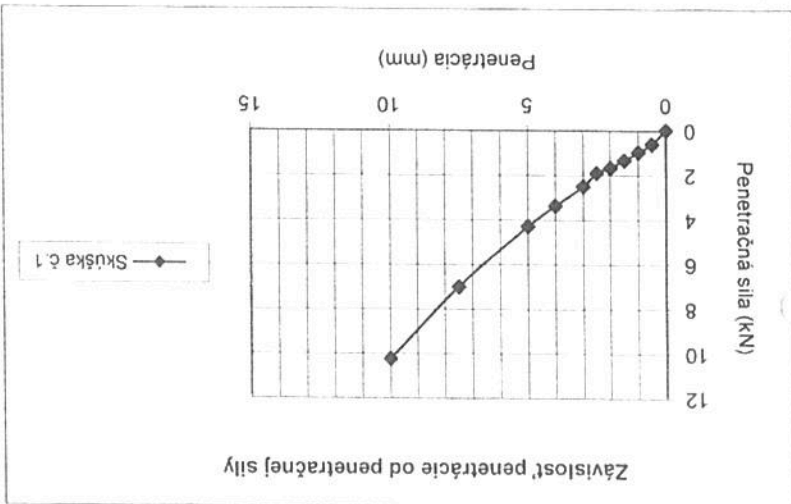

Vyhodnotenie/Evaluation:

Dosiahnutá hodnota:

CBR_{5,0}

22,00%

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Mgr. V. Hrončíková

Skušal/ Tested by

Róbert Szudor - vedúci OL

Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

Oddelenie pečiatky OL/Copy stamp RL




STANOVENIE INDEXU OKAMŽITEJ ÚNOSNOSTI - IBI

Protokol o skúške - Protocol about the test

1505	Odberteľ/Customer:	Príprava cestnej infraštruktúry - str. park Nitra	Zdrúženie Infraštruktúra Nitra
114-00	Objekt/Object:		
zlepšené podlažie	Konštrukcia/Construction:		
70/2017/Z/V	Odborný listok/Mar. of sample	F8 CH + CaO	Názov zeminy/Specif. soil:
8.6.2017	Datum skúšky/Test date:	zmes	Druh / Type :
9.6.2017	Datum vyst./Date of issuance:	miesny	Lokalita/locality:
SP-2.16	Číslo SP/Number of TP:	STN EN 13286-47	Metóda merania/Test method:
Ev. karta meradla/Registration card			Merací prístroj/Measuring instrument:
ZV 2163			CBR
ZV 1008			váha
Udaje o skúške - Information about the test :			

Penetrácia (mm)	Štandardná sila (kN)	Zaťaženie F (kN)	Korekcia F'	IBI (%)	Hodnota zaokrúhlená	Udaje o vzorke
0	0	0	0	0	0	Objemová hmotnosť suchá (kg.m ⁻³)
0,5	0,76	1,29	0	0	0	1517
1,0	1,36	1,65	0	0	0	Objemová hmotnosť suchá (kg.m ⁻³)
1,5	1,65	1,92	0	0	0	1507
2,0	1,92	2,07	0	0	0	Maximálna objemová hmotnosť suchá podľa PS (kg.m ⁻³)
2,5	2,07	2,27	0	0	0	19,4
3,0	2,27	2,52	0	0	0	Vlhkosť vzorky (%)
4,0	2,52	2,85	0	0	0	Optimálna vlhkosť (%)
5,0	2,85	2,97	0	0	0	23,2
7,5						Doba od zamiešania zmesi
10,0						90 min.

Závislosť penetrácie od penetračnej sily

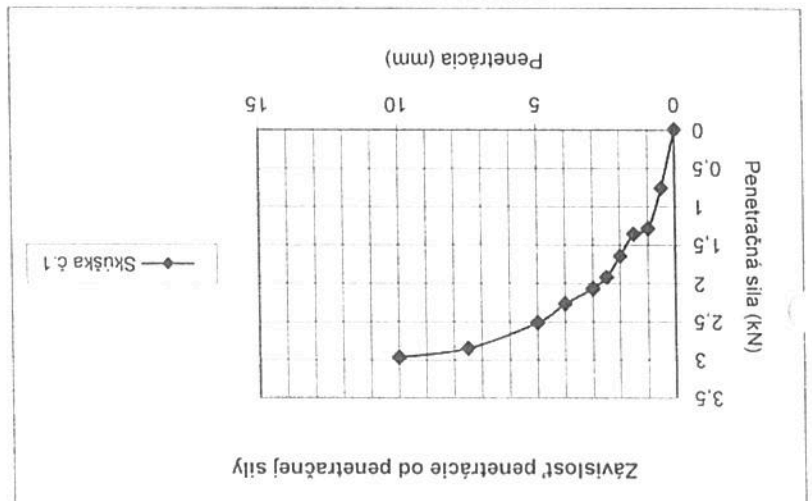

Vyhodnotenie/Evaluation: TKP MDV SR, časť 27 Zlepšovacie zemin

Dostiahnutá hodnota:

IBI₁₅

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenačdávajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho

časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be

used only after written consent of the

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu

Mgr. V. Hrončiaková

Kontrola/Controlled by

Róbert Szudor - vedúci OL

Kontrola a schválenie/Controlled by and approved by


Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL



STATICKÁ ZATAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Stančenie/Stationing:	Km: 0,160 PS (úsek 0,150 - 0,390)
Skúšaný materiál/ Tested material:	F8 CH (CHO)
Lokalita/Localita:	miestny
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,40$
Datum vystavenia / date of issuance:	30.6.2017
Datum skúšky/ Test date:	9.6.2017
Povet. podm./Atm. Conditions:	jasno 24°C
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zataž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm
Udaje o skúške - Information about the test:	odchýlkomer
	Zaťažovací cyklus - Load cycle
	II.

0	0	0,28	0,70	1,66	2,63	1,96	1,70	0	1,10	1,32	1,58	2,09	1,20
0	50	100	200	300	100	50	50	0	50	100	100	200	0
II.													
$E_{del1} = 24,52 \text{ MPa}$													
$E_{del2} = 46,16 \text{ MPa}$													
$E_{del2} / E_{del1} = 1,88$													
$h_1 = 0,96$													
$h_2 = 0,51 \text{ mm}$													

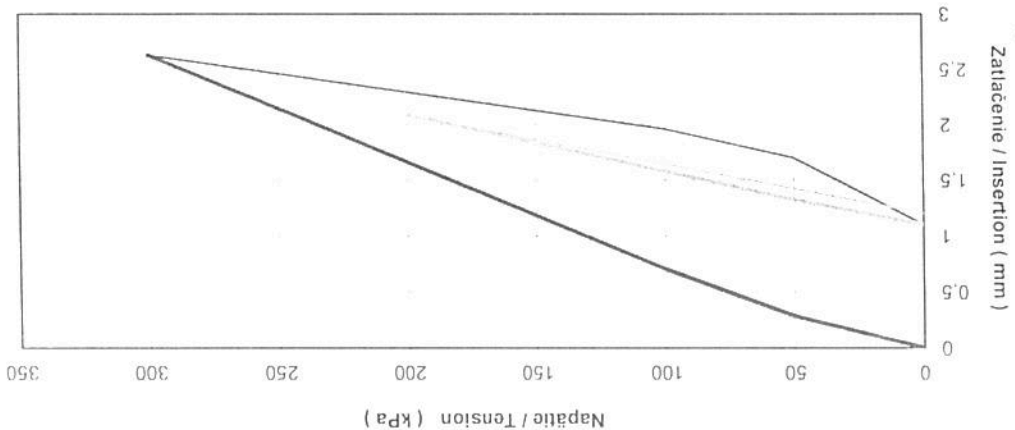

Vyhodnotenie/Evaluation: Požadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty / Required value:

$E_{del2} (Mpa) \geq 45 Mpa$

$E_{del2} / E_{del1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehľadenie/Resolution:

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty. (Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória)

Results from the test are in accordance with the test and they are not substituted by any documents. (Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory)

Zošíak
Skúšaný/ tested by

Jozek


Kontroloval / controlled by

Doprastav a.s.
Technický a skúšobný servis
Lubochňanská 1/A, 831 04 Bratislava

STATICKÁ ZATIAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odberateľ/Customer:	1505
Stavba/Buiding	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Stančenie/Stationing	km: 0,350 LS (úsek 0,150 - 0,390)		
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (CHO)		
Lokality/Localita:	miestny		
Poissonove číslo/Poisson No:	v = 0,40		
Doporučené hodnoty/Recommended value k =	23,54		
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190		
Merací prístroj/Measuring instrument:	Ev. karta meradia/Registration card of gauge:		
statická záťaž/súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	ZV 2191		
odchytkomer	ZV 2121		
Údaje o skúške - Information about the test :	Zatážovací cyklus - Load cycle		

I.		odťaženie - unloading	
0	50	100	50
0,30	0,75	1,71	2,70
0,96	0,5	1,97	1,73
$E_{def1} =$	$E_{def2} =$	$E_{def1} =$	$E_{def2} =$
24,52 MPa	42,80 MPa	1,75	1,75

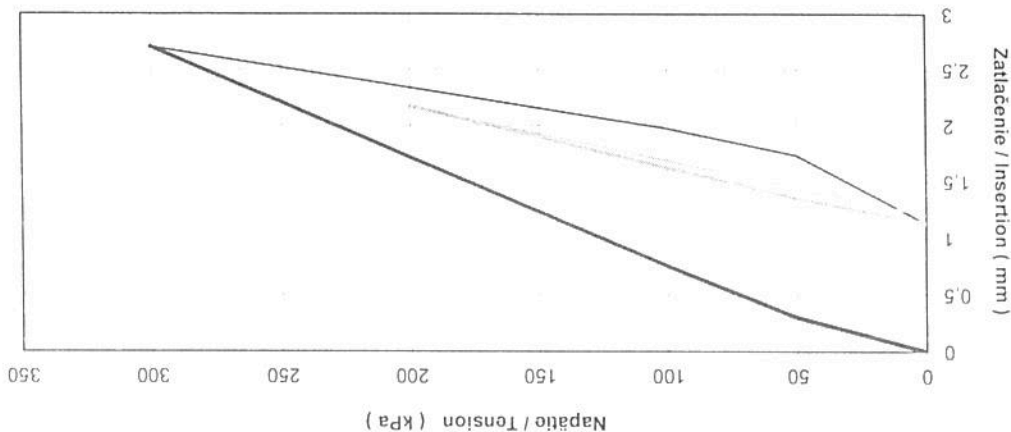

Vyhodnotenie/Evaluation: Požadavka podľa TKP.
Požadované hodnoty / Required value : $E_{def2} (Mpa) \geq 30 Mpa$
 $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$
Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehľadzenie/Resolution:

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nemajú byť reprodukovány inými spôsobmi. Protokol môže byť reprodukovovaný len vtedy, ak je súčasťou písomného súhlasu skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they are not to be reproduced by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.


Skúšaný/ Tested by:	Jozek	Kontroloval / controlled by:
Doprastav a.s. Technický a skúšobný servis		Lubochianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 - F-SP-2.2-8



STATICKÁ ZATIAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s. Bratislava - závod 15	Odberteľ/Customer: 1505
Stavba/Buiding: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00
Staničenie/Stationing: km: 0,250 OS (úsek 0,150 - 0,390)	Konštrukcia/Construction: zlepšené podlažie hydraulickým spojivom
Skúšaný materiál/Tester material: F8 CH (Cho)	Povet podm./Atm. Conditions: jasno 24°C
Lokality/Localita: miestny	Datum skúšky/ Test date: 9.6.2017
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,40$	Datum vystavenia / date of issuance: 30.6.2017
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument: statická záťaž súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191
Udaje o skúške - Information about the test: odcyklovanie	Zatlačovací cyklus - Load cycle: ZV 2121

0	0	0,25	0,71	1,70	2,75	2,07	1,67	0	0,95	1,14	1,45	2,14	1,06
0	50	100	200	300	100	50	50	0	50	100	100	200	0
$h_1 =$	0,99	0,5						$h_2 =$	0,69 mm				
$E_{del1} =$	23,78 MPa							$E_{del2} =$	34,12 MPa				
$E_{del2} / E_{del1} =$	1,43												

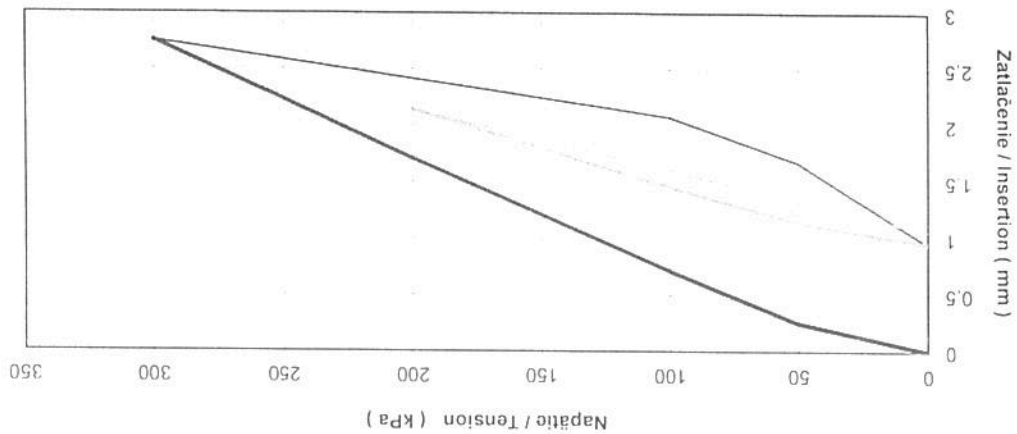

Vyhodnotenie/Evaluation: Požadavka podľa TKP.
 Požadované hodnoty / Required value: $E_{del2} \text{ (Mpa)} \geq 30 \text{ Mpa}$
 Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.
 $E_{del2} / E_{del1} \leq 2,5$

Prehlásenie/Resolution:
 Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents.
 Zosiak
 Skúšaný / Tested by
 Joze
 Kontroloval / controlled by
 Doprastav a.s.
 Technický a skúšobný servis
 Ľubochňanská 1/A, 831 04 Bratislava
 F-SP-2.2-8
 Strana 1 z 1



bojauktu

Protokol o skúške / Protocol about the test

číslo / number: 1715/2017/12.71ZV
Denník č. / Number of diary: 5/2017/12.71ZV

MIERA ZHUTNENIA ZEMÍN, SYPANÍN A PODKLADNÝCH VRSTIEV VOZOVKY

DEGREE OF COMPACTION

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s. Bratislava závod 15	Objekt/Object: SO 114-00
Objednávateľ/Client: 1505	Objekt/Object: 1505
Stavba/Building: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 1505
Stančenie/Stationing: km: 0,150 - 0,390	Objekt/Object: 1505
Počet meraní: 7	Objekt/Object: 1505
Skúšaný materiál/Estimated material: F8 CH (CHO)	Objekt/Object: 1505
Z lokality/ From quarry locality: miestny	Objekt/Object: 1505
Max. objemová hmotnosť ρ_{jmax} [kg m ⁻³]: 1453	Objekt/Object: 1505
Optimálna vlhkosť w_{opt} [%]: 24,0	Objekt/Object: 1505
Normy / Norms: STN 73 1375 Radiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti a súv.	Objekt/Object: 1505
Merací prístroj/Measuring instrument: Radiálny hutmeter TROXLER	Objekt/Object: 1505
Číslo SP/Number of TP: SP-2.7	Objekt/Object: 1505
Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 22	Objekt/Object: 1505

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

číslo m number	Miesto a stančenia / point and stationing	Objemová hmotnosť/Bulk density [kg/m ³]		vlhkosť/dampy	pw	pd	suchá/dry	Vlhkosť/ Dampness	Miera zhutnenia/ measured value
1	7.6.2017 km 0,175 PS	1797	1456	1735	1415	1431	1434	22,8	98,7
	priemer z troch meraní	1758	1431	1763	1434	1476	1456	22,9	98,5
2	7.6.2017 km 0,175 LS	1808	1456	1823	1476	1472	1468	23,8	101,0
	priemer z troch meraní	1822	1472	1818	1468	1440	1440	23,5	99,1
3	7.6.2017 km 0,250 LS	1732	1418	1730	1425	1428	1428	21,4	98,1
	priemer z troch meraní	1747	1428	1747	1428	1422	1422	24,0	97,9
4	8.6.2017 km 0,250 OS	1764	1422	1766	1427	1427	1437	24,1	98,9
	priemer z troch meraní	1783	1437	1841	1472	1465	1454	23,8	100,1
5	8.6.2017 km 0,350 PS	1821	1465	1801	1454	1464	1434	22,1	98,7
	priemer z troch meraní	1751	1434	1799	1456	1434	1456	23,6	100,2
6	8.6.2017 km 0,350 OS	1775	1434	1775	1434	1441	1472	23,8	101,3
	priemer z troch meraní	1822	1472	1776	1450	1459	1460	23,5	100,5
7	14.6.2017 km 0,100 LS	1810	1459	1803	1460	1456	1450	22,5	99,8
	priemer z troch meraní	1776	1450	1810	1459	1459	1459	24,1	100,4

Vyhodnotenie/Evaluation:

STN 73 6124 (tab. č. 15)

Požadovaná hodnota - Required value

D [%] =

min 97 %

Dosiahnutá Ø D [%]

99,6

Prehľadenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nemajú charakteru (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len vtedy, ak je súčasťou písomného súhlasu skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they are not substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Zosiak

Skúšaný/ Tested by

[Signature]

Jožek

Kontroloval/Controlled by

[Signature]

Doprastav a.s.
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
tel: 0994 -
e-mail: dooprastav@dooprastav.sk

bojauktu



Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo

121/5/2017/12.2/ZV
5/2017/2.2/ZV

číslo / number PNI

STATICKÁ ZATIAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., Bratislava - závod 15
Stavba/Building: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Stančenie/Stationing: km: 0,100 LS (úsek 0,150 - 0,390)
Skúšaný materiál/ Tested material: F8 CH (CHO)
Lokalita/Localita: miestny
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,40$
Metóda merania/Test method: STN 73 6190
Merací prístroj/Measuring instrument: statická záťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm
Udaje o skúške - Information about the test:

Metóda merania/Test method: STN 73 6190
Merací prístroj/Measuring instrument: statická záťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm
Udaje o skúške - Information about the test:
Zatážovací cyklus - Load cycle
II.
0 0
0 50 100 200 300
0,30 0,78 1,83 2,98
1,05 2,42 MPa
 $E_{def1} =$
 $E_{def2} =$
 $E_{def1} / E_{def2} = 2,10$
Napätie / Tension (kPa) 0 50 100 150 200 250 300 350
Zatiačenie / Insertion (mm) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0	0	0,30	0,78	1,83	2,98	100	2,62	2,26	1,64	0	50	1,85	2,10	2,60	1,76
0	50	100	200	300	400	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
E_{def1}	E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}	E_{def1} / E_{def2}

Vyhodnotenie/Evaluation: Požadavka podľa TKP.
Požadované hodnoty / Required value: $E_{def2} (MPa) \geq 45 MPa$
Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.
Prehlásenie/Resolution:
Results from the test are in accordance with the test and they are not substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.
Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty. Report môže byť reprodukováný len celým, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Zošíak
Kontrola / controlled by
Jozek
Doprastav a.s.
Technický a skúšobný servis
Lubochňanská 1/A, 831 04 Bratislava
- 0984P-2-2-8
Strana 1 z 1



Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo :

283/5/2017/2.2/ZV

denník číslo :


5/2017/2.2/ZV

číslo / number PNI :

STATICKÁ ZATIAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s., Bratislava - závod 15	Odberateľ/Customer:	1505
Stavba/Building:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Stančenie/Stationing:	km: 0,410 LS	Konstrukcia/Construction:	zlepšené podložie hydraulickým, spojivom
Skúšaný materiál/Tested material:	F8 CH (CHO)	Povet. podm./Atm. Conditions:	poľočasno 28°C
Lokalita/Localita:	miestny	Datum skúšky/ Test date:	18.8.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	v = 0,40	Datum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017
Doporučené hodnoty/Recommended value:	k = 23,54	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Ev. karta meradia/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická záťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	odchýlkomer	
Údaje o skúške - Information about the test :			

I.		odťaženie - unloading	
h ₁ =	0	h ₂ =	0
E _{del1} =	26,45 MPa	E _{del2} =	50,09 MPa
h ₁ =	0,89	h ₂ =	0,47 mm
E _{del1} / E _{del2} =	1,89	E _{del1} / E _{del2} =	1,89

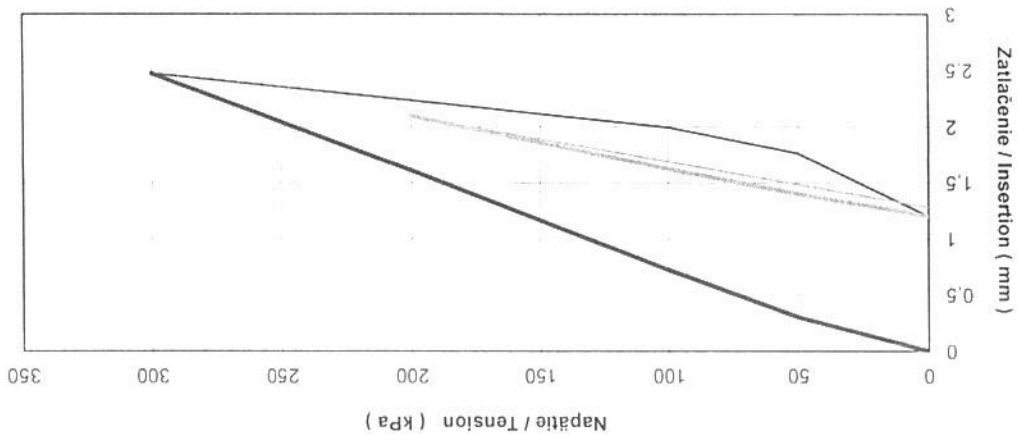

Vyhodnotenie/Evaluation: Požadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value: $E_{del2} \geq 30 \text{ Mpa}$ $E_{del2}/E_{del1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Skúšaný/ Tested by:	Zošík	Kontroloval / controlled by:	Jozek
Doprastav a.s., Bratislava			

Don't

ZORUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRY, NITRA										
PopisSTABAG										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
20.6.2017	127/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,225 (0,185-0,400)	sanačná vrstva typ II.	SZS	ŠD Pohranice 0/63	1	45 MPA	161,12 Mpa; 2,06	Vyhovuje
20.6.2017	128/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,375 (0,185-0,400)	sanačná vrstva typ II.	SZS	ŠD Pohranice 0/63	1	45 MPA	130,43 Mpa; 2,43	Vyhovuje
22.6.2017	132/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,300 (0,100-0,350)	sanačná vrstva typ I.	SZS	ŠD Pohranice 0/63	1	60 MPA	114,13 Mpa; 1,92	Vyhovuje
20.7.2017	192/5/2017/2.2/ZV	114-00	1,450	sanačná vrstva typ I.	SZS	ŠD Hostie 0/63	1	60 Mpa	114,13 Mpa; 1,92	Vyhovuje
28.8.2017	299/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,425	sanačná vrstva typ II.	SZS	ŠD Pohranice 0/63	1	45 MPA	81,52 Mpa; 1,61	Vyhovuje


Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 127/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberteľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,225 PS (úsek: 0,185 - 0,400)	Konštrukcia/Construction:	Sanačná vrstva - typ II.
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 25°C
Lokalita/Localita:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	20.6.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.6.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	27,39
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191
	odchylkomer		ZV 2121
Údaje o skúške - Information about the test:	Zaťažovací cyklus - Load cycle		

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,16	0,34	0,69	1,06	0,91	0,82	0,59	0,67	0,77	0,94	0,64
$h_1 =$	0,35	0,5					$h_2 =$	0,17 mm			
$E_{def1} =$	78,26 MPa						$E_{def2} =$	161,12 MPa			
					$E_{def2} / E_{def1} =$		2,06				

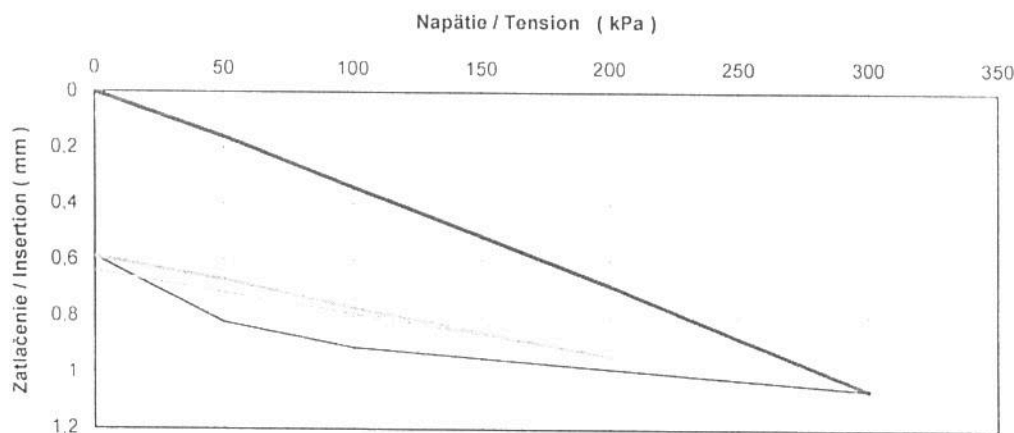

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.
 Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 45 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$
 Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav, a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
-----------------------------	--------------------------------------	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 128/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo : 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,375 PS (úsek: 0,185 - 0,400)	Konštrukcia/Construction:	Sanačná vrstva - typ II.
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 25°C
Lokalita/Localita:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	20.6.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.6.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	27,39
Metoda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191
	odchylkomer		ZV 2121

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,24	0,48	0,99	1,53	1,32	1,20	0,92	1,01	1,12	1,33	0,98


$h_1 = 0,51 \quad 0,5$

$h_2 = 0,21 \text{ mm}$

$E_{def1} = 53,71 \text{ MPa}$

$E_{def2} = 130,43 \text{ MPa}$

$E_{def2} / E_{def1} = 2,43$

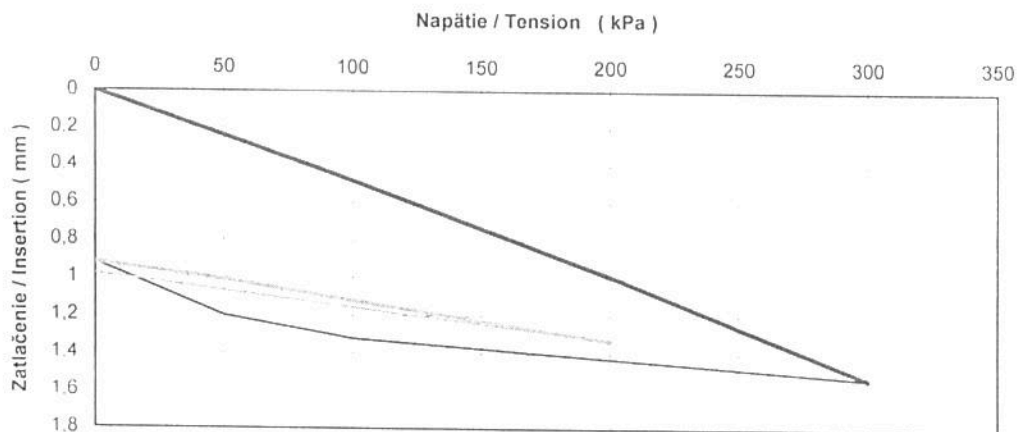

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 45 \text{ Mpa}$

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav, a.s. Technický a skúšobný servis Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
-----------------------------	--------------------------------------	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 132/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Building:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km:0,160 OS	Konštrukcia/Construction:	Sanačná vrstva - typ I.
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 25°C
Lokalita/Localita:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	22.6.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.6.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	27,39
Metoda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler EC1 Ø 357 mm	Ev karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121
		odchylkomer	

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,19	0,41	0,87	1,31	1,10	0,93	0,58	0,76	0,90	1,14	0,63


$h_1 = 0,46$ $0,5$

$h_2 = 0,24$ mm

$E_{def1} = 59,54$ MPa

$E_{def2} = 114,13$ MPa

$E_{def2} / E_{def1} = 1,92$

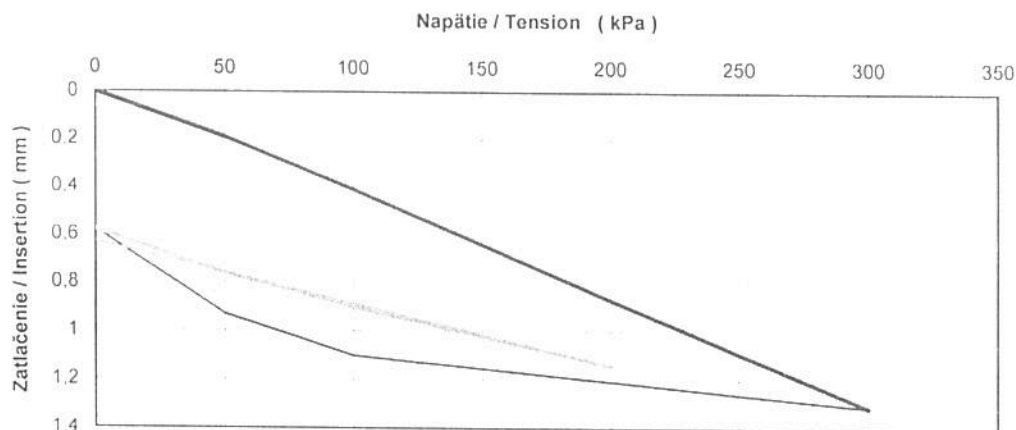

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) ≥ 60 Mpa

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by 	Jozek Kontroloval / controlled by 	 Doprastav, a.s. Technický a skúšobný servis Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
---------------------------------	--	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 299/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Buiding: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00																																				
Staničenie/Stationing: km: 0,420 LS	Konštrukcia/Construction: Sanačná vrstva - typ II.																																				
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions: jasno 25°C																																				
Lokalita/Localita: Hostie	Dátum skúšky/ Test date: 28.8.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance: 31.8.2017																																				
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 26,9$																																				
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191																																				
odchylkomer	ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :																																					
Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>100</th> <th>50</th> <th>0</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,22</td> <td>0,46</td> <td>0,99</td> <td>1,48</td> <td>1,21</td> <td>1,00</td> <td>0,58</td> <td>0,75</td> <td>0,92</td> <td>1,25</td> <td>0,63</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,22	0,46	0,99	1,48	1,21	1,00	0,58	0,75	0,92	1,25	0,63
I.					odľahčenie - unloading		II.																														
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																										
0	0,22	0,46	0,99	1,48	1,21	1,00	0,58	0,75	0,92	1,25	0,63																										
$h_1 = 0,53$	$0,5$	$h_2 = 0,33$ mm																																			
$E_{def1} = 50,75$ MPa	$E_{def2} = 81,52$ MPa																																				
$E_{def2} / E_{def1} = 1,61$																																					
Napätie / Tension (kPa)																																					
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) ≥ 45 Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																					
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																					
Zošiak Skúšan/ Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by																																				

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo 192/5/2017/2.2/ZV
denník číslo 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST


Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Building: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00
Staničenie/Stationing: km: 0,050 LS	Konštrukcia/Construction: Sanačná vrstva - typ I.
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 25°C
Lokalita/Localita: Hostie	Dátum skúšky/ Test date: 20.7.2017
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance: 31.7.2017
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 26,9$
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191
	ZV 2121

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,15	0,38	0,93	1,50	1,33	1,19	0,86	0,98	1,10	1,33	0,91

$h_1 = 0,55$ $0,5$ $h_2 = 0,23$ mm
 $E_{def1} = 48,91$ MPa $E_{def2} = 116,96$ MPa
 $E_{def2} / E_{def1} = 2,39$

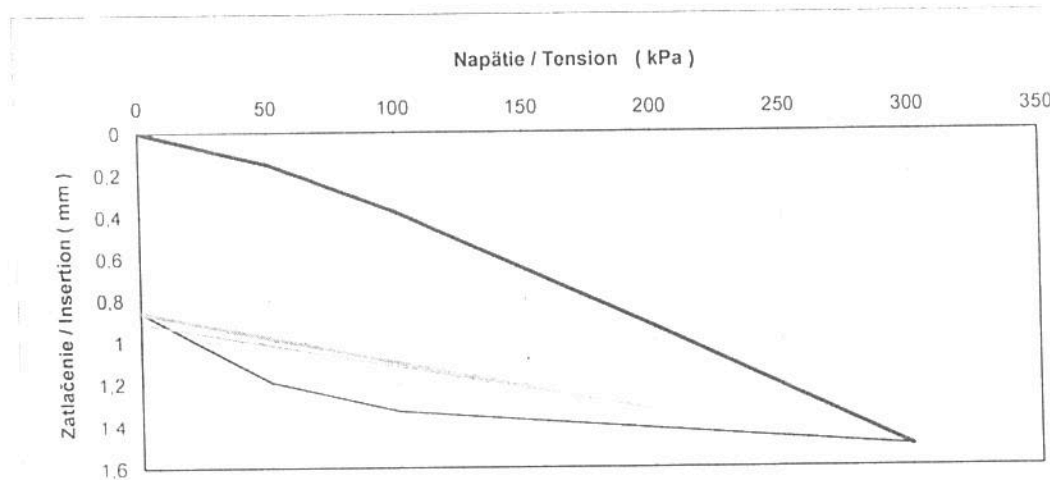

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) ≥ 60 Mpa

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only with the written consent of the test laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav, a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0934
-----------------------------	--------------------------------------	--

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
ZODRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA										
Dopravný STRABAG										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
7.7.2017	13/2017/ZP/Z/V	114-00	1,600	násyp	SZS/LDD	ŠD HKS Pohranice 0/125	8/24		70MPa	Vyhovuje
2.8.2017	243/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,075	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	130,43MPa; 2,38	Vyhovuje
2.8.2017	244/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,150	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	136,95 MPa; 2,35	Vyhovuje
9.8.2017	262/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,200	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	124,50MPa; 2,32	Vyhovuje
9.8.2017	263/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,275	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	130,43 MPa; 2,05	Vyhovuje
9.8.2017	264/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,310	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	136,95MPa; 2,15	Vyhovuje
4.9..2017	327/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,300	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	119,09 1,57	Vyhovuje
4.9..2017	328/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,175	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	130,43 1,76	Vyhovuje
4.9..2017	329/5/2017/2.2/Z/V	114-00	0,050	násyp - pláň pod a.z.	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	158,24 2,06	Vyhovuje
18.7.2017	185/5/2017/2.2/Z/V	114-00	km 0,310 PS	násyp 1 vrstva	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	124,5MPa; 1,50	Vyhovuje
18.7.2017	186/5/2017/2.2/Z/V	114-00	km 0,210 PS	násyp 1 vrstva	SZS	ŠDčierne Kľačany0/125	1	70MPa	109,56MPa; 2,4	Vyhovuje

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo 185/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,310 PS	Konštrukcia/Construction:	násyp 1 vrstva																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 22°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Dátum skúšky/ Test date:	18.7.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.7.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	27,39																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																				
	odchylkomer		ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,20</td> <td>0,40</td> <td>0,73</td> <td>1,03</td> <td>0,82</td> <td>0,67</td> <td>0,35</td> <td>0,52</td> <td>0,66</td> <td>0,88</td> <td>0,39</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,20	0,40	0,73	1,03	0,82	0,67	0,35	0,52	0,66	0,88	0,39		
I.					odľahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,20	0,40	0,73	1,03	0,82	0,67	0,35	0,52	0,66	0,88	0,39																												
$h_1 = 0,33 \quad 0,5$ $E_{def1} = 83,00 \text{ MPa}$		$h_2 = 0,22 \text{ mm}$ $E_{def2} = 124,50 \text{ MPa}$ $E_{def2} / E_{def1} = 1,50$																																					
Napätie / Tension (kPa)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť sa po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only with the written consent of the test laboratory.																																							
Zošiak Skušal/Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava 0994																																					

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 186/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"					Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"						
Stavba/Buiding: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra					Objekt/Object: 114-00						
Staničenie/Stationing: km: 0,210 LS					Konštrukcia/Construction: násyp 1 vrstva						
Skušany material/Tested material: ŠD 0/125					Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 22°C						
Lokalita/Localita: Čierne Kl'ačany					Datum skúšky/ Test date: 18.7.2018						
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,15$					Datum vystavenia / date of issuance: 31.7.2017						
					Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 27,39$						
Metóda merania/Test method: STN 73 6190					Číslo SP/Number of TP: SP-2.2						
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm					Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191						
					ZV 2121						
Údaje o skúške - Information about the test :					Zaťažovací cyklus - Load cycle						
I.					II.						
odľahčenie - unloading											
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,17	0,40	1,00	1,60	1,40	1,25	0,97	1,09	1,22	1,47	1,04
$h_1 = 0,6 \quad 0,5$					$h_2 = 0,25 \text{ mm}$						
$E_{def1} = 45,65 \text{ MPa}$					$E_{def2} = 109,56 \text{ MPa}$						
$E_{def2} / E_{def1} = 2,40$											
Napätie / Tension (kPa)											
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$											
Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$											
Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.											
Prehlásenie/Resolution:											
Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokoly môžu byť reprodukovány len celky, jeho časť sa po písomnom súhlase s príslušnou laboratóriou.											
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after the written agreement with the laboratory.											
Zošiak Skúšan/ Tested by: <i>[Signature]</i>				Jozek /Kontroloval / controlled by: <i>[Signature]</i>				Dopraštav a. s. TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava 0994 - Oľtačok pečiatky			

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 243/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00
Staničenie/Staniing: km: 0,075 OS	Konštrukcia/Construction: násyp - pláň pod aktívnu zónu
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions: jasno 33°C
Lokalita/Localita: Čierne Kláčany	Dátum skúšky/ Test date: 2.8.2017
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance: 31.8.2017
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 27,39$
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191
	ZV 2121

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,18	0,42	0,94	1,50	1,28	1,16	0,90	1,01	1,12	1,33	0,95

$$h_1 = 0,52 \quad 0,5$$


$$h_2 = 0,21 \text{ mm}$$

$$E_{def1} = 52,67 \text{ MPa}$$

$$E_{def2} = 130,43 \text{ MPa}$$

$$E_{def2} / E_{def1} = 2,48$$

Napätie / Tension (kPa)

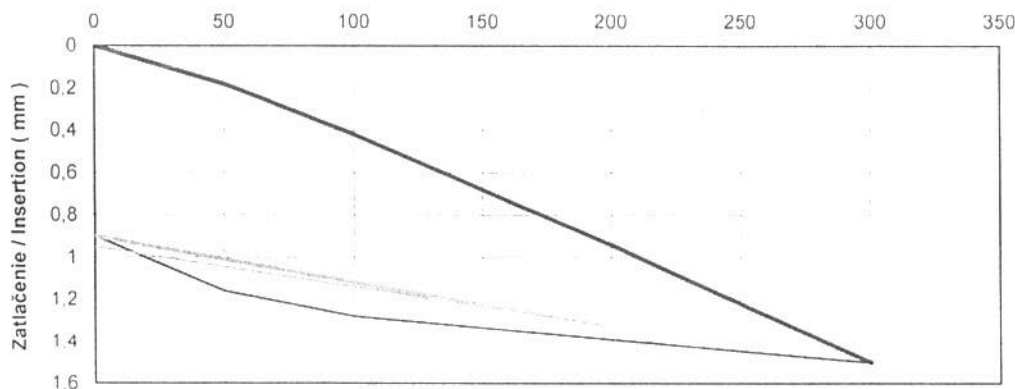

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty / Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak

Skúšaný/Tested by

Jozek

Kontroloval / controlled by

Doprastav

Doprastav, a.s.
Technický a skúšobný servis
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
- 0994 -

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 244/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,150 LS	Konštrukcia/Construction:	násyp - plán pod aktivnu zónu																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions:	jasno 33°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Dátum skúšky/ Test date:	2.8.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 27,39$																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odfahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,20</td> <td>0,43</td> <td>0,90</td> <td>1,40</td> <td>1,25</td> <td>1,12</td> <td>0,90</td> <td>1,00</td> <td>1,08</td> <td>1,28</td> <td>0,95</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odfahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,20	0,43	0,90	1,40	1,25	1,12	0,90	1,00	1,08	1,28	0,95		
I.					odfahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,20	0,43	0,90	1,40	1,25	1,12	0,90	1,00	1,08	1,28	0,95																												
$h_1 =$	0,47	0,5	$h_2 =$	0,2 mm																																			
$E_{def1} =$	58,28 MPa		$E_{def2} =$	136,95 MPa																																			
$E_{def2} / E_{def1} =$				2,35																																			
Napätie / Tension (kPa)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, nor part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skúšaný/Tested by				Jozek Kontroloval / controlled by																																			

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 262/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																																
Stavba/Buiding:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																																
Staničenie/Stationing:	km: 0,200 PS	Konštrukcia/Construction:	násyp - pláň pod aktívnu zónu																																																
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions:	jasno 33°C																																																
Lokalita/Localita:	Čierne Kláčany	Dátum skúšky/ Test date:	9.8.2017																																																
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017																																																
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 27,39$																																																
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																																
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121																																																
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>100</th> <th>50</th> <th>0</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,02</td> <td>0,19</td> <td>0,41</td> <td>0,92</td> <td>1,42</td> <td>1,24</td> <td>1,11</td> <td>0,80</td> <td>0,90</td> <td>1,01</td> <td>1,23</td> <td>0,83</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0,02	0,19	0,41	0,92	1,42	1,24	1,11	0,80	0,90	1,01	1,23	0,83	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>$h_1 = 0,51$</td> <td>$0,5$</td> <td>$h_2 = 0,22$</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>$E_{def1} = 53,71$</td> <td>MPa</td> <td>$E_{def2} = 124,50$</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td colspan="4">$E_{def2} / E_{def1} = 2,32$</td> </tr> </tbody> </table>		$h_1 = 0,51$	$0,5$	$h_2 = 0,22$	mm	$E_{def1} = 53,71$	MPa	$E_{def2} = 124,50$	MPa	$E_{def2} / E_{def1} = 2,32$			
I.					odľahčenie - unloading		II.																																												
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																																								
0,02	0,19	0,41	0,92	1,42	1,24	1,11	0,80	0,90	1,01	1,23	0,83																																								
$h_1 = 0,51$	$0,5$	$h_2 = 0,22$	mm																																																
$E_{def1} = 53,71$	MPa	$E_{def2} = 124,50$	MPa																																																
$E_{def2} / E_{def1} = 2,32$																																																			
Napätie / Tension (kPa)																																																			
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} (Mpa) \geq 70$ Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																																			
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory																																																			
Zošiak	Jozek	Doprastav																																																	
Skušal/ Tested by	Kontroloval / controlled by	Odtlačok pečiatky																																																	

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 263/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00
Staničenie/Stationing: km: 0,275 OS	Konštrukcia/Construction: násyp - pláň pod aktívnu zónu
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions: jasno 33°C
Lokalita/Localita: Čierne Kláčany	Dátum skúšky/ Test date: 9.8.2017
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance: 31.8.2017
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 27,39$
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191
	ZV 2121
Údaje o skúške - Information about the test:	Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,16	0,37	0,80	1,24	1,03	0,90	0,63	0,73	0,83	1,04	0,66

$h_1 = 0,43 \quad 0,5$


$h_2 = 0,21 \text{ mm}$

$E_{def1} = 63,70 \text{ MPa}$

$E_{def2} = 130,43 \text{ MPa}$

$E_{def2} / E_{def1} = 2,05$

Napätie / Tension (kPa)

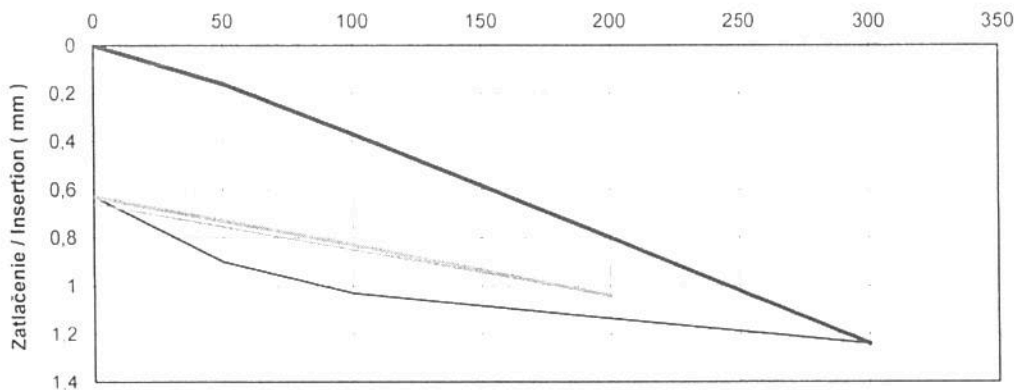

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty / Required value:

$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$

$E_{def2} / E_{def1} \leq 2,6$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by	Jozek Kontroloval / controlled by	Doprastav Technický a skúšobný servis Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 - F.SP-2.2.8
-----------------------------	--------------------------------------	---

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 264/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,310 LS	Konštrukcia/Construction:	násyp - plán pod aktívnu zónu																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions:	jasno 33°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Dátum skúšky/ Test date:	9.8.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	31.8.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 27,39$																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121																																				
odchylkomer																																							
Údaje o skúške - Information about the test:	Zaťažovací cyklus - Load cycle																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odfahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,19</td> <td>0,39</td> <td>0,82</td> <td>1,26</td> <td>1,02</td> <td>0,89</td> <td>0,67</td> <td>0,76</td> <td>0,86</td> <td>1,06</td> <td>0,72</td> </tr> </tbody> </table>				I.					odfahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,19	0,39	0,82	1,26	1,02	0,89	0,67	0,76	0,86	1,06	0,72
I.					odfahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,19	0,39	0,82	1,26	1,02	0,89	0,67	0,76	0,86	1,06	0,72																												
$h_1 =$	0,43	0,5			$h_2 =$	0,2 mm																																	
$E_{def1} =$	63,70 MPa				$E_{def2} =$	136,95 MPa																																	
					$E_{def2} / E_{def1} = 2,15$																																		
Napätie / Tension (kPa)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value: $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skušal/Tested by Strana 1 z 1				Jozek Kontroloval / controlled by				Doprastav Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -																															

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 327/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Building: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00																																				
Staničenie/Stationing: km: 0,300 LS	Konštrukcia/Construction: násyp - pláň pod aktivnu zónu																																				
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 20°C																																				
Lokalita/Localita: Čierne Kláčky	Dátum skúšky/ Test date: 4.9.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance: 30.9.2017																																				
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 27,39$																																				
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191																																				
	odchylkomer ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test:	Zaťažovací cyklus - Load cycle																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,12</td> <td>0,30</td> <td>0,66</td> <td>1,03</td> <td>0,69</td> <td>0,56</td> <td>0,30</td> <td>0,41</td> <td>0,55</td> <td>0,78</td> <td>0,34</td> </tr> </tbody> </table>	I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,12	0,30	0,66	1,03	0,69	0,56	0,30	0,41	0,55	0,78	0,34	
I.					odľahčenie - unloading		II.																														
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																										
0	0,12	0,30	0,66	1,03	0,69	0,56	0,30	0,41	0,55	0,78	0,34																										
$h_1 = 0,36$	$0,5$	$h_2 = 0,23$ mm																																			
$E_{def1} = 76,08$ MPa		$E_{def2} = 119,09$ MPa																																			
$E_{def2} / E_{def1} = 1,57$																																					

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value:

$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70$ Mpa

$E_{def2} / E_{def1} \leq 2,6$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by 	Gerek Kontroloval / controlled by 	 Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava Oblasťné laboratórium Zvolen
---------------------------------	--	--

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 328/5/2017/2.2/ZV
denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Buiding:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,175 OS	Konštrukcia/Construction:	násyp - plán pod aktivnu zónu																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Dátum skúšky/ Test date:	4.9.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 27,39$																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																				
	odchylkomer		ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odfahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,16</td> <td>0,35</td> <td>0,72</td> <td>1,06</td> <td>0,78</td> <td>0,65</td> <td>0,45</td> <td>0,56</td> <td>0,66</td> <td>0,87</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odfahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,16	0,35	0,72	1,06	0,78	0,65	0,45	0,56	0,66	0,87	0,50		
I.					odfahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,16	0,35	0,72	1,06	0,78	0,65	0,45	0,56	0,66	0,87	0,50																												
$h_1 =$	0,37	0,5	$h_2 =$	0,21 mm																																			
$E_{def1} =$	74,03 MPa			$E_{def2} =$	130,43 MPa																																		
				$E_{def2} / E_{def1} =$	1,76																																		
Napätie / Tension (kPa) Zatačenie / Insertion (mm)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,6$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skúšan/ Tested by				Gerek Kontroloval / controlled by				Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava Oblasťné laboratórium Zvolen																															

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 329/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo : 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST


Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00
Staničenie/Stationing: km: 0,050 PS	Konštrukcia/Construction: násyp - plán pod aktivnu zónu
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/125	Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 20°C
Lokalita/Localita: Čierne Kláčany	Dátum skúšky/ Test date: 4.9.2017
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,15$	Dátum vystavenia / date of issuance: 30.9.2017
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 27,39$
Metóda merania/Test method: STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP: SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument: statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 2191
	ZV 2121

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,14	0,30	0,70	1,09	0,89	0,79	0,55	0,65	0,75	0,96	0,58

$h_1 = 0,4 \quad 0,5$
 $h_2 = 0,21 \text{ mm}$
 $E_{def1} = 68,48 \text{ MPa}$
 $E_{def2} = 130,43 \text{ MPa}$
 $E_{def2} / E_{def1} = 1,90$

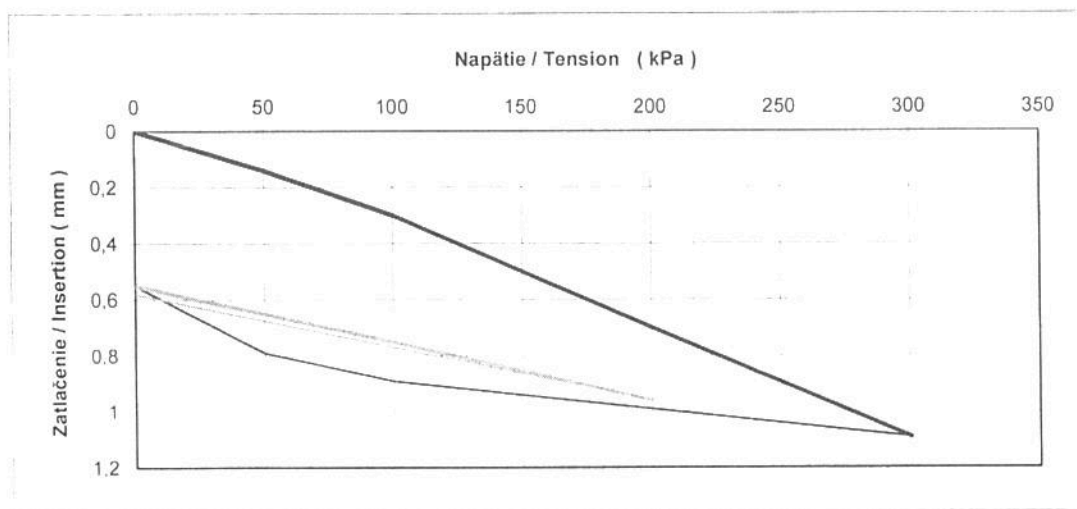

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value :

$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70 \text{ Mpa}$

$E_{def2} / E_{def1} \leq 2,6$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase zodpovedného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/ Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava 0994 - Otláčok pečiatky
-----------------------------	--------------------------------------	--

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
ZDROJENIE INFORMÁCIÍ										
DOPLNKOVÉ STRAŽNÍK										
DOPLNKOVÉ STRAŽNÍK										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
25.9.2017	364/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,050(0,00-0,430)	konštrukčná pláň	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	112,08 1,88	Vyhovuje
25.9.2017	365/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,125(0,00-0,430)	konštrukčná pláň	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	107,60 2,44	Vyhovuje
25.9.2017	366/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,170(0,00-0,430)	konštrukčná pláň	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	107,60 2,16	Vyhovuje
25.9.2017	367/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,260(0,00-0,430)	konštrukčná pláň	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	72,70 2,16	Nevyhovuje
25.9.2017	368/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,3550(0,00-0,430)	konštrukčná pláň	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	89,67 2,73	Nevyhovuje
26.9.2017	374/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,3550(0,00-0,430)	konštr. pláň- opakovaná	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	92,76 2	Vyhovuje
2.10.2017	379/5/2017/2.2/ZV	114-00	0,260(0,00-0,430)	konštr. pláň- opakovaná	SZS	ŠD Čierne Kľáčany0/63	1	90MPa	112,08	Vyhovuje
26.9.2017	29/5/2017/10.32/ZV	114-00	0,3550(0,00-0,430)	konštrukčná pláň	lata	ŠD Čierne Kľáčany0/63	30	max 40mm	0-20	Vyhovuje

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 364/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,050 PS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná pláň																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Datum skúšky/ Test date:	25.9.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Datum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 26,9$																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																				
	odchylkomer		ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,16</td> <td>0,36</td> <td>0,81</td> <td>1,25</td> <td>1,03</td> <td>0,87</td> <td>0,57</td> <td>0,74</td> <td>0,89</td> <td>1,13</td> <td>0,60</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,16	0,36	0,81	1,25	1,03	0,87	0,57	0,74	0,89	1,13	0,60		
I.					odľahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,16	0,36	0,81	1,25	1,03	0,87	0,57	0,74	0,89	1,13	0,60																												
$h_1 =$	0,45	0,5	$h_2 =$	0,24 mm																																			
$E_{def1} =$	59,78 MPa			$E_{def2} =$	112,08 MPa																																		
				$E_{def2} / E_{def1} =$	1,88																																		
Napätie / Tension (kPa)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty / Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť môže byť použitá len so súhlasom laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skúšan/ Tested by				Gerek Kontroloval / controlled by				Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 - Oľtačok pečiatky																															

Protokol o skúške - Protocol about the test


číslo : 365/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,125 PS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná pláň
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20°C
Lokalita/Localita:	Čierne Kl'ačany	Dátum skúšky/ Test date:	25.9.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	26,9
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž. súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191
	odchylkomer		ZV 2121
Údaje o skúške - Information about the test :	Zaťažovací cyklus - Load cycle		

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,25	0,57	1,18	1,80	1,53	1,38	0,92	1,16	1,36	1,61	1,03

$h_1 = 0,61$ $0,5$ $h_2 = 0,25$ mm
 $E_{def1} = 44,10$ MPa $E_{def2} = 107,60$ MPa
 $E_{def2} / E_{def1} = 2,44$

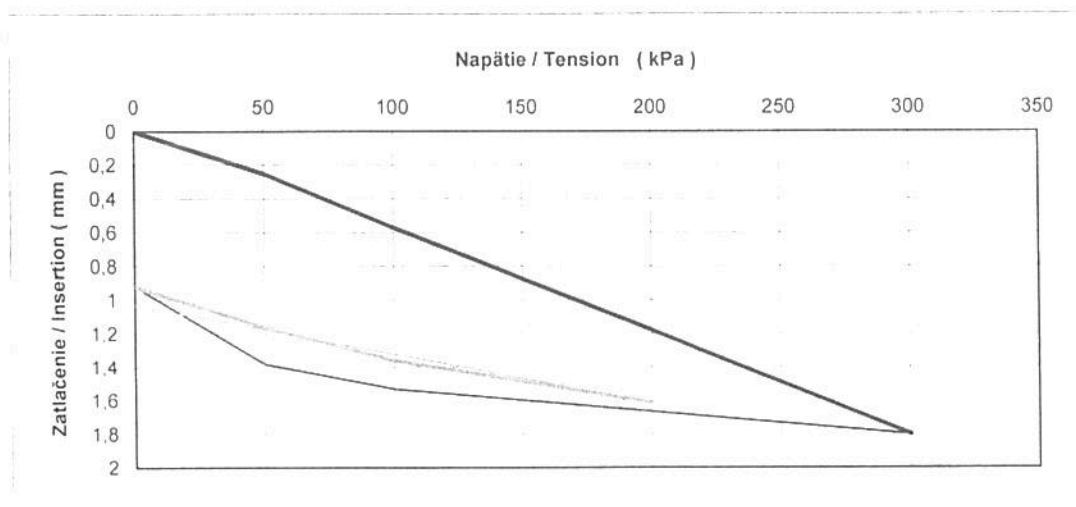

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.
 Požadované hodnoty / Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90$ Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$
 Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť môže byť použitá len so súhlasom laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only with written consent of the laboratory.

Zošiak Skušal/Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 - Otláčok pečiatky
----------------------------	--------------------------------------	---

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 366/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,170 OS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná plán																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kl'ačany	Dátum skúšky/ Test date:	25.9.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	26,9																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																				
	odchylkomer		ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>100</th> <th>50</th> <th>0</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,23</td> <td>0,51</td> <td>1,05</td> <td>1,59</td> <td>1,30</td> <td>1,16</td> <td>0,72</td> <td>0,99</td> <td>1,19</td> <td>1,44</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,23	0,51	1,05	1,59	1,30	1,16	0,72	0,99	1,19	1,44	0,80		
I.					odľahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,23	0,51	1,05	1,59	1,30	1,16	0,72	0,99	1,19	1,44	0,80																												
$h_1 = 0,54$ $0,5$ $E_{def1} = 49,81 \text{ MPa}$		$h_2 = 0,25 \text{ mm}$ $E_{def2} = 107,60 \text{ MPa}$ $E_{def2} / E_{def1} = 2,16$																																					
Napätie / Tension (kPa)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skúšaný/Tested by 	Gerek Kontroloval / controlled by 	 Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava Oľga Horáčiková																																					

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 367/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,260 LS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná pláň																																				
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20°C																																				
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Dátum skúšky/ Test date:	25.9.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 26,9$																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																				
	odchylkomer		ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,32</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td>2,42</td> <td>2,08</td> <td>1,82</td> <td>1,10</td> <td>1,57</td> <td>1,85</td> <td>2,22</td> <td>1,34</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,32	0,80	1,60	2,42	2,08	1,82	1,10	1,57	1,85	2,22	1,34		
I.					odľahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,32	0,80	1,60	2,42	2,08	1,82	1,10	1,57	1,85	2,22	1,34																												
$h_1 = 0,8 \quad 0,5$ $E_{def1} = 33,63 \text{ MPa}$		$h_2 = 0,37 \text{ mm}$ $E_{def2} = 72,70 \text{ MPa}$ $E_{def2} / E_{def1} = 2,16$																																					
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$ Kontrolovaná vrstva nevyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť sa nepísomnom súhlasom skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skúšal/Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	Doprastav a. s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava 0994 - Otláčok pečiatky																																					


Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 379/5/2017/2.2/ZV
denník číslo : 5/2017/2.2/ZV
číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Building:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,260 LS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná pláň - opakovaná sk.
Skúšaný materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 5°C
Lokalita/Localita:	Čierne Kláčany	Dátum skúšky/ Test date:	26.9.2017
Poissonove číslo/Poisson No.	$\nu = 0,20$	Datum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017
Metoda merania/Test method:	STN 73 6190	Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	26,9
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
odchylkomer		Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle	

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,18	0,42	0,94	1,44	1,12	0,99	0,69	0,85	1,00	1,24	0,73
$h_1 =$	0,52	0,5					$h_2 =$	0,24 mm			
$E_{def1} =$	51,73 MPa						$E_{def2} =$	112,08 MPa			
					$E_{def2} / E_{def1} =$		2,17				

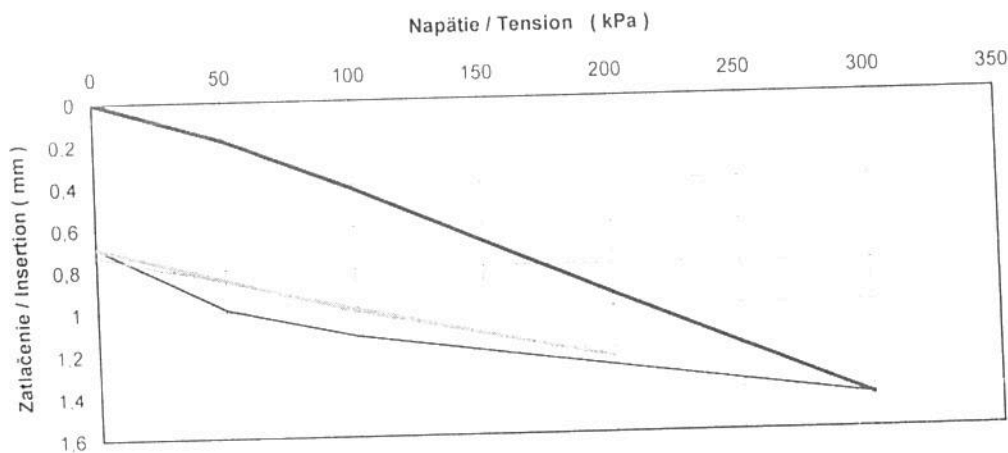

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.
Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$
Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP.

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak

Skúšan/ Tested by

Gerek

Kontroloval / controlled by

Doprastav

Doprastav, a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
- 0994 -

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 368/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object: 114-00
Staničenie/Stationing: km: 0,355 OS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction: konštrukčná pláň
Skúšaný materiál/Tested material: ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 20°C
Lokalita/Localita: Čierne Kl'áčany	Dátum skúšky/ Test date: 25.9.2017
Poissonove číslo/Poisson No: $\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance: 30.9.2017
	Doporučené hodnoty/Recommended value $k = 26,9$

Metóda merania/Test method: STN 73 6190
 Merací prístroj/Measuring instrument:
 statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm
 odchylkomer

Číslo SP/Number of TP: SP-2.2
 Ev. karta meradla/Registration card of gauge:
 ZV 2191
 ZV 2121

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,25	0,64	1,46	2,22	1,86	1,65	1,13	1,46	1,68	1,98	1,26


$h_1 = 0,82 \quad 0,5$

$h_2 = 0,3 \text{ mm}$

$E_{def1} = 32,80 \text{ MPa}$

$E_{def2} = 89,67 \text{ MPa}$

$E_{def2} / E_{def1} = 2,73$

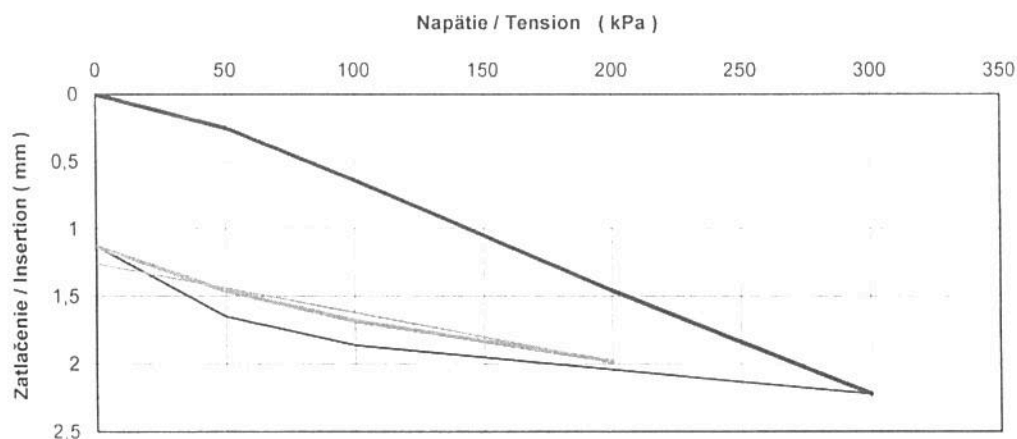

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value :

$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90 \text{ Mpa}$

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva **nevyhovuje** požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	Doprastav Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava Oblasť Zvolen
----------------------------	--------------------------------------	---

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 374/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,355 OS (0,00 - 0,430)	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná pláň - opakovaná sk.
Skušany materiál/Tested material:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20°C
Lokalita/Localita:	Čierne Kľačany	Dátum skúšky/ Test date:	26.9.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.9.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value	$k = 26,9$
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191 ZV 2121
odchylkomer			

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odľahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,28	0,56	1,15	1,66	1,32	1,12	0,71	0,92	1,15	1,44	0,78


$h_1 = 0,59 \quad 0,5$

$h_2 = 0,29 \text{ mm}$

$E_{def1} = 45,59 \text{ MPa}$

$E_{def2} = 92,76 \text{ MPa}$

$E_{def2} / E_{def1} = 2,03$

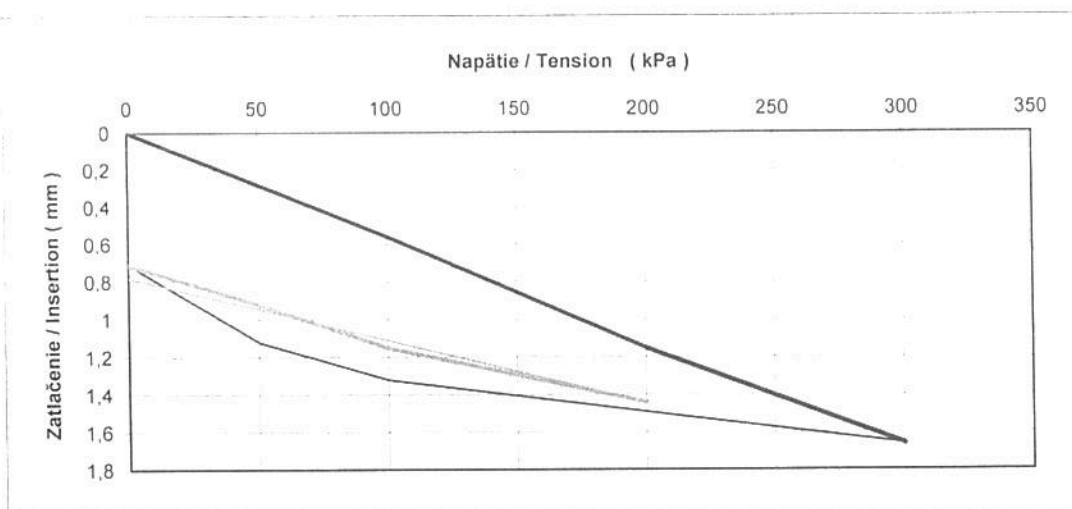

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value :

$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90 \text{ Mpa}$

$E_{def2}/E_{def1} \leq 2,5$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase akejkoľvek laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšan/Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 - Otlačok pečiatky
----------------------------	--------------------------------------	---

Protokol o skúške / Protocol about the test

MERANIE NEROVNOSTI VRSTIEV VOZOVKY LATOU / IRREGULARITY MEASUREMENT OF PAVEMENT COURSES

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	114-00
Staničenie/Stationing:	km 0,00 - 0,430	Konštrukcia/Construction:	konštrukčná plán
Názov výrobku/Product name:	ŠD 0/63	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 20 °C
Výrobca/Manufacturer:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	26.9.2017
		Dátum skúšky/ Test date:	30.9.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13036-7	Číslo SP/Number of TP:	SP-10.32
Merací prístroj/Measuring instrument:	merací klin, lata 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	M 2208

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Pozdĺžna / priečna nerovnosť - Longitudinal / cross irregularity [mm]

Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)	Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)	Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)
1.	pozdižne	0,0500	15	30.				59.			
2.	pozdižne	0,1500	25	31.				60.			
3.	pozdižne	0,2500	18	32.				61.			
4.	pozdižne	0,3500	20	33.				62.			
5.	pozdižne	0,4000	21	34.				63.			
6.	priečne	0,0500	14	35.				64.			
7.	priečne	0,1500	18	36.				65.			
8.	priečne	0,2500	14	37.				66.			
9.	priečne	0,3500	23	38.				67.			
10.	priečne	0,4000	20	39.				68.			
11.				40.				69.			
12.				41.				70.			
13.				42.				71.			
14.				43.				72.			
15.				44.				73.			
16.				45.				74.			
17.				46.				75.			
18.				47.				76.			
19.				48.				77.			
20.				49.				78.			
21.				50.				79.			
22.				51.				80.			
23.				52.				81.			
24.				53.				82.			
25.				54.				83.			
26.				55.				84.			
27.				56.				85.			
28.				57.				86.			
29.				58.				87.			

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6133 Stavba ciest Teleso pozemných komunikácií.
Požadovaná hodnota - Required value max. 40 mm pozdižna max. 30 mm priečna
Kontrolovaná vrstva nevyhovuje požiadavkám STN

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory

Zošiak Skúšal/Tested by
 Gerek Kontroloval / controlled by
 Doprastav a.s.
 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
 Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
 - 0994 -
 odtlačok pečiatky
