

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG



Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Projektant: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zhotoviteľ stav. objektu: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Dodatok – v zmysle pripomienok STD

Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt : SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkami „J“ a „L“

Vypracoval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. STRABAG s.r.o.	Kontroloval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Schválil za stavebný dozor: Mgr. Ivana Šimková, PhD. Slovenská správa ciest - IVSC
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Dátum: 14.9.18	Dátum: 14.9.18	Dátum: 23.10.2018
Zväzok č.:		



OBSAH DOKUMENTÁCIE KVALITY STAVBY

1. Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov
2. Protokoly skúšok
3. Technologické postupy, KSP a vyhodnotenú KSP
4. Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k použitým materiálom

Ku dňu odovzdávania dodatku dokumentácie kvality bolo zotrúvnenie zrealizované v zmysle PD.
Boli doplnené skúšky v zmysle KSP.




Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Projektant: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zhotoviteľ stav. objektu: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

DOKUMENTÁCIA KVALITY STAVBY

Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Objekt : SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkami „J“ a „L“

Vypracoval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. STRABAG s.r.o.	Kontroloval za zhotoviteľa: Ing. Dušan Putirka, PhD. ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Schválil za stavebný dozor: Mgr. Ivana Šimková, PhD. Slovenská správa ciest - IVSC
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Dátum: 4.4.2018	Dátum: 4.4.2018	Dátum: 23.10.2018
Zväzok č.:		



OBSAH DOKUMENTÁCIE KVALITY STAVBY

- 1. Správa k dokumentácii kvality stavebných prác a zabudovaných materiálov**
- 2. Protokoly skúšok**
- 3. Certifikáty a vyhlásenia o parametroch k použitým materiálom**



1. SPRÁVA K DOKUMENTÁCII KVALITY STAVEBNÝCH PRÁČ A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)
Číslo a názov objektu: SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkami „J“ a „L“
Katastrálne územie: k.ú. Lužianky
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky
Charakter stavby: Novostavba

Stavebník:

Názov a adresa: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

Projektant:

Hlavný projektant: Ing. Marta Kodajová
Názov a adresa: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zhotoviteľ:

ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava



ZAKLADNÉ ÚDAJE

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra - Sever, v blízkosti obcí Lužianky, Dražovce a katastrálnych územiach: Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor. Z dôvodu zvýšenia dopravných nárokov, súvisiacich s výstavbou a prevádzkou strategického parku bolo potrebné vybudovať novú cestnú infraštruktúru aj mimo samotný priemyselný park s napojením na nadradenú cestnú sieť (cesta I/64 a rýchlostná cesta R1A) ale aj na ostatné jestvujúce komunikácie v dotknutom území. Predmetom tohto projektu bolo zriadenie trvalej cestnej infraštruktúry pre tento strategický park, vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien, prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do ciest.

Objekt 120 rieši účelovú komunikáciu kategórie MO 8,5/40 (red. MO 12,0/40) medzi stykovou úrovňovou križovatkou „J“ a priesečnou križovatkou „L“.

Základné údaje:

Kategória: MO 8,5/40 (red. MO 12,0/40)

Celková dĺžka: 0,333 km (celková dĺžka riešeného úseku)

Odhumusovanie

Pri trvalom zábere pôdy, ktoré slúžilo pre konštrukciu cestného telesa sa humózná vrstva odstránila a uložila na skládky humusu. V rámci stavby boli plochy určené pre skládky humusu navrhnuté rovnomerne po celej dĺžke trasy. Zhrnutá vrstva humusu sa z časti použila pre ďalšie stavebné práce v rámci SO 120 (zahumusovanie svahov cestného telesa). Prebytok humusu sa použil na zahumusovanie v iných objektoch stavby, na zahumusovanie plôch medzi objektmi resp. bol uložený na dočasných skládkach humusu.

V rámci predmetného objektu bolo zrealizované odhumusovanie v hrúbkach podľa pedologického prieskumu v trvalom zábere trasy SO 120.

Sanácia podložia TYP 0

Sanačné opatrenie typu 0 predstavovalo zlepšenie podložia zemného telesa s hrúbkou cca 0,95 m, zeminu zlepšenú hydraulickým spojivom, 1x dvojsoú geomrežu a vrstvu štrkodrvy s hrúbkou 0,45 m. Pôvodný terén sa najprv odhumusoval v hrúbke podľa pedologického prieskumu. Na takto pripravenom podloží sa zlepšili parametre zeminy hydraulickým spojivom pomocou prefrézovania do hĺbky 0,50 m. Následne sa uložil a zhutnil presyp so štrkodrvy s hrúbkou 0,15 m. Položila sa dvojsoú geomreža ARMATEX G65/65. Následne sa zrealizovala 0,30 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutnená. Štrkodrava sanačnej vrstvy podložia je fr.0-63 mm. Na takto pripravené vymenené podložie sa umiestnila prvá vrstva násypu s hrúbkou 0,30 m.

Sanácia podložia TYP II

Sanačné opatrenie typu II predstavovalo zlepšenie podložia zemného telesa s hrúbkou cca 0,80 m, zeminu zlepšenú hydraulickým spojivom, 1x dvojsoú geomrežu a vrstvu štrkodrvy s hrúbkou 0,30 m. Pôvodný terén sa najprv odhumusoval v hrúbke podľa pedologického prieskumu. Na takto pripravenom podloží sa zlepšili parametre zeminy hydraulickým spojivom pomocou prefrézovania do hĺbky 0,5 m. Následne sa uložil a zhutnil presyp zo štrkodrvy s hrúbkou 0,10 m. Položila sa dvojsoú geomreža ARMATEX G40/40. Následne sa zrealizovala 0,20 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutnená. Štrkodrava sanačnej vrstvy podložia bola fr.0-63 mm. Na takto pripravené vymenené podložie sa umiestnila prvá vrstva násypu s hrúbkou 0,30 m.

Sanácia podložia v mieste starého koryta potoka

V mieste, kde bola poloha starého koryta pod zemným telesom bola po odstránení vrstvy 0,50m z brehov a dna potoka (odstránenie ruderálneho porastu hr. 0,20 m a odstránenie bahna a rašelina hr. 0,30 m) položená separačnú geotextíliu KORTX GT PP40/40 po obvode koryta a následne bolo zasypané staré koryto zhutnenou štrkodrvinou fr. 0-63 mm zhutňovaným po vrstvách max. hr. 0,30 m.



Na zasypané koryto sa položila separačná geotextília KORTEX GT PP40/40. Následne sa zrealizoval presyp zo štrkodrvy s hrúbkou min. 0,10 m a položila sa dvojosá geomreža ARMATEX G65/65. Následne sa zrealizovala 0,20 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutená. Štrkodrava sanačnej vrstvy podložila bola fr.0-63 mm. Následne sa položila dvojosá geomreža ARMATEX G40/40. Následne sa zrealizovala 0,20 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutená. Štrkodrava sanačnej vrstvy podložila bola fr.0-63 mm. V úseku, v ktorom bolo zemné teleso v súbehu so starým korytom potoka bolo potrebné po odstránení vrstvy 0,50 m z brehov a dna potoka (odstránenie ruderálneho porastu hr. 0,20 m a odstránenie bahna a rašelina hr. 0,30 m) položiť separačnú geotextíliu KORTEX GT PP40/40 po obvode koryta a následne bolo koryto zasypané zhutnenou štrkodrvinou fr. 0-63 mm (zhutňovanou po vrstvách max. hr. 0,30 m) minimálne 0,50 m pod úroveň okolitého terénu. Na zasypané koryto sa položila separačná geotextília KORTEX GT PP40/40. Následne sa pod zemným telesom zrealizovala vrstva zo štrkodrvy s hrúbkou min. 0,10 m a položila sa dvojosá geomreža ARMATEX G65/65.

Následne sa zrealizovala 0,20 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutená. Následne sa položila dvojosá geomreža ARMATEX G40/40 a zrealizovala sa 0,20 m hrubá vrstva štrkodrvy, ktorá bola zhutená. Vzniknuté miesto mimo zemného telesa bolo prekryté nepriepustnou vrstvou zeminy triedy F8 pre zamedzenie vsakovania zrážkových vôd a zrekultivované.

Zemné teleso

Plán násypu bola tvorená sanačnou vrstvou. Požiadavky na druh podkladu a minimálny modul deformácie $E_{def,2}$ boli stanovené normou STN 73 61 33 Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií. Vzhľadom na roznos zaťaženia, veľkosť zaťaženia od dopravy, ako aj skutočnosť, že úprava podložia bola v mnohých prípadoch súčasťou zemného telesa, bola únosnosť navrhovaná na hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. V miestach nízkych násypov, kde dochádza ku kontaktu zemnej pláne a podložia bolo nevyhnutné dosiahnuť hodnotu modulu pretvárnosti $E_{def,2} = \min. 90 \text{ MPa}$.

Zemné teleso sa budovalo so sklonom svahov 1:2. Zemné teleso sa budovalo po vrstvách. V úsekoch, kde je medzi sanačnou vrstvou a pláňou vozovky mocnosť vrstvy menšia ako 0,80 m, bolo potrebné zemné teleso budovať z vhodného štrkovitého materiálu.

Výškové vedenie

Účelová komunikácia kategórie MO 8,5/40 (red. MO 12,0/40) bola zrealizovaná v násype. Niveleta vozovky je v prevažnej miere zrealizovaná tak, aby plán vozovky bola odvodnená na terén. Maximálny pozdĺžny sklon je navrhnutý 2,50 %. Minimálny pozdĺžny sklon je navrhnutý 0,65 %. Najväčší polomervypuklého výškového oblúka je $R_v = 2500 \text{ m}$. Najmenší polomer vypuklého výškového oblúka je $R_v = 600 \text{ m}$. Najväčší polomer vydatého výškového oblúka je $R_u = 4000 \text{ m}$. Najmenší polomer vydatého výškového oblúka je $R_u = 500 \text{ m}$.

Šírkové usporiadanie

Účelová komunikácia kategórie MO 8,5/40 (red. MO 12,0/40) bola stavebnou úpravou navrhnutá od navrhovanej stykovej úrovňovej križovatky „J“. V staničení 0,0055 začína stavebná úprava a rozdelenie objektov SO 120 a SO 111. Od tohto staničenia bolo realizované klopenie vozovky zo sklonu, ktorý zodpovedá pozdĺžnemu sklonu nivelety účelovej komunikácie SO 111 v mieste napojenia na stykovú križovatku „J“. V staničení 0,0205 sa vozovka preklolí do strechovitého priečneho sklonu 2,50 % a zachovaný je až do staničenia 0,182889. Potom sa vozovka preklolí do dostredného priečneho sklonu 2,50 %, ktorý je zachovaný až do staničenia 0,328241. Od tohto staničenia je zrealizované klopenie vozovky do sklonu, ktorý zodpovedá pozdĺžnemu sklonu nivelety existujúcej účelovej komunikácie priemyselného parku, ktorá sa nachádza na ulici „Dolné hony“. V riešenom úseku sú realizované dva kružnicové oblúky s prechodnicami..

V zmysle STN 73 6110 navrhnuť kategórii prislúcha nasledovné šírkové usporiadanie v priamom úseku:

jazdný pruh 2 x 3,25 m
vodiaci prúžok 2 x 0,25 m
spevnená krajnica 2 x 0,25 m
časť nespevnenej krajnice
započítavaná do voľnej šírky 2 x 0,50 m
spolu 8,50 m

V smerových oblúkoch je navrhnuté rozšírenie jazdného pruhu podľa zásad uvedených v STN 73 6101. Nespevnená krajnica je realizovaná v riešenom úseku v šírke 0,75 m. Popri navrhovaných chodníkoch je nespevnená krajnica rozšírená, aby sa plynule napojila na zatravnenú plochu popri existujúcich chodníkoch.

Konštrukcia vozovky

- asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5
 - spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 22 L; PMB 45/80-75; I; 70 mm; STN EN 13108-1
 - spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 22 P; 35/50; I; 70 mm; STN EN 13108-1
 - infiltračný postrek PI; PMB 0,8 kg/m²; STN 73 6129
 - cementom stmelená zmes CBGM C5/6 0/31,5; 170 mm; TKP časť 5; STN 73 6124-1
 - štrkodrvina UM ŠD; 0/31,5 Gc; min. 180 mm; TKP časť 5; STN 73 6126
- Celková hrúbka konštrukcie min. 530 mm**

Deliaci ostrovček a smerovacie ostrovčeky boli riešené ako spevnené a vyvýšené od vozovky. Konštrukcia asfaltovej vozovky bola od spevnených ostrovčekov oddelená cestnými nájazdovými betónovými obrubníkmi v betónovom lôžku s bočnou oporou v úrovni vozovky, čím vzniklo prevýšenie + 10 cm na obrubníku voči vozovke.

Konštrukcia deliaceho (smerovacieho) ostrovčeka:

- asfaltový betón AC 16 O; 50/70; II; 50 mm; STN EN 13108-1 (s červeným nástrekom)
 - infiltračný postrek PI; B 1,0 kg/m²; STN 73 6129
 - cementom stmelená zmes CBGM C5/6 0/31,5; 200 mm; TKP časť 5; STN 73 6124-1
 - štrkodrvina v rámci vozovky UM ŠD; 0/31,5 Gc; min. 220 mm; TKP časť 5; STN 73 6126
- Celková hrúbka konštrukcie min. 470 mm**

Konštrukcia chodníka:

- asfaltový betón AC 8 O; 70/100; II; 30 mm; STN EN 13108-1
 - spojovací postrek PS; B 0,5 kg/m²; STN 73 6129
 - asfaltový betón AC 16 P; 50/70; II; 50 mm; STN EN 13108-1
 - štrkodrvina UM ŠD; 0/22,4 Gc; 150 mm; TKP časť 5; STN 73 6126
 - štrkodrvina UM ŠD; 0/31,5 GP; min. 150 mm; TKP časť 5; STN 73 6126
- Celková hrúbka konštrukcie min. 380 mm**

Riešenie odvodnenia

Odvodnenie účelovej komunikácie je realizované pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky v zmysle dodržania minimálneho výsledného sklonu 0,50 %. Dažďová voda je odvádzaná samovoľným odtokom z vozovky do príslušného terénu. Proti škodlivému pôsobeniu podzemných vôd je pláň vozovky navrhnutá v základnom priečnom sklone 3,00 % v zmysle normy STN 73 6101. Cez ochrannú vrstvu vozovky s drenážnou funkciou dôjde v prípade veľmi nepriaznivého vodného režimu k odtokaniu podzemnej vody po svahu násypu do príslušného terénu.



Vodiace bezpečnostné zariadenia

Ako vodiace bezpečnostné zariadenia boli pozdĺž komunikácie po oboch stranách, v nespevnenej krajnici, osadené plastové smerové stĺpiky, vo vzdialenostiach podľa STN 73 6101. Vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov sa vždy meria v osi jazdného pásu. Z dôvodu správnej orientácie vodiča sa smerové stĺpiky osadzujú oproti sebe, t.j. v tom istom priečnom reze. Vodiace dopravné zariadenia boli osadené v odstupe v súlade s STN 73 6101. Vzájomná vzdialenosť smerových stĺpikov bola zrealizovaná podľa nasledovných zásad:

- v priamej a pri smerových oblúkoch $R \geq 1250$ m 50 m
- v smerových oblúkoch $1250 > R \geq 850$ m 40 m
- v smerových oblúkoch $850 > R \geq 450$ m 30 m
- v smerových oblúkoch $450 > R \geq 250$ m 20 m
- v smerových oblúkoch $250 > R \geq 50$ m 10 m
- v smerových oblúkoch $R \leq 50$ m 5 m

Ako vodiace bezpečnostné zariadenia boli zrealizované aj retroreflexné dopravné gombíky bielej farby (trvalé liatinové oká so zapustením do vozovky odolné voči pluhovaniu pluhom s oceľovým britom).

Dopravné značenie

Komunikácia bola vybavená zvislým a vodorovným dopravným značením. Požadovalo sa vodorovné dopravné značenie realizovať z dvojzložkového materiálu, v plastovom prevedení, vodiace čiary s akustickým prevedením. Pred použitím plastového VDZ bude realizovaný nástrek jednozložkovou farbou. Definitívne (trvalé) dopravné značenie celej stavby bude realizované po vyzretí obrsunej asf.vrstvy.

Zahumusovanie

Na záver prác sa zahumusovali všetky svahy cestného telesa humusom hrúbky min. 0,20 m. Stredový ostrovček sa zahumusoval humusom hrúbky min. 0,40 m. Plocha nad zasýpaným korytom potoka sa zahumusovala v hrúbke min. 0,20. Po výstavbe objektov druhej fázy sa zahumusujú plochy medzi objektmi v hrúbke min. 0,20 m a následne sa zatravnia hydroosevom. Zemina určená na zahumusovanie pochádza zo skládky, na ktorej bola zemina riadne ošetrovaná.

Zatravnenie

Na pripravených plochách, z ktorých boli vyzbierané kamene nachádzajúce sa na povrchu a, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatravnenie metódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom nanosení osiva, vody, umelých hnojív, rašeliny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií.

Ku dňu odovzdávania dokumentácie kvality zatravnenie nebolo realizované.

Na zatravnenie bola navrhovaná zmes trávnych semien pre suché a extenzívne podmienky v zmysle TP04/2010 v zložení:

- 30 % kostrava červená trsnatá *Festuca rubra commutata*
- 30 % kostrava ovčia *Festuca ovina*
- 20 % kostrava červená výbežkatá *Festuca rubra rubra*
- 10 % lipnica lúčna *Poa pratensis*
- 10 % mätonoh trváci *Lolium perenne*

Odrody navrhovaných druhov tráv budú vyberané z listiny povolených odrôd a pred výsevom budú odsúhlasené s obstarávateľom stavby. V prípade, že plocha určená na zakladanie trávniky bude zaburinená pýrom, alebo inými agresívnymi burinami, bude jednorázovo, alebo opakovane vykonaný postrek neselektívnym herbicídum. Pre kvalitný vývoj trávniky je rozhodujúca intenzita údržby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a vyhrabávanie trávniky. Predmetné práce budú potrebné vykonávané dodávateľom až do doby preberacieho konania.



Záverečné hodnotenie

Výstavba stavebného objektu SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkami „J“ a „L“ bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie stupňa DRS s výnimkou zmien zakreslených v DSRS, zmluvných podmienok, platných TKP, STN. Všetky materiály boli zdokladované preukaznými skúškami, skúškami typu, príslušnými certifikátmi, vyhláseniami o parametroch, vyhláseniami o zhode a ich zabudovanie bolo overené kontrolnými a preberacími skúškami v zmysle kontrolno-skúšobného plánu stavebného objektu.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA
OPERATÍVNY STANOVISKO
DOPRAVNÝ STANOVISKO

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
24.6.2017	SPB/2017/3164	SO 120	0,2 - 0,3	stabilizované podložie	radiometrické meranie objemovej hmotnosti	Stabilizovaná zemina	2	min. 95%	104,5%; 104,9%	Vyhovuje
26.6.2017	SPB/2017/3173	SO 120	0,1	stabilizované podložie	statická zaťažovacia skúška	Stabilizovaná zemina	1	Edef2 min 30 Mpa Edef2/Edef1	31,53 (2,3)	Vyhovuje
26.6.2017	SPB/2017/3174	SO 120	0,24	stabilizované podložie	statická zaťažovacia skúška	Stabilizovaná zemina	1	Edef2 min 30 Mpa Edef2/Edef1	31,07 (1,6)	Vyhovuje
26.6.2017	SPB/2017/3175	SO 120	0,06	stabilizované podložie	statická zaťažovacia skúška	Stabilizovaná zemina	1	Edef2 min 30 Mpa Edef2/Edef1	32,49 (1,7)	Vyhovuje
24.6.2017	SPB/2017/3181a	SO 120	0,25	stabilizované podložie	pomeraná únosnosť zemin	Stabilizovaná zemina	1		IBI 5 = 12%	Vyhovuje
24.6.2017	SPB/2017/3181b	SO 120	0,25	stabilizované podložie	pomeraná únosnosť zemin	Stabilizovaná zemina	1		IBI 5 = 15%	Vyhovuje

SAT SLOVENSKO s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Tel.: (004212) 32 62 13 13

Fax: (004212) 32 62 33 62



člen koncernu **STRABAG**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro,
vo vložke číslo 56840/B

Protokol č.: 10/2017/SIS o meraní dávkovania spojiva

Názov stavby: Príprava strategického parku Nitra – Cestná infraštruktúra

Úsek, staničenie: 125-00; 120-00

Vrstva: podložie násypu

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Materiál – spojivo: DOROLIME RN 30

Spôsob merania: Kontrolné dávkovanie spojiva sa meria nadávkovaním spojiva na známu plochu a následným odvážením tohto spojiva. V našom prípade je známu plochou oceľová platňa s bočnicami tvaru štvorca s dĺžkou strán 0,5 m => plocha 0,25 m². Po nadávkovaní spojiva na túto plochu spojivo z nej odvážime a hodnotu prenásobíme štyrmi, aby sme dostali množstvo spojiva nadávkované na 1 m².

Požadovaná hodnota dávkovania: 10 kg/m² (+ - 10%)

Dátum	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	váha/kg	priemer/kg	kg/m ²
29.5.2017	2,55						2,55	10,2
24.6.2017	2,39						2,39	9,6

Dátum: 03.07.2017

Vypracoval: Radoslav Mikuš

SAT SLOVENSKO s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK-825 18 BRATISLAVA
- 2 -



Protokol / Protocol: SPB/2017/3164

Radiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: stabilizované podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971 SP-Z07 7,4% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina Odbрал: Mgr. TOKOŠ Marek
 Material name: Stabilizovaná zemina Sampler:
 Druh materiálu: stabilizovaná zemina Odbor (dátum-čas): 24.06.2017
 Material type: Stabilizovaná zemina Sampling (date-time):
 Miesto merania: stavba Stančenie: vid. nižšie Prevzatie (dátum-čas): 24.06.2017
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3164
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 24.06.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 24.06.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD	Miera zhut. Comp. degree
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m³] / [%]			
1	km 0,200	1398 25,90	1448 26,30	1435 26,00	1427 26,07	1,00	1427	104,5
2	km 0,300	1427 26,60	1429 26,40	1442 26,30	1433 26,43	1,00	1433	104,9
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal bulk density specified in protocol:		SPB/2017/2378					1366	[kg/m³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek
 Dátum vystavenia: 27.06.2017
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCŠ Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/3173

Statická zaťažovací skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota $U(k=2)$: 6,0%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina
Material name:
Druh materiálu: stabilizovaná zemina
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:


Staničenie: km 0,100
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3173
Records note nr.:

Počasie: jasno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
Test ending (date-time):

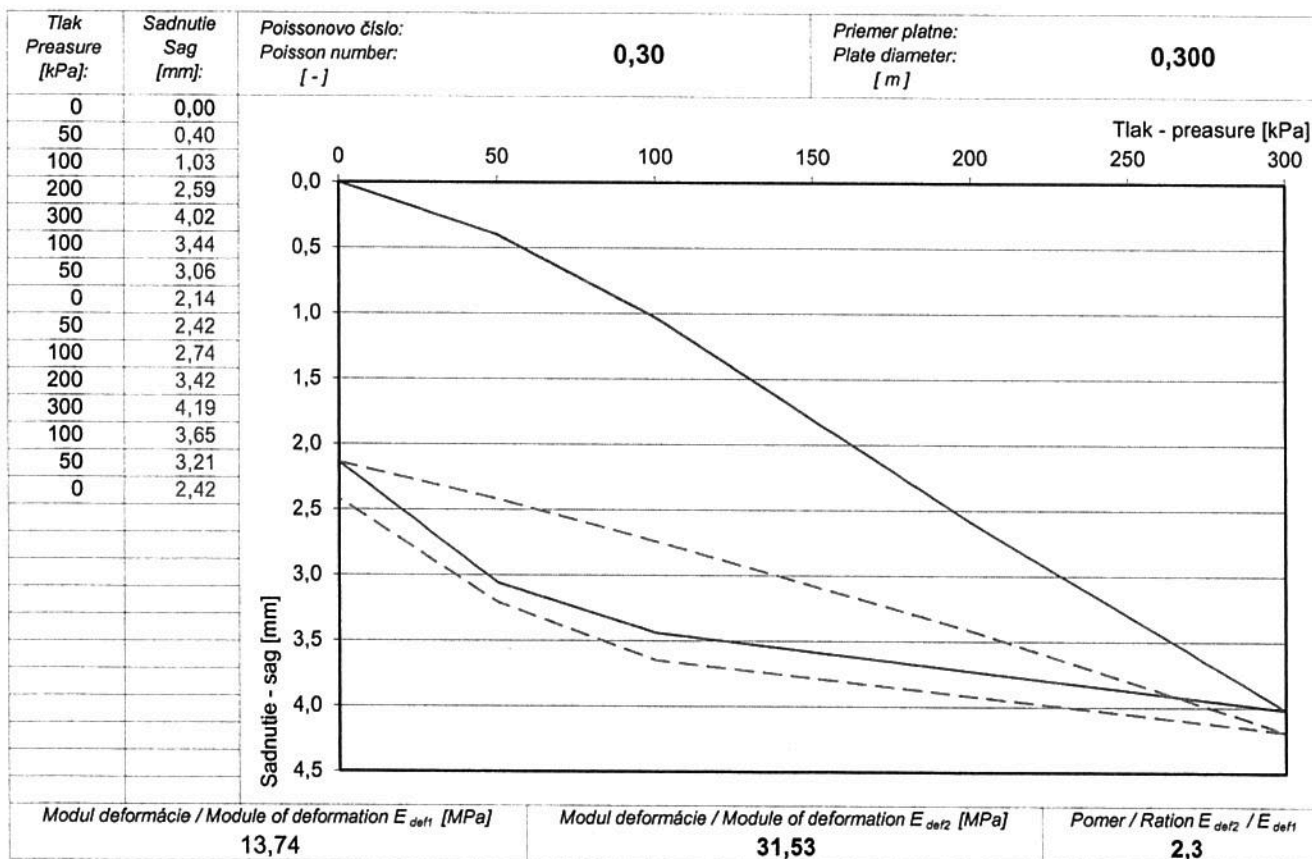

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
≥30 ≤3

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Bc. ČIRKES Teodor

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 26.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3174 Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Zákazka č. / Order nr.

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina
Material name:
Druh materiálu: stabilizovaná zemina
Material type:


Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,240
Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/3174
Records note nr.:

Počasie: jasno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 26.06.2017
Test ending (date-time):

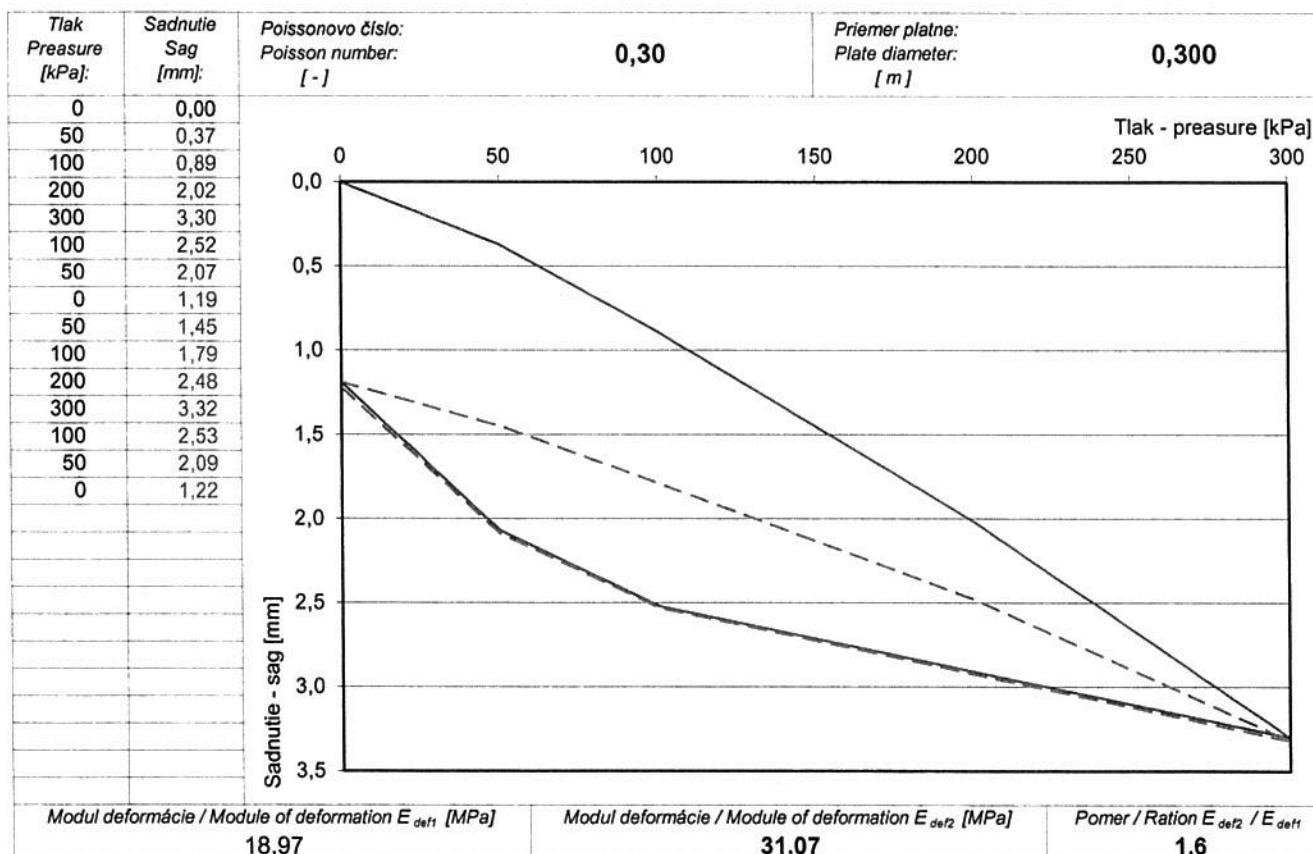

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer

≥ 30 ≤ 3

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšan - Tested by:

Bc. ČIRKES Teodor

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 26.06.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

F17A-Z08-1-04/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/3175

Statická zat'azovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: stabilizované podlažie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina

Material name:

Druh materiálu: stabilizovaná zemina

Material type:

Miesto merania: stavba

Staničenie:

km 0,060

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3175

Počasie:

jasno

Začiatok skúšky (dátum-čas):


Test beginning (date-time):

26.06.2017

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

26.06.2017

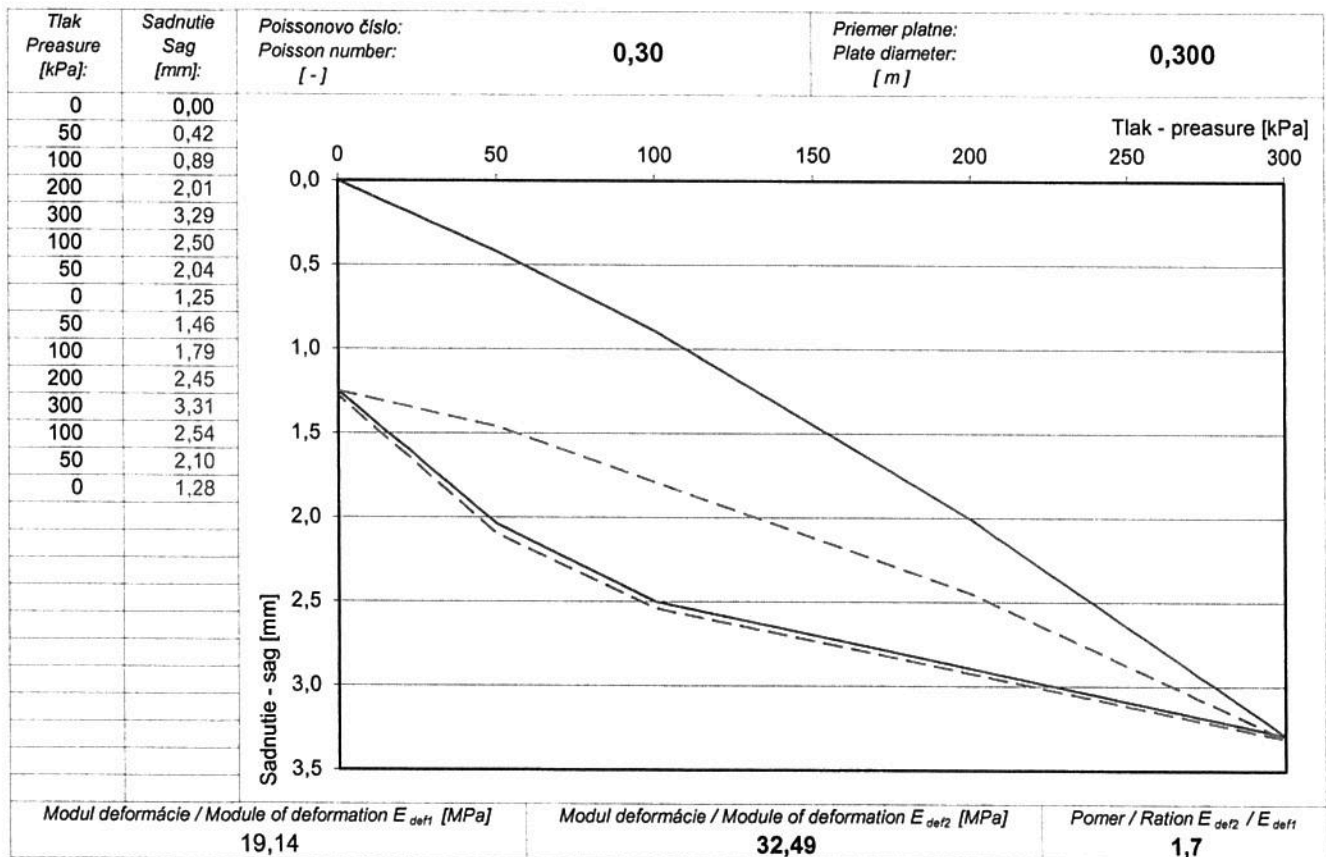

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa]

pomer

≥30

≤3

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšan - Tested by:

Bc. ČIRKES Teodor

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCŠ Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 26.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3181/a Pomerná únosnosť zemín (CBR) / California Bearing Ratio (CBR) of soils

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, Bratislava

Zákazka č. / Order nr.

neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra
Objekt / Building object: SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkami J a L
Konštrukcia / Construction: podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
STN EN 13286-47:2012 SP-Z03 1,5% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


(N)

Názov materiálu: stabilizovaná zemina Odoberal: Mgr. TOKOŠ Marek
Material name: Sampler:
Druh materiálu: ZSV Označenie vzorky: 254/2017/js/z Odbor (dátum-čas): 24.6. 2017 -
Material type: Markings of sample: Sampling (date-time):
Miesto odberu: stavba SO 111 Staničenie: km 0,250 Prevzatie (dátum-čas): -
Sampling site: Stationing: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/3181 Zhutňovacia práca: ps
Records note nr.: Compaction energy: Test beginning (date-time): 24.06.2017
Test ending (date-time): 24.06.2017

Penetrácia Penetration: [mm]	Štandardná sila Standard force [kN]	Sila (tlak) vz. č. 1 - Force (press) sample n.1 [kN]				Sila (tlak) vz. č. 2 - Force (press) sample n.2 [kN]			
		Horný povrch Upper face		Dolný povrch Lower face		Horný povrch Upper face		Dolný povrch Lower face	
0,5	13,2	1,99	0,39	1,84	0,35				
1,0			0,99		0,90				
1,5			1,50		1,25				
2,0			1,84		1,44				
2,5			1,98		1,65				
3,0	20,0	2,48	2,11	2,28	1,81				
4,0			2,33		2,09				
5,0			2,45		2,29				
7,5			2,65		2,54				
10,0			2,55		2,20				
Hodnota / Value		IBI _{2,5} =	15,08 %		13,94 %				
Hodnota / Value		IBI _{5,0} =	12,40 %		11,40 %				
Výsledná hodnota / Final value						IBI _{2,5} = 15,00 %		IBI _{5,0} = 12,00 %	
Vlhkosť / Moisture		[%]							
Objemová hmotnosť / Bulk density		[kg/m³]							

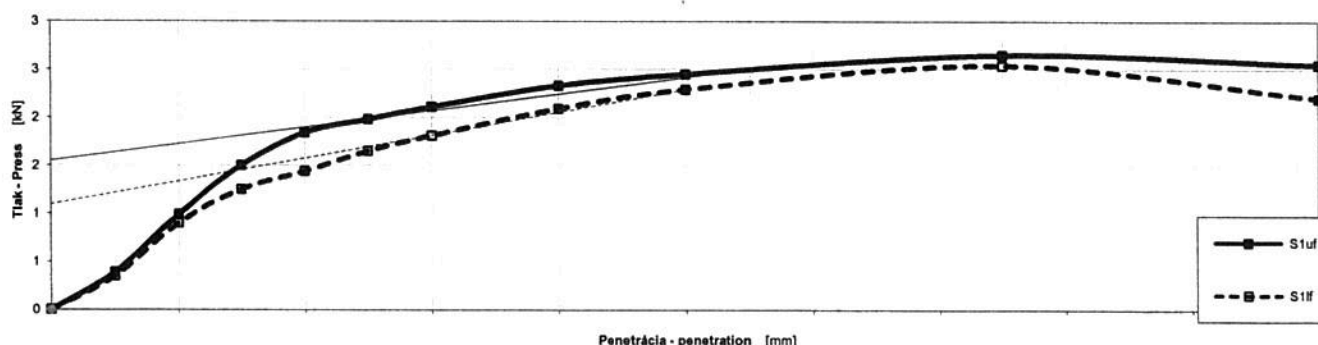

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 27.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

F17A-Z03-2-04/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1



TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3181/b Pomerná únosnosť zemín (CBR) / California Bearing Ratio (CBR) of soils

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, Bratislava

Zákazka č. / Order nr.
neudaná

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra
Objekt / Building object: SO 120 Účelova komunikácia medzi križovatkami J a L
Konštrukcia / Construction: podložie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
STN EN 13286-47:2012 SP-Z03 1,5% žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: stabilizovaná zemina Odoberal: Mgr. TOKOŠ Marek
Material name: stabilizovaná zemina Sampler:
Druh materiálu: ZSV Označenie vzorky: 254/2017/js/z Odober (dátum-čas): 24.6. 2017
Material type: ZSV Markings of sample: Stationing: km 0,250 Prevzatie (dátum-čas):
Miesto odberu: stavba SO 111 Sampling site: Stationing: km 0,250 Entrance (date-time):
Sampling site: stavba SO 111 Stationing: km 0,250 Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3181 Zhutňovacia práca: ps
Records note nr.: SPB/2017/3181 Compaction energy: ps

Penetrácia Penetration: [mm]	Štandardná sila Standard force [kN]	Sila (tlak) vz.č.1 - Force (press) sample n.1 [kN]				Sila (tlak) vz.č.2 - Force (press) sample n.2 [kN]				
		Horný povrch Upper face		Dolný povrch Lower face		Horný povrch Upper face		Dolný povrch Lower face		
0,5	13,2	2,69	1,28	2,54	0,60					
1,0			2,00		1,45					
1,5			2,28		1,84					
2,0			2,47		2,21					
2,5			2,62		2,45					
3,0	20,0	3,02	2,74	3,15	2,65					
4,0			2,90		3,05					
5,0			2,94		3,29					
7,5			2,84		3,64					
10,0			2,61		3,28					
Hodnota / Value	CBR _{2,5} =	20,38 %		19,24 %						
Hodnota / Value	CBR _{5,0} =	15,10 %		15,75 %						
Výsledná hodnota / Final value						CBR _{2,5} = 20,00 %			CBR _{5,0} = 15,00 %	
Vlhkosť / Moisture	[%]	33,02								
Objemová hmotnosť / Bulk density	[kg/m³]	1299,9								

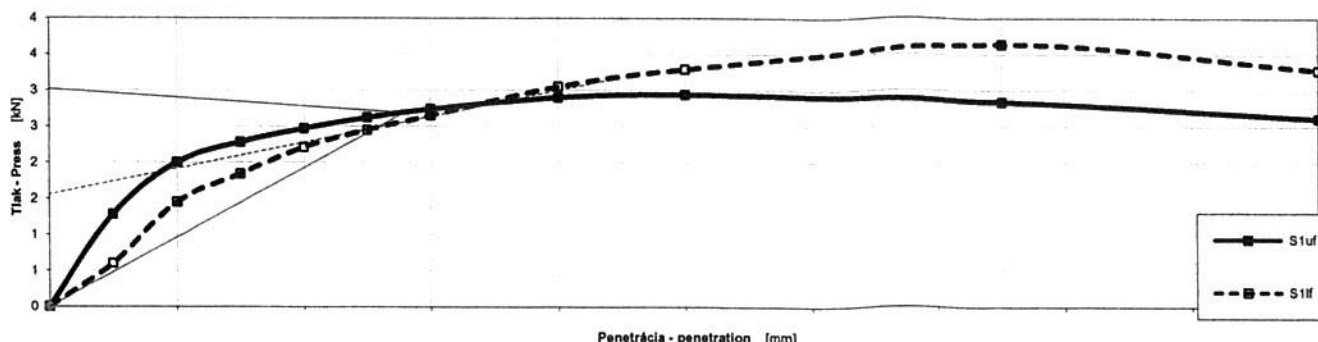

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALAJ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 27.06.2017
Date of issuance: 27.06.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA
bepavukar STRABAG

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stančenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
4.7.2017	SPB/2017/3458	SO 120	km 0,150	sanačná vrstva	Troxler	0-63 mm Pohranice	1	min. 95%	112,5	Vyhovuje
4.7.2017	SPB/2017/3448	SO 120	km 0,200	sanačná vrstva	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm Pohranice	1	Edef2 min. 45 Mpa	65,26 Mpa (1,8)	Vyhovuje
3.7.2017	SPB/2017/3545	SO 120	km 0,200	sanačná vrstva	zrntosť kameniva	0-63 mm Pohranice	1	GA 85; F7	GA 85; F7	Vyhovuje



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/3458

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.

Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 120

Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:

Skúšobný postup:

Rozšírená neistota U(k=2):

Odchylky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...:

Test procedure:

Expand. uncertainty U(k=2):

Deviation from test procedure:

STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971

SP-Z07

7,4%

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:

Material name: štrkodrvina

Odobral:

ŠKORVAGA Peter

Druh materiálu:

Material type: Pohranice 0/63

Odber (dátum-čas):

04.07.2017

Miesto merania:

Measuring site: stavba

Staničenie:

Stationing: vid. nižšie

Prevzatie (dátum-čas):

04.07.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

04.07.2017

Záznamový lis č.:

Records note nr.: SPB/2017/3459

Koniec skúšky (dátum-čas):

04.07.2017

Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD	Miera zhut. Comp. degree
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]			
1	km 0,150 v osi	2027	2067	2042	2045	1,00	2045	112,5
2		1,00	1,00	1,10	1,03			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		15/2017/PS/ZV					1818	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

REPKO Ondrej

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupinyDátum vystavenia:
Date of issuance: 06.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735


SNAS

Reg. No. 211/S-176


Protokol / Protocol: SPB/2017/3448
Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
 Skúšobný postup: SP-Z08/1
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 6,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Materiál name: Pohranice 0/63
 Druh materiálu: Material type:


Miesto merania: stavba
 Stationing: km 0,200 v osi

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3448
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 04.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 04.07.2017
 Test ending (date-time):

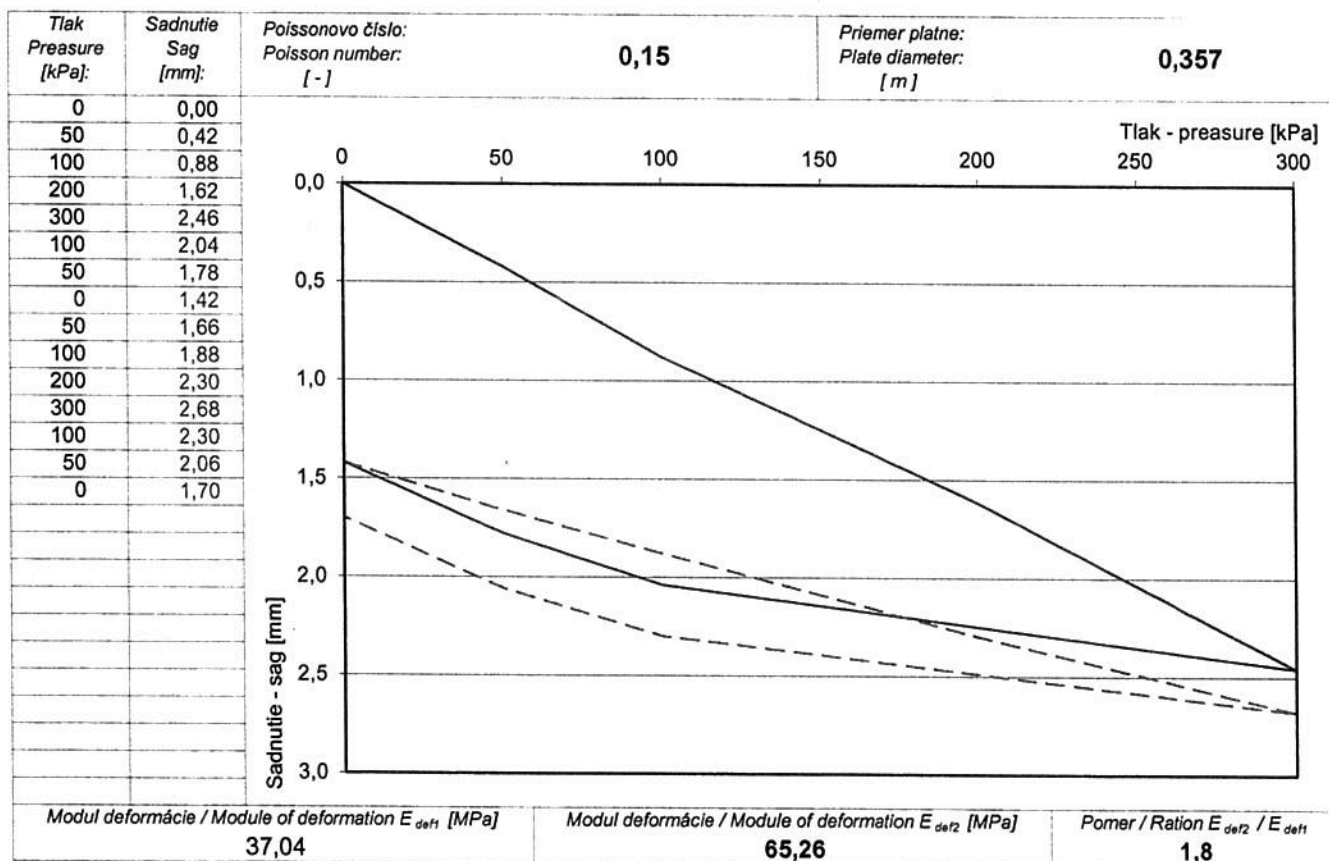
Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 45 $\leq 2,5$
 (N)

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 06.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735


Protokol / Protocol: SPB/2017/3545
Zrinitosť kameniva / Mineral grading
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: Sanačná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013
 Norm, regulation, ...: SP-K02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63 Pohranice
 Material name: štrkodrvina 0/63 Pohranice
 Frakcia materiálu: 0/63
 Material fraction: 0/63
 Miesto odberu: stavba
 Sampling site: stavba
 Označenie vzorky: 309/2017/MH/K
 Markings of sample: 309/2017/MH/K
 Staničenie: km 0,200
 Stationing: km 0,200
 Odbor (dátum-čas): 3.7.2017 - 15:00
 Sampling (date-time): 3.7.2017 - 15:00
 Prevzatie (dátum-čas): -
 Entrance (date-time): -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3545
 Records note nr.: SPB/2017/3545
 Metóda: mokry rozbor
 Method: wet analysis
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 06.07.2017
 Test beginning (date-time): 06.07.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 10.07.2017
 Test ending (date-time): 10.07.2017

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		44,554	42,310	2,244
90	0,0	100				
63	1308,5	97				
56		94				
45	2498,6	92				
31,5	3841,0	83				
22,4	3058,8	76				
16	4878,6	65				
11,2	5306,4	53				
8	4053,1	44				
5,6	4051,7	35				
4	4450,8	25				
2,8		22				
2	2830,7	19				
1	2456,0	13				
0,5	908,5	11				
0,25	602,7	10				
0,125	904,2	8				
0,063	806,2	5,8				
0,063P	354,2					
0,063T	2244,0	0,0				
Σ	44554,0	100,0				

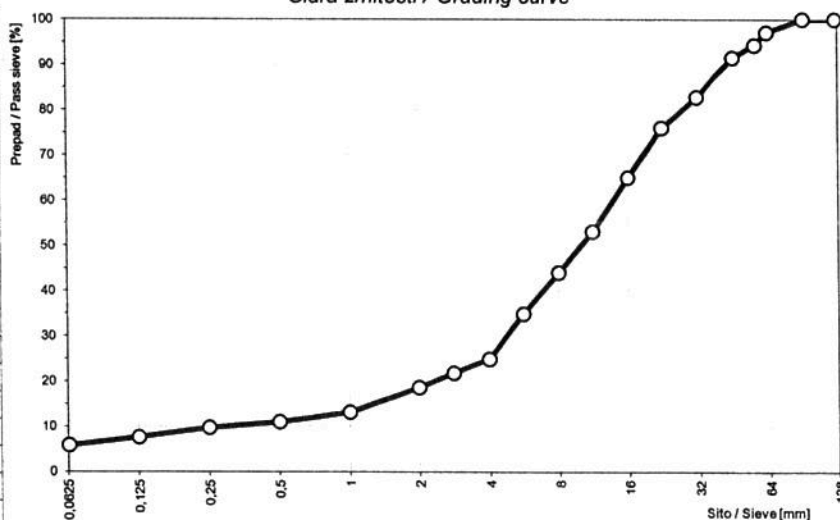
Kategória podľa / Category according to:

Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	97	83	-	-	5,8
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85		-		f ₇		

Požiadavka - Requirement:
Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Miroslav

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOFÁK Juraj

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 12.07.2017
 Date of issuance:



Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

PROJEKT INŽENIERINGOVÁ FIRMA
Ing. Jozefína
Ing. Jozefína


Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Firma	Mesiac fakturácie	Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Material	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PO	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
	júl	12.7.2017	SPB/2017/3672	SO 120	0,100	1. vrstva násypu	zrnitosť kameniva	0-125 mm Lom Žirany	1			Vyhovuje
	júl	12.7.2017	SPB/2017/3592	SO 120	0,300	1. vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-125 Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	85,65 Mpa 1,8	Vyhovuje
	júl	12.7.2017	SPB/2017/3593	SO 120	0,200	1. vrstva násypu	statická zaťažovacia skúška	0-125 Lom Pohranice	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 2,5	Vyhovuje

**Protokol / Protocol: SPB/2017/3672**
Zrinitosť kameniva / Mineral gradingZákazka č. / Order nr.
objednávka**Všeobecné údaje - General information**Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,**Technické údaje stavby - Technical building data:**Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:120
Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu**Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:**Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013
Kúšobný postup: SP-K02
Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne**Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:**Názov materiálu: Štrkodrvina 0/125 Žirany
Material name: Štrkodrvina 0/125 Žirany
Fracia materiálu: 0/125
Material fraction: 0/125
Miesto odboru: stavba
Sampling site: stavba
Označenie vzorky: 328/2017/MH/K
Markings of sample: 328/2017/MH/K
Staničenie: km 0,100
Stationing: km 0,100
Odobral: Mgr. TOKOŠ Marek
Sampler: Mgr. TOKOŠ Marek
Odbor (dátum-čas): 12.7.2017 - 11:00
Sampling (date-time): 12.7.2017 - 11:00
Prevzatie (dátum-čas): 13.7.2017
Entrance (date-time): 13.7.2017
Začiatok skúšky (dátum-čas): 13.07.2017
Test beginning (date-time): 13.07.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 17.07.2017
Test ending (date-time): 17.07.2017**Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:**Záznamový lis č.: SPB/2017/3672
Records note nr.: SPB/2017/3672Metóda: mokrý rozbor
Method: wet analysis

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125	4663,2	2,8	97	164,201	158,540	5,661
90	14574,0	8,9	88			
63	17344,2	10,6	78			
56			70			
45	24051,3	14,6	63			
31,5	27153,0	16,5	47			
22,4	11839,2	7,2	39			
16	10174,7	6,2	33			
11,2	10633,0	6,5	27			
8	8029,4	4,9	22			
5,6	9046,3	5,5	16			
4	4424,5	2,7	14			
2,8			12			
2	4502,7	2,7	11			
1	2514,7	1,5	9			
0,5	2989,0	1,8	8			
0,25	2313,7	1,4	6			
0,125	1559,7	0,9	5			
0,063	1896,5	1,2	4,0			
0,063P	830,9					
0,063T	5661,0	4,0	0,0			
Σ	164201,0	100,0	-			

Čiara zrinitosti / Grading curve

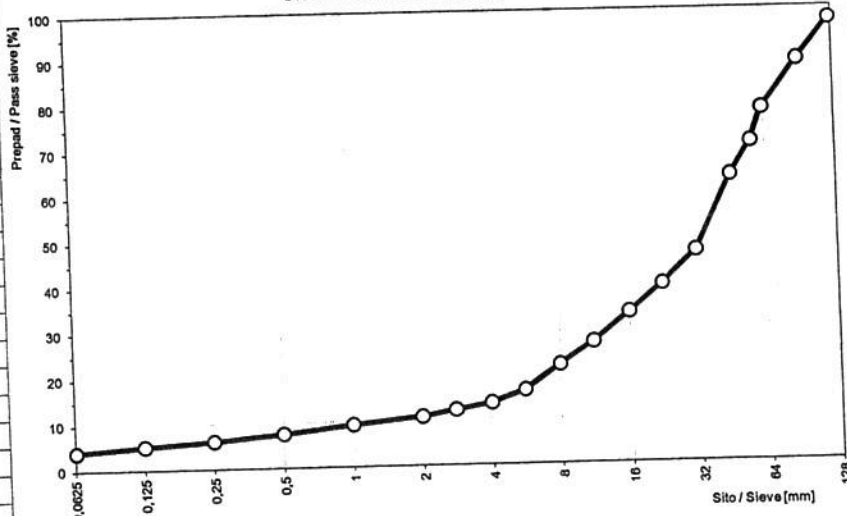**STN EN 13242**

Kategorické podľa / Category according to:

Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	250	180	125	63	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	-	-	97	78	-	-	4,0
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		-	-	-	-	-	-	f ₅


Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:
Ing. HALAJ MarošKontroloval - Controlled by:
Mgr. SOČÁK JurajSchválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupinyDátum vystavenia:
Date of issuance: 17.07.2017Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1



Protokol / Protocol: SPB/2017/3592 **Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test**

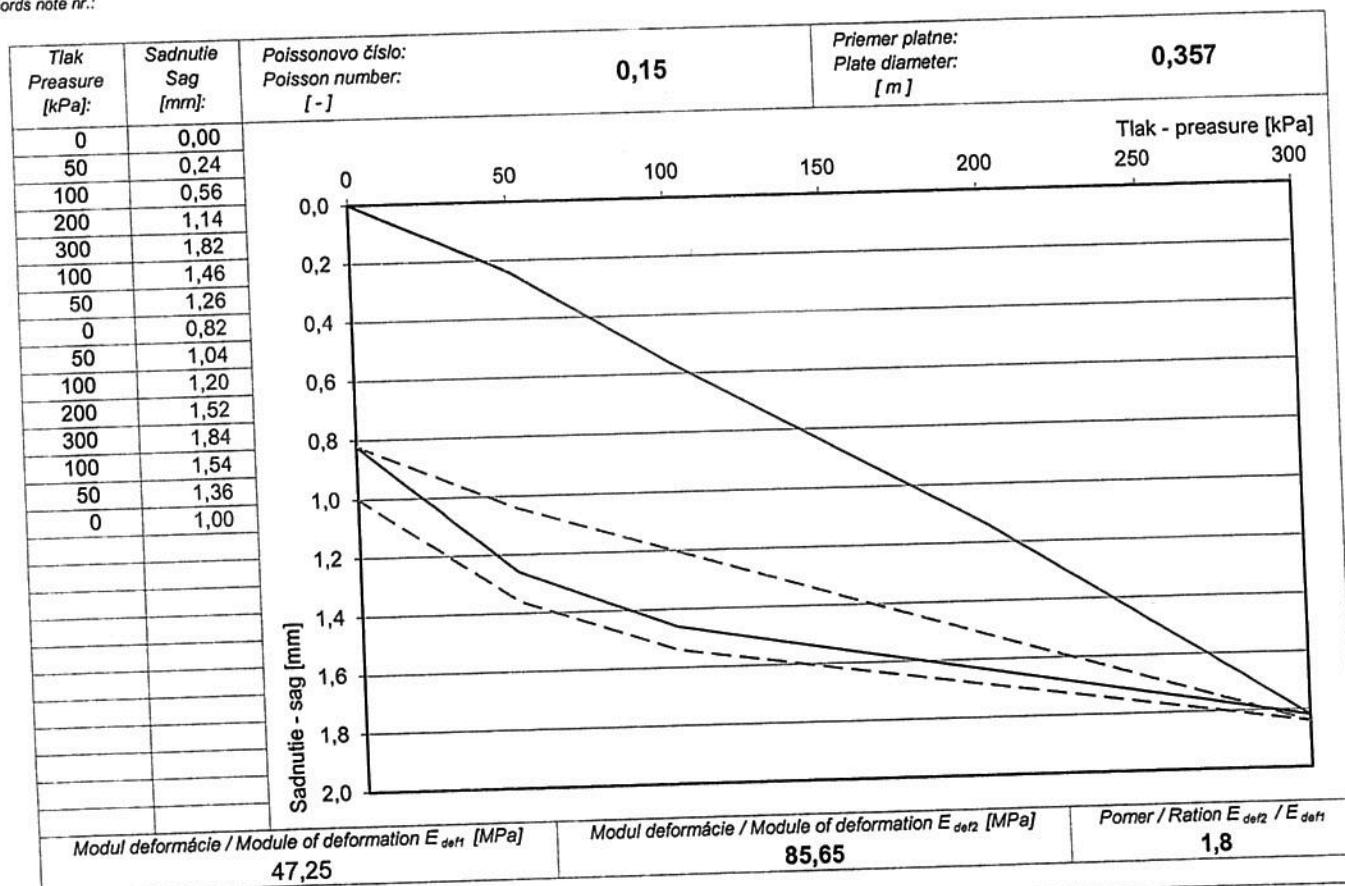Zákazka č. / Order nr.
objednávka**Všeobecné údaje - General information**Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,**Technické údaje stavby - Technical building data:**Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu**Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:**Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne (N)**Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:**Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/125
Material type:
Stavba: stavbaStaničenie: km 0,300 - PJP
Stationing:**Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:**Záznamový lis č.: SPB/2017/3592
Records note nr.:Počasie: slnečno
Weather:Začiatok skúšky (dátum-čas): 12.07.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 12.07.2017
Test ending (date-time):**Požiadavka - Requirement:**

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments:**Skúšan - Tested by:**Mgr. TOKOŠ Marek
Dátum vystavenia: 14.07.2017
Date of issuance:**Kontroloval - Controlled by:**

SMATANA Zoltán

 E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$ (N)Schválil - Confirmed by:
Ing. DANGS Norbert
vedúci laboratória a skupinyVýsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/3593 Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: 1. vrstva násypu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina
Druh materiálu:
Material type: Pohranice 0/125
Miesto merania:
Measuring site: stavba


Staničenie:
Stationing: km 0,200 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3593
Records note nr.:

Počasie:
Weather: slnečno

Začiatok skúšky (dátum-čas): 12.07.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 12.07.2017
Test ending (date-time):

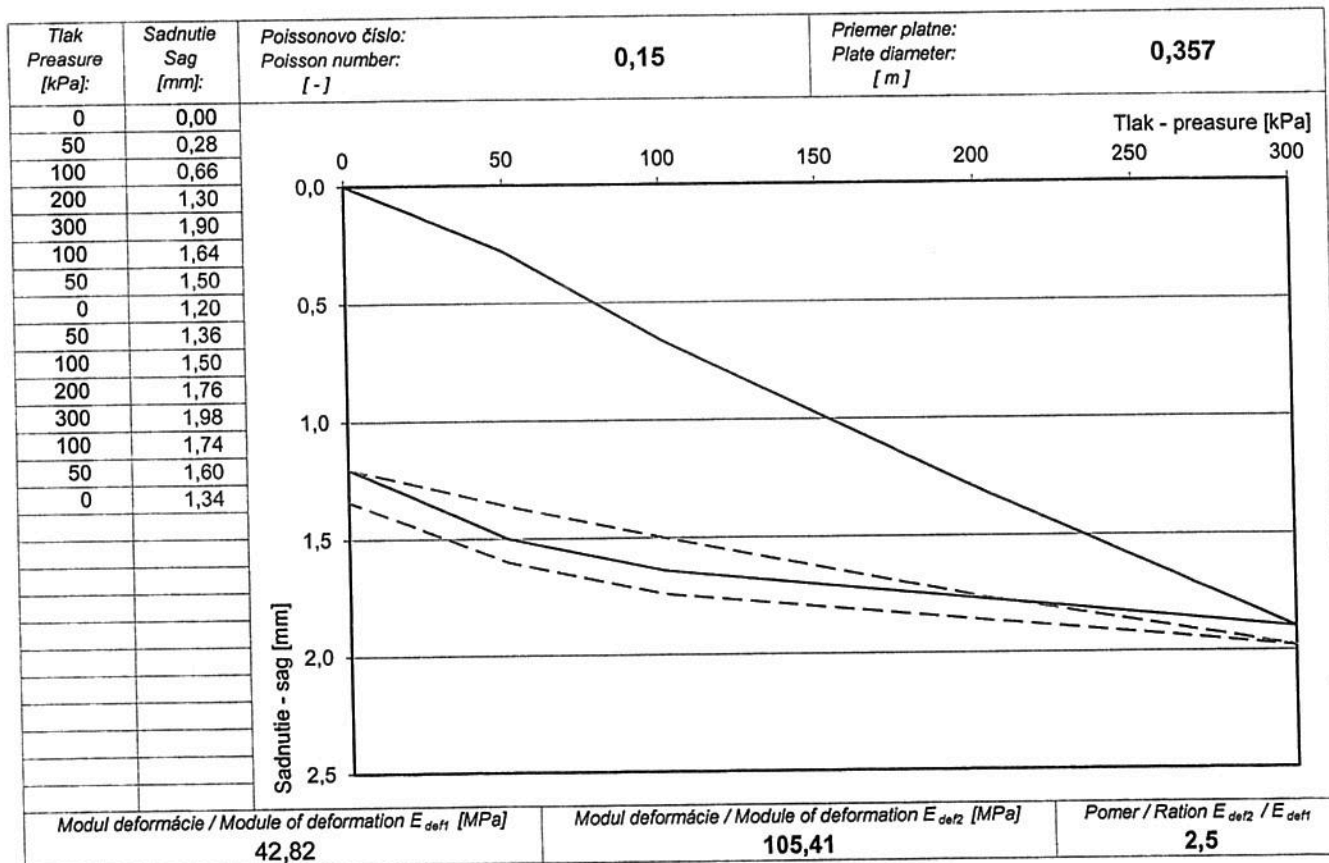

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek
Dátum vystavenia:
Date of issuance: 14.07.2017

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

E_{def2} [MPa] ≥ 70 pomer $\leq 2,6$
(N)

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Firma	Mesiac fakturácie	Datum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PO	Výsledok	Vyhovuje/ nevhovuje
	júl	18.7.2017	SPB/2017/3823	SO 120	0,050	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	91,36 Mpa 2,5	Vyhovuje
	júl	28.7.2017	SPB/2017/4068	SO 120	0,100	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,2	Vyhovuje
	júl	18.7.2017	SPB/2017/3824	SO 120	0,150	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	105,41 Mpa 1,9	Vyhovuje
	júl	18.7.2017	SPB/2017/3825	SO 120	0,250	úprava pláne pod aktívnou zónou	statická zaťažovacia skúška	0-63 mm lom žirany	1	Edef 2 min 70 Mpa	97,89 Mpa 2,2	Vyhovuje
	júl	18.7.2017	SPB/2017/3830	SO 120	0,100	úprava pláne pod aktívnou zónou	zrntosť kameniva	0-63 mm lom žirany	1			Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/3823

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: úprava plánu pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)


Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Stationing: km 0,050 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3823
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
 Test ending (date-time):

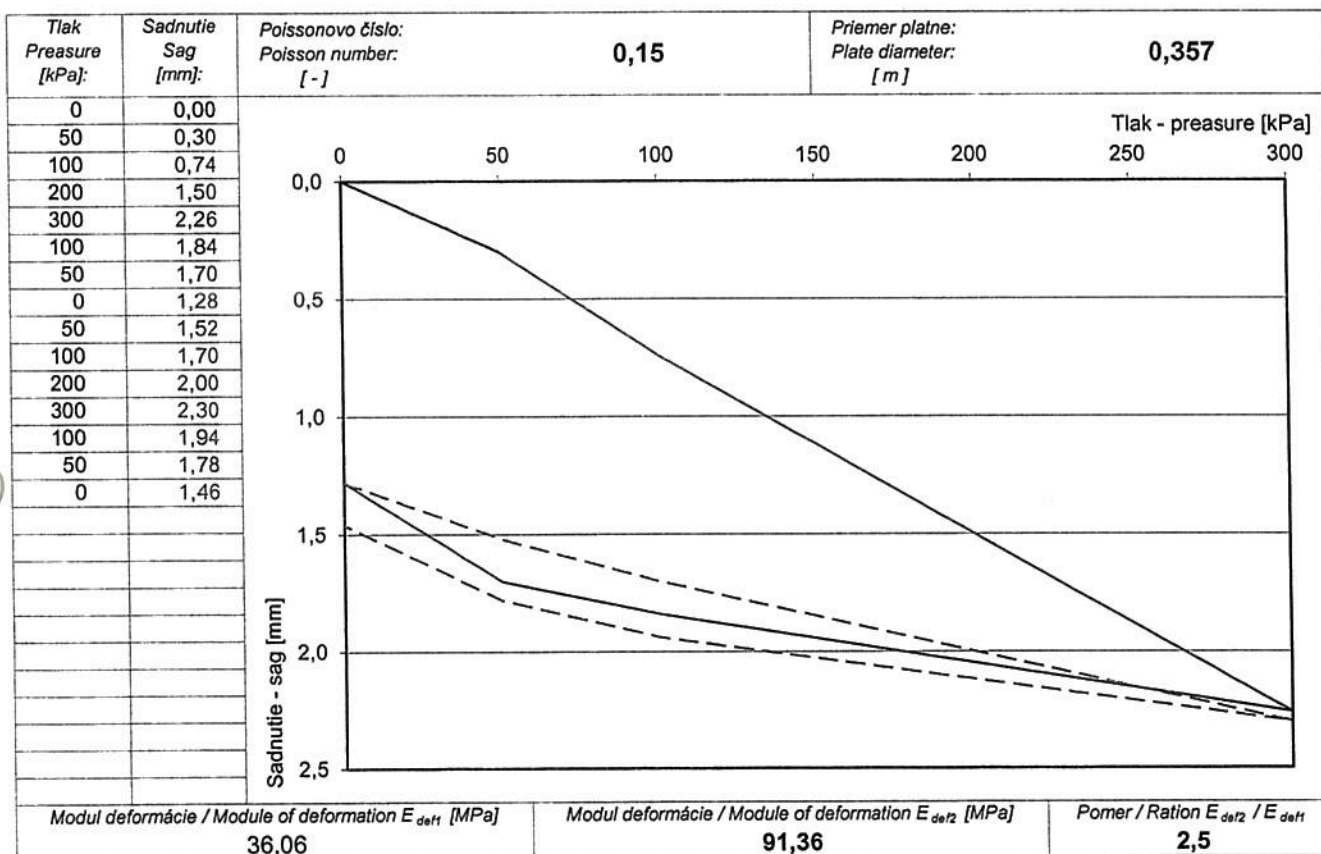

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek
 Dátum vystavenia: 19.07.2017
 Date of issuance:


Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/4068

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: Úprava plánu pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63
 Materiál name:
 Druh materiálu: štrkodrvina 0/63 Žirany
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:


Staničenie: km 0,100 v osi
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/4068
 Records note nr.:

Počasie: poloblačno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 28.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 28.07.2017
 Test ending (date-time):

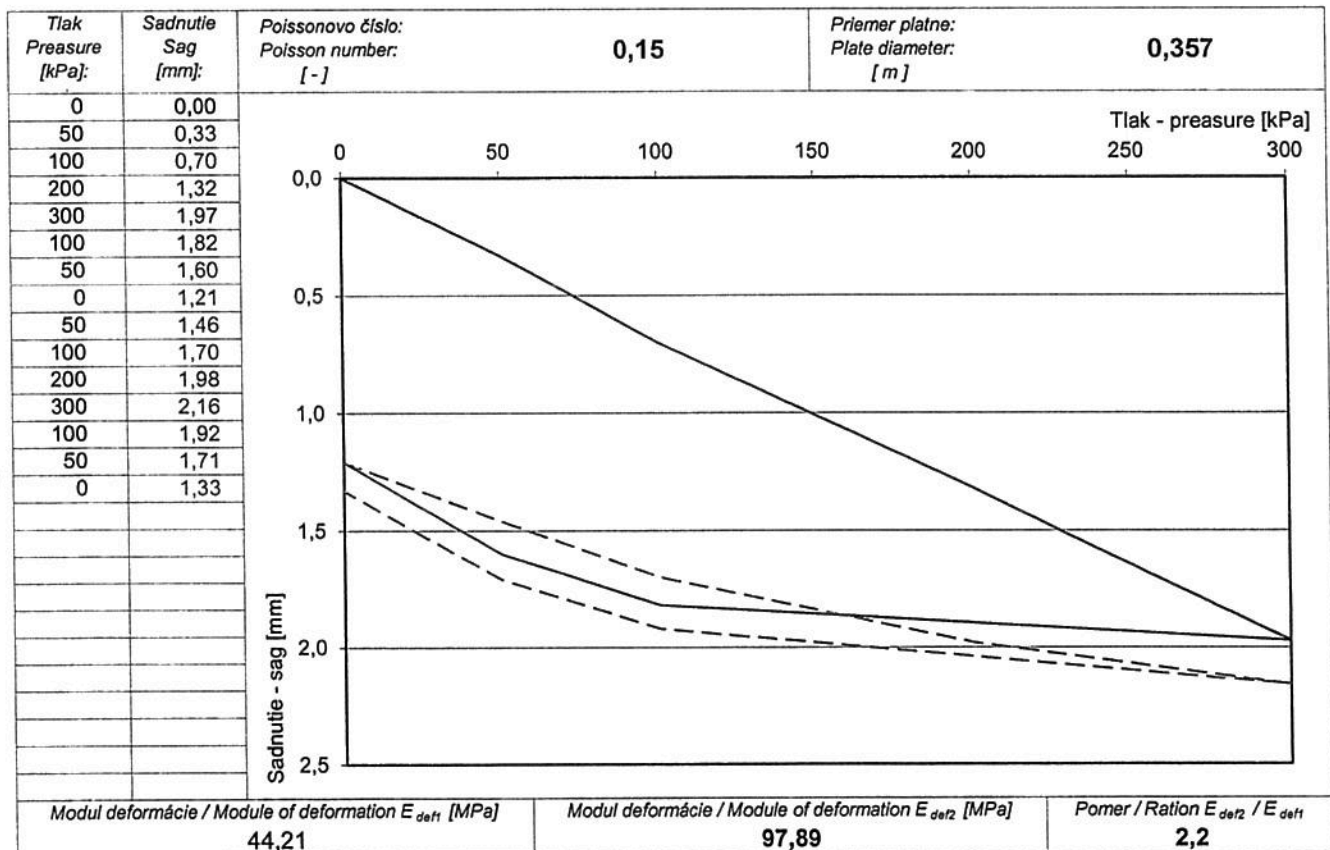**Požiadavka - Requirement:**

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 Ing. HALAJ Mareš

Kontroloval - Controlled by:
 Mgr. TOKOŠ Marek

Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 31.07.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3824

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: úprava plánu pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchýlky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Žirany 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Stationing: km 0,150 - LJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3824 Počasie: slnečno
 Records note nr.: Weather:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
 Test ending (date-time):

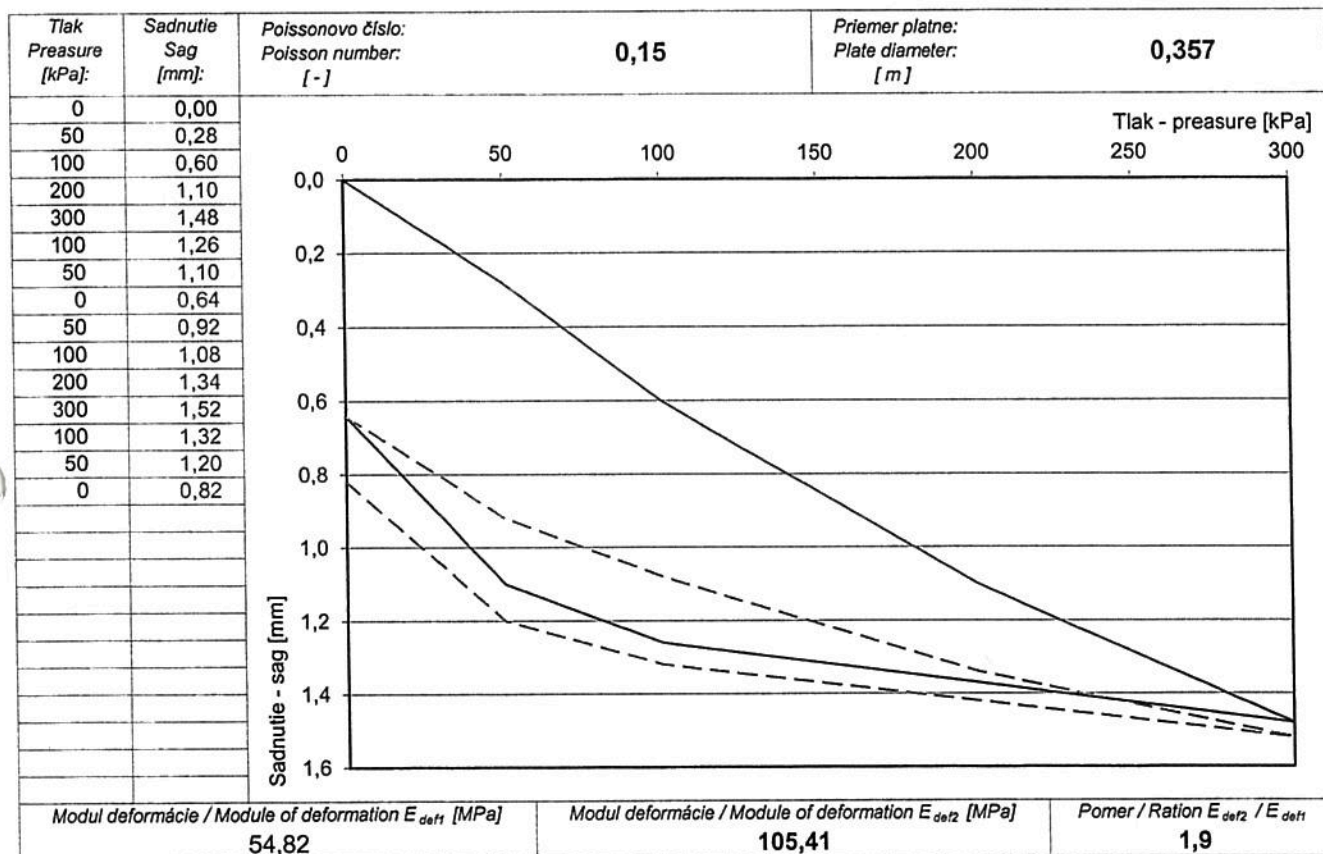**Požiadavka - Requirement:**

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 70 $\leq 2,6$
 (N)

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

Mgr. TOKOŠ Marek
 Dátum vystavenia: 19.07.2017
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/3825

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: úprava plánu pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F	SP-Z08/1	6,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina


Druh materiálu: Žirany 0/63

Miesto merania: stavba

Staničenie: km 0,250 - PJP

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3825	Počasie: slnečno	Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
Records note nr.:	Weather:	Koniec skúšky (dátum-čas): 18.07.2017

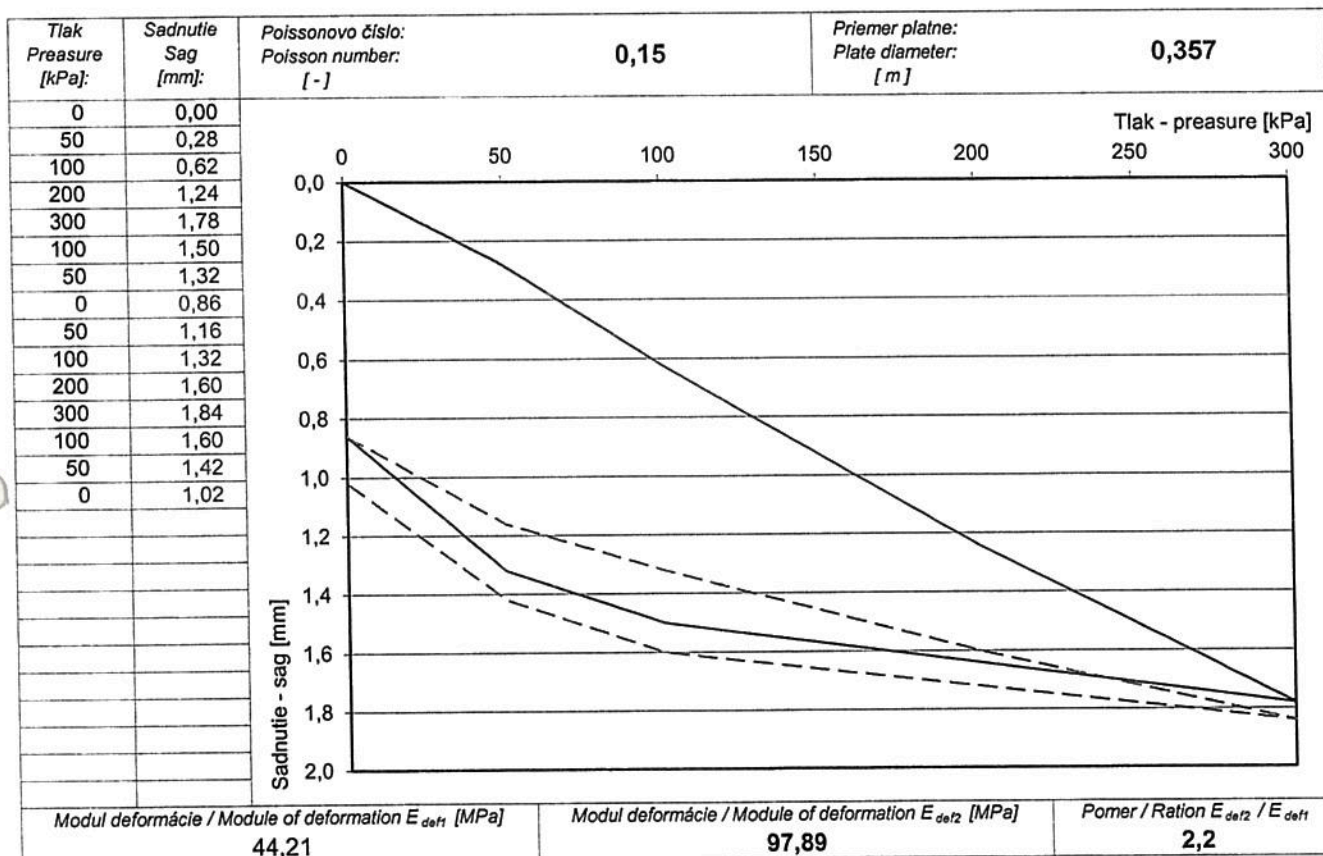

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa]	pomer
≥ 70	$\leq 2,6$

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.07.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/3830

Zrinitosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
 Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad, -

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO 120
 Konštrukcia / Construction: úprava pláne pod aktívnou zónou

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013 SP-K02 3,2% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: štrkodrvina Žirany Odobral: Mgr. TOKOŠ Marek
 Material name: štrkodrvina Žirany Sampler:
 Frakcia materiálu: 0/63 Označenie vzorky: 335/2017/js/k Odbor (dátum-čas): 18.7.2017 - 13:00
 Material fraction: 0/63 Markings of sample: Stationing: km 0,100 Sampling (date-time):
 Miesto odboru: stavba Prevzatie (dátum-čas):
 Sampling site: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/3830 Metóda: mokrý rozbor
 Records note nr.: Method: wet analysis
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.07.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 19.07.2017
 Test ending (date-time):

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10^{-3} kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M_1 [kg]	M_2 [kg]	$M_1 - M_2$ [kg]
125		100		64,660	62,771	1,889
90	0,0	100				
63	4370,1	93				
56		86				
45	8950,9	79				
31,5	8465,9	66				
22,4	7117,7	55				
16	7119,9	44				
11,2	5313,6	36				
8	3966,3	30				
5,6	4211,5	23				
4	5266,0	15				
2,8		14				
2	1959,0	12				
1	1958,5	9				
0,5	1726,5	7				
0,25	956,1	5				
0,125	633,3	4				
0,063	688,5	3,0				
0,063P	67,2	0,0				
0,063T	1889,0					
Σ	64660,0	100,0				

Čiara zrinitosti / Grading curve

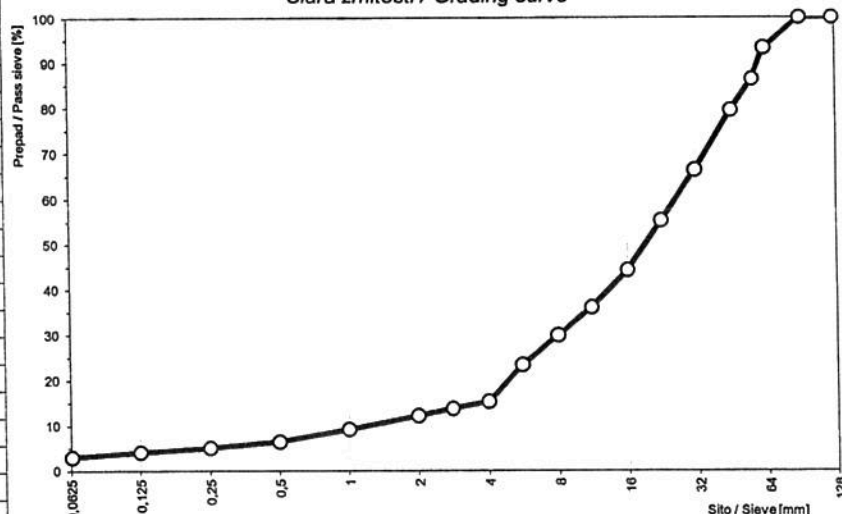

Kategoríe podľa / Category according to:

Síto / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	93	66	-	-	3,0
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		$G_A 85$						f_3

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. SOTÁK Juraj
 Dátum vystavenia: 19.07.2017
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

Ing. HALÁČ Maroš

Schválil - Confirmed by:

Ing. FRANCES Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.


Firma	Mesiac fakturácie	Datum odberu	Protokol č.	Objekt	Stančenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požadavka podľa TKP/STN/PO	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
	september	2017	14.9.2017	SPB/2017/5067	SO 120	0,100	konštrukčná pláň	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 90 Mpa	97,89 (1,8)	Vyhovuje
	september	2017	14.9.2017	SPB/2017/5066	SO 120	0,200	konštrukčná pláň	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 90 Mpa	91,36 (2,1)	Vyhovuje
	september	2017	13.9.2017	SPB/2017/4958	SO 120	0,300	konštrukčná pláň	statická zaťažovacia skúška	1	Edef 2 min 90 Mpa	124,58 (2,4)	Vyhovuje
	september	2017	14.9.2017	SPB/2017/5070a	SO 120	0,100-0,300	konštrukčná pláň	pozdĺžna nerovnosť	1	max 40 mm	max 25	Vyhovuje
	september	2017	14.9.2017	SPB/2017/5070a	SO 120	0,100-0,300	konštrukčná pláň	príčná nerovnosť	1	max 30 mm	max 16	Vyhovuje
	september	2017	14.9.2017	SPB/2017/5048a	SO 120	0,200	konštrukčná pláň	zrntosť kameniva	1			Vyhovuje

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5067

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/63
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:

Staničenie: km 0,100 LS
Stationing:


(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5067
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test ending (date-time):

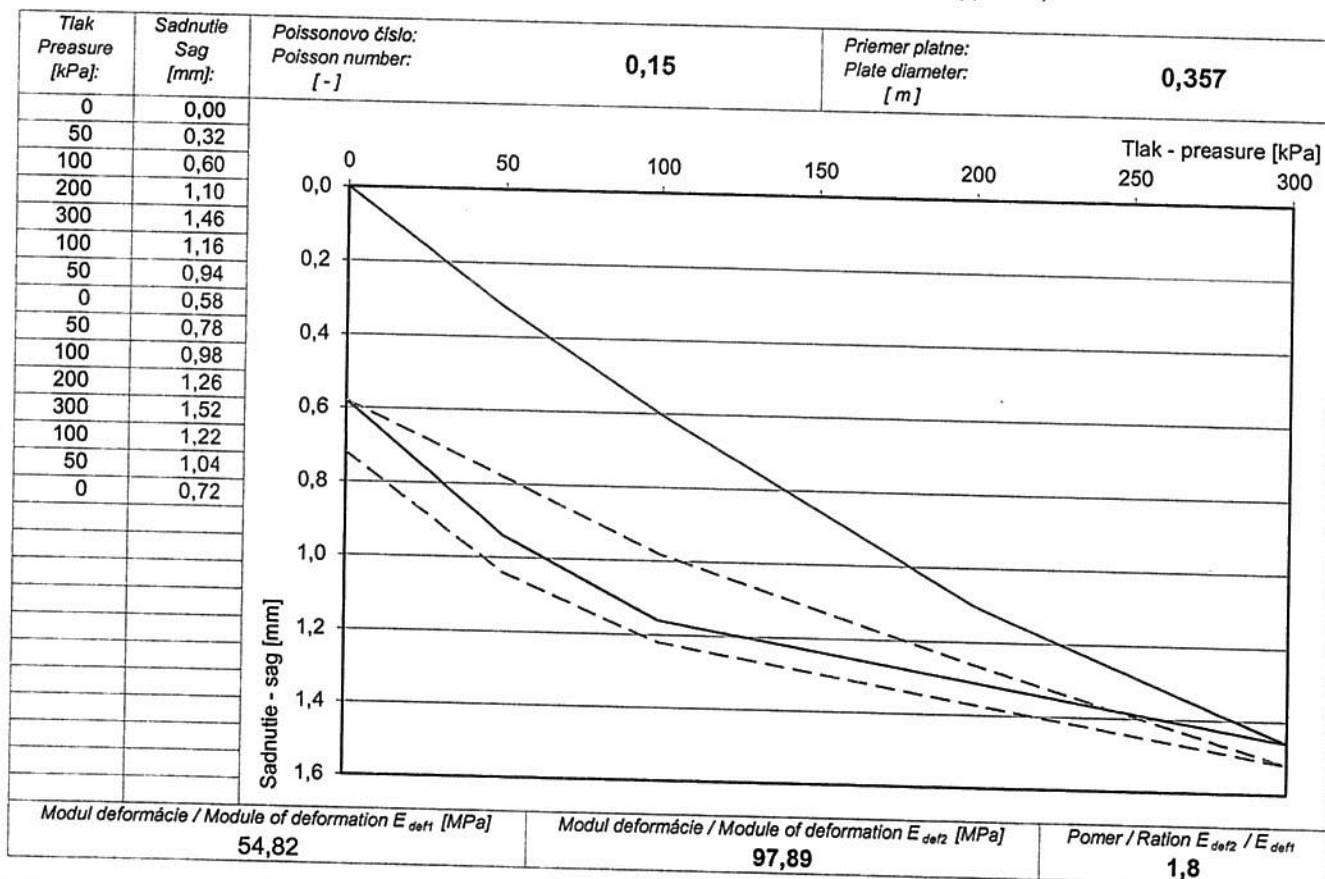

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.09.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5066

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: konštrukčná plán

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota $U(k=2)$: 6,0%
Odchýlky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Druh materiálu: Pohranice 0/63
Miesto merania: stavba


Staničenie: km 0,200 PS

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/5066
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test ending (date-time):

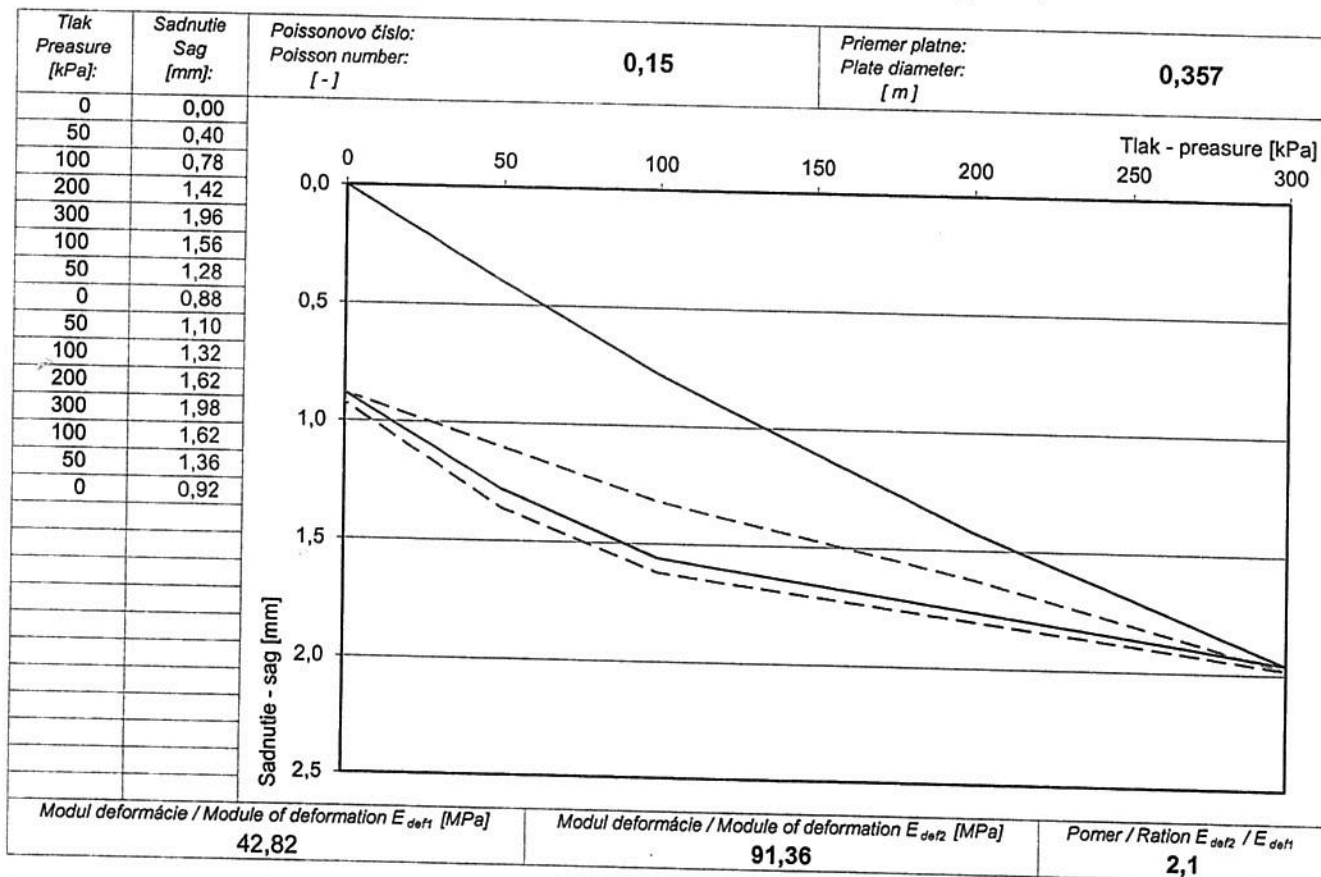

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] ≥ 90
pomer $\leq 2,5$
(N)

Poznámky - Comments:

opravné meranie

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.09.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

F17A-Z08-1-04/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 / 1

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/4958

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha F
Skúšobný postup: SP-Z08/1
Rozšírená neistota $U(k=2)$: 6,0%
Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/63
Material type:

(N)


Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: km 0,300 L'S
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/4958
Records note nr.:

Počasie: slnečno
Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 13.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 13.09.2017
Test ending (date-time):

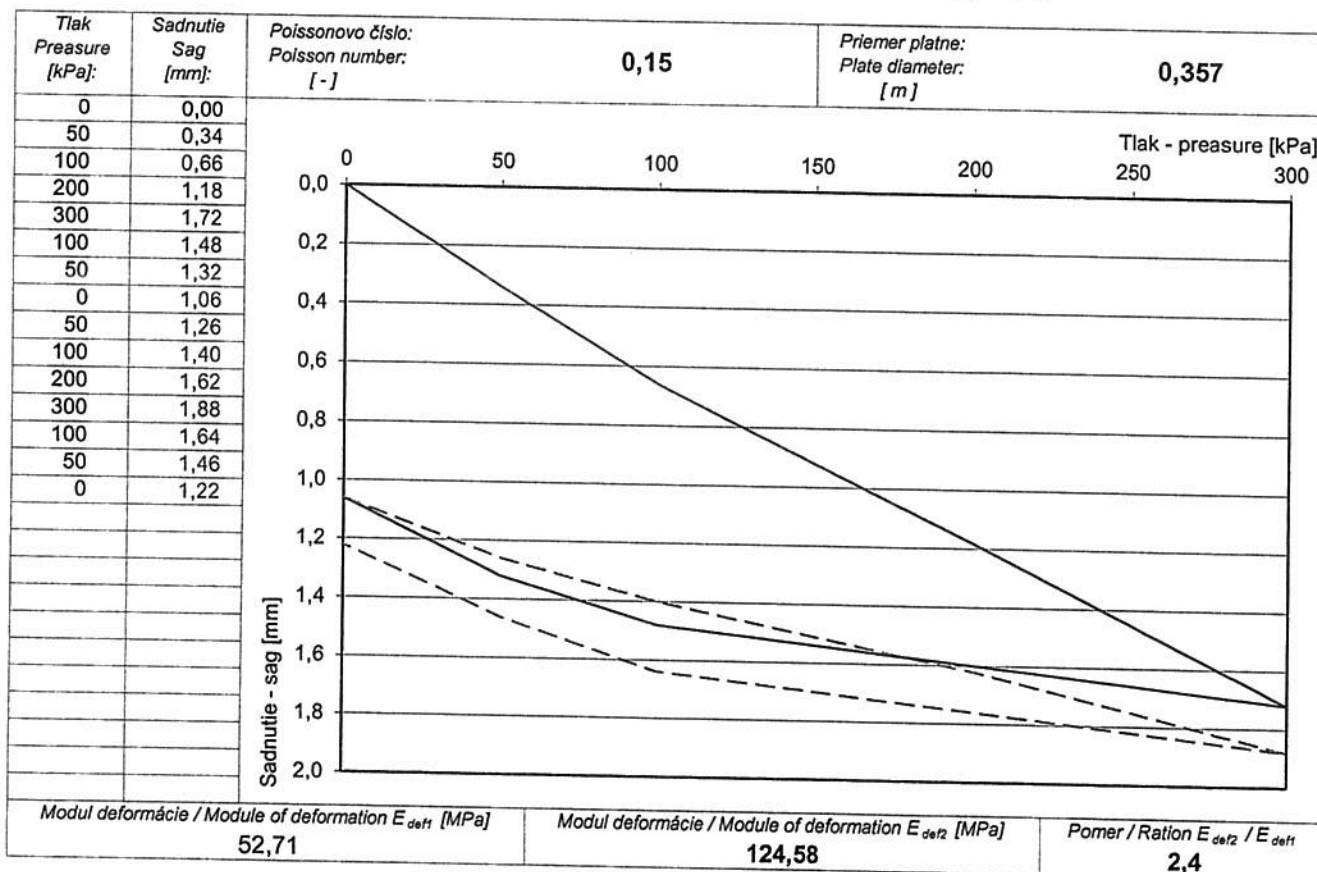

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 90 $\leq 2,5$
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 13.09.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5070a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad
Zhotoviteľ / Contractor: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
Skúšobný postup: SP-V03
Rozšírená neistota $U(k=2)$: 11,9%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: Pohranice 0/63
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:

Staničenie: vid. nižšie
Stationing:

(N)

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5070a
Records note nr.:

Metóda: 3m lata
Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test ending (date-time):

Meraná rovinnosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral

P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	0,1	19	23	15	11
2	0,2	22	25	13	10
3	0,3	20	21	16	14
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných KSP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] ≤ 40
priečna [mm] ≤ 30

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.09.2017
Date of issuance:


Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



SNAS
Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5048a Zrinitosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,
Výrobca / Producer: EUROVIA SK, a.s., Závod Dopravné stavby, Partizánska 26, SK-05801 Poprad,,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO:120
Konštrukcia / Construction: Konštrukčná pláň

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 933 - 1:2012 / O1:2013
Skúšobný postup: SP-K02
Rozšírená neistota U(k=2): 3,2%
Odchylky od skúšobného postupu: žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: Štrkodrvina 0/63 Pohranice
Material name: Štrkodrvina 0/63 Pohranice
Frakcia materiálu: 0/63
Material fraction: 0/63
Miesto odboru: stavba
Sampling site: stavba
Označenie vzorky: 440/2017/MH/K
Markings of sample: 440/2017/MH/K
Staničenie: km 0,200
Stationing: km 0,200
Odobral: SMATANA Zoltán
Sampler: SMATANA Zoltán
Odbor (dátum-čas): 14.9.2017
Sampling (date-time): 14.9.2017
Prevzatie (dátum-čas): -
Entrance (date-time): -

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5048
Records note nr.: SPB/2017/5048
Metóda: mokrý rozbor
Method: wet analysis
Začiatok skúšky (dátum-čas): 14.09.2017
Test beginning (date-time): 14.09.2017
Koniec skúšky (dátum-čas): 19.09.2017
Test ending (date-time): 19.09.2017

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]	M' [kg]	M ₁ [kg]	M ₂ [kg]	M ₁ - M ₂ [kg]
125		100		42,375	40,500	1,875
90	0,0	100				
63	705,0	98				
56		94				
45	4015,0	89				
31,5	4190,0	79				
22,4	4250,0	69				
16	4205,0	59				
11,2	3910,0	50				
8	3700,0	41				
5,6	3455,0	33				
4	2970,0	26				
2,8		23				
2	2105,0	21				
1	1980,0	16				
0,5	1850,0	12				
0,25	1640,0	8				
0,125	805,0	6				
0,063	610,0	4,7				
0,063P	110,0					
0,063T	1875,0	0,0				
Σ	42375,0	100,0				

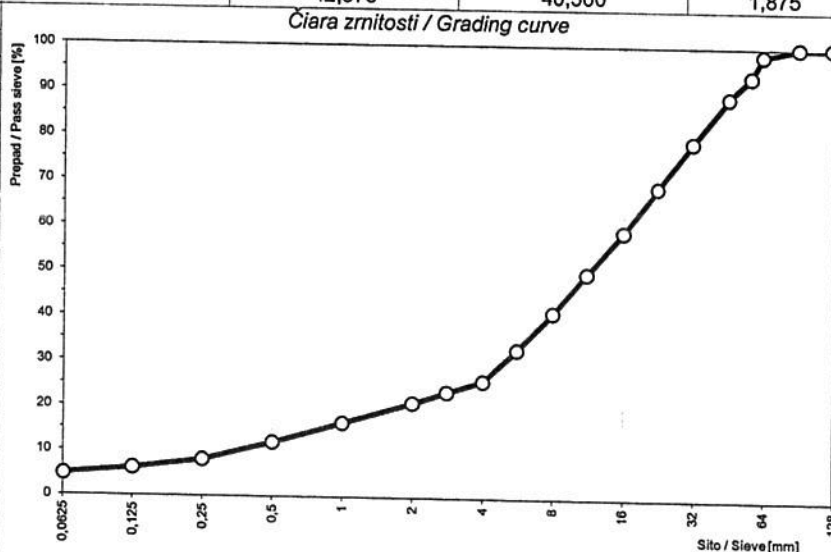

Kategória podľa / Category according to:

Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	98	79	-	-	4,7
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85						f ₅

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Mária

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOTÁK Júraj

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 19.09.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

F17A-K02-04/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZDRUŽENIE INFRASTRUKTÚRA NITRA
Ing. Jozef Štrabag

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5111a	SO 120	0,002 - 0,332	nestmelená vrstva z UM (ŠD)	meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou	pohranice UM (ŠD)Dmax 31,5	1	20 mm		Vyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5110	SO 120	0,050 - 0,200	nestmelená vrstva z UM (ŠD)	rádiometrické meranie objemovej hmotnosti	pohranice UM (ŠD)Dmax 31,5	2	min. 97%	99,0%; 99,7%	Vyhovuje
18.9.2017	SPB/2017/5074	SO 120	0,28	nestmelená vrstva z UM (ŠD)	statická zaťažovacia skúška	pohranice UM (ŠD)Dmax 31,5	1	Edef2 min 120 Mpa Edef2/Edef1 max 2,2	130,51 (2,2)	Vyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5109	SO 120	0,005	nestmelená vrstva z UM (ŠD)	statická zaťažovacia skúška	pohranice UM (ŠD)Dmax 31,5	1	Edef2 min 120 Mpa Edef2/Edef1 max 2,2	137,04 (1,8)	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/5111a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 120

Konstrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:

STN EN 13036-7:2005 SP-V03 11,9% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:
Material type: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5

Miesto merania:
Measuring site: stavba Staničenie: vid. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/5111a

Metóda:
Method: 3m lata

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 20.09.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 20.09.2017

Meraná rovinatosť: Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	0,002	7;5;7;7;7;6;5;4;6;6;4;5;4	6;7;7;7;3;7;4;4;8;8;4;3;8;4		
2	0,032	5;6;3;7;6;6;3;6;5;4;5;4;8;4;6	5;4;5;5;6;6;6;6;5;8;5;6;6;7;7		
3	0,062	3;3;7;5;8;5;5;8;7;4;7;4;4;8;6	4;6;3;5;6;5;3;3;7;3;4;5;7;5;5		
4	0,092	8;5;3;6;6;5;5;5;5;4;5;6;4;7	6;4;5;5;7;5;6;6;4;6;4;7;8;5	4	6
5	0,122	4;6;7;7;3;8;7;8;4;8;4;6;6;6;5	4;6;7;3;5;7;4;4;4;6;5;4;8;3;4		
6	0,152	7;7;6;4;5;6;6;7;4;6;6;7;5;4;7	3;5;8;8;3;5;7;5;5;5;8;4;3;7;5		
7	0,182	5;4;8;6;7;4;4;7;4;5;4;6;6;3;7	7;6;4;8;3;5;6;4;8;7;5;3;4;5;7	5	3
8	0,212	3;8;4;7;6;4;6;6;8;8;3;4;5;5;7	4;7;4;7;7;5;5;4;7;4;5;4;4;5;6		
9	0,242	6;7;6;3;6;7;5;5;6;4;5;3;6;8;7	6;5;7;4;6;7;3;5;6;4;6;5;6;7;4		
10	0,272	7;7;4;6;3;6;6;7;5;6;7;7;7;8;6	8;3;6;3;8;7;5;5;6;7;6;3;4;4;7	5	5
11	0,302	7;5;6;6;4;5;3;4;5;6;8;7;5;6;5	7;6;6;7;5;5;6;5;7;4;4;5;3;3;7		
12	0,332	7;8;7;4	6;5;7;6		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných KSP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] ≤ 20
priečna [mm] ≤ 20

Poznámky - Comments:

(N)

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:


KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 21.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5110

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:

STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971 SP-Z07 7,4% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name: SMATANA Zoltán
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) D_{max} 31,5
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site: Stationing: vid'. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5110
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	km 0,050 PS	2146 2,90	2187 2,70	2132 3,10	2155 2,90	1,00	2155	99,0
2	km 0,200 LS	2159 3,00	2188 3,30	2162 2,80	2170 3,03	1,00	2170	99,7
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:							2176 [kg/m ³]	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %
(N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.09.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5074

Statická zaťažovacia skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) Dmax 31,5
 Material type:


Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,280 L'S
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5074
 Records note nr.:

Počasie: slnečno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 18.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 18.09.2017
 Test ending (date-time):

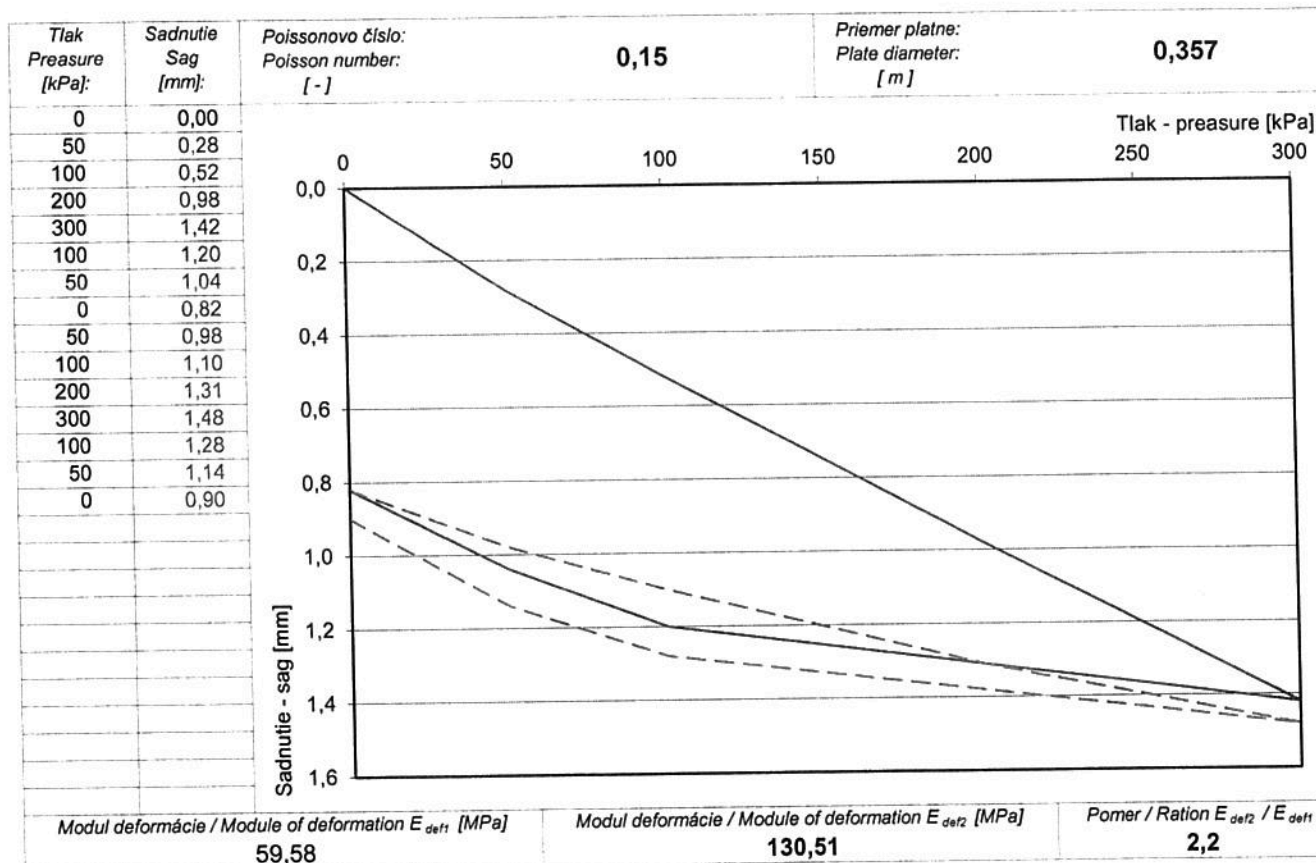**Požiadavka - Requirement:**

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 120 $\leq 2,2$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
 SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
 KUCHÁR Jaroslav


Schválil - Confirmed by:
 Ing. DANCOS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 21.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/5109 Statická zaťažovací skúška - Static bearing test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchýlky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 736133:2010 príloha F SP-Z08/1 6,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice UM (ŠD) D_{max} 31,5
 Material type:


Miesto merania: stavba Staničenie: km 0,005 LS
 Measuring site: Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/5109
 Records note nr.:

Počasie: oblačno
 Weather:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.09.2017
 Test ending (date-time):

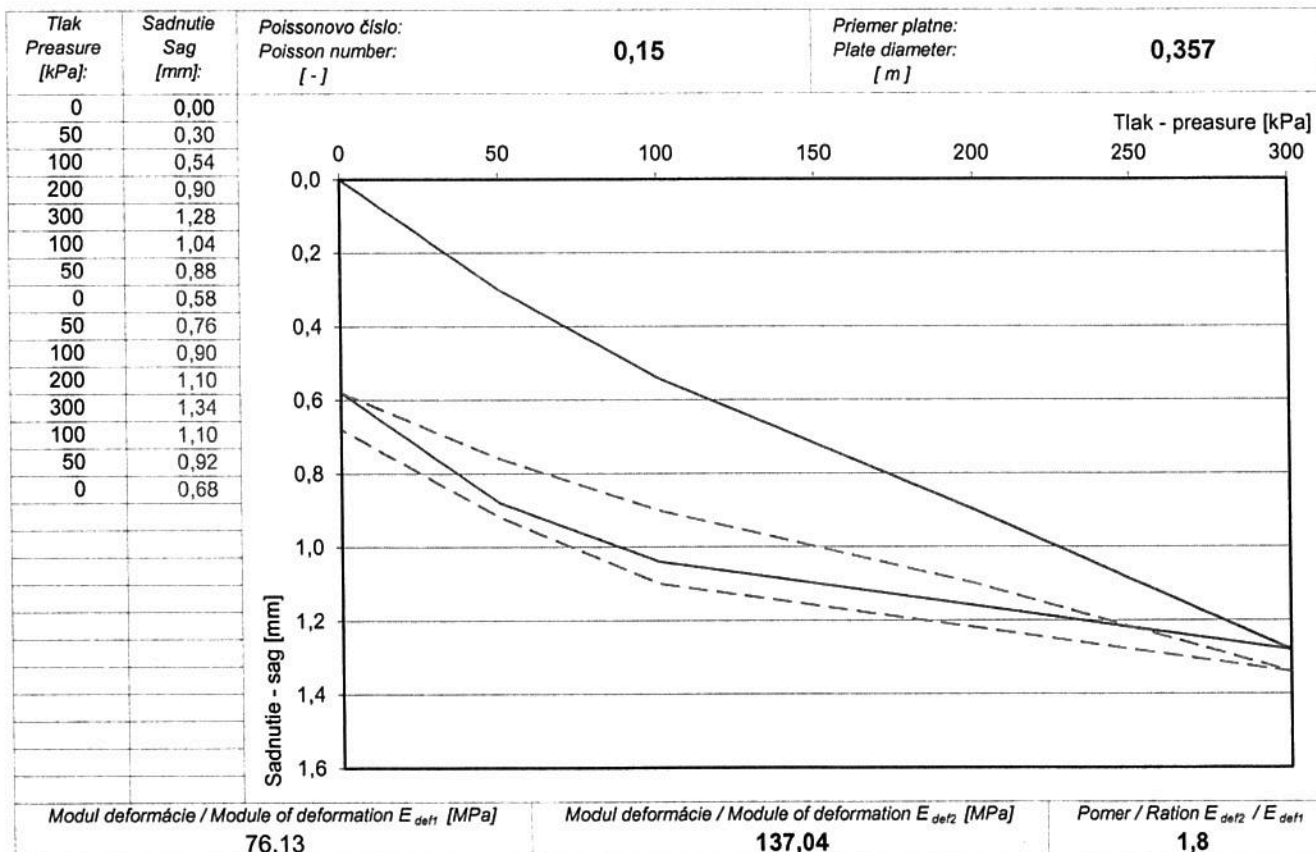

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť a pomer je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

E_{def2} [MPa] pomer
 ≥ 120 $\leq 2,2$
 (N)

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 21.09.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

ZDROUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA
Dopravný ústav
STRAŽAG

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5200c	SO 120	0,28	hydraulicky stmelená vrstva z CBGM	pevnosť v tlaku	betón CBGM C5/6	1		3,6 Mpa	Vyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5101c	SO 120	0,28	hydraulicky stmelená vrstva z CBGM	pevnosť v tlaku	betón CBGM C5/6	1		3,5 Mpa	Vyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5102c	SO 120	0,28	hydraulicky stmelená vrstva z CBGM	pevnosť v tlaku	betón CBGM C5/6	1	min 6 Mpa	7,5 Mpa	Vyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5103	SO 120	0,2-0,28	hydraulicky stmelená vrstva z CBGM	rádiometrické meranie objemovej hmotnosti	betón CBGM C5/6	2	min. 97%	99,2%; 97,3%	Vyhovuje

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5200c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strenght in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Výrobca / Producer: LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemska 13, SK-85007 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C5/6	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Concrete identif.:		Sampler:	
Receptúra č. / CE:		Oder (dátum-čas):	20.09.2017
Prescriptions n/		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	21.09.2017
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/5200c	Teplota:	[°C] 20,0
Records note nr.:		Temperature:	

Zloženie zmesi / componets of concrete mix:

Cement /Cement: CEM III/32,5 N
Prísady / additions: -
Primesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/20	NRS/21
Dodací list / Dispath note:	51769	51769
ŠPZ / MVRP:	NR609ET	NR609ET
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-
Vek telesa / Specimen age: [dni]	7	7
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	149,90	148,10
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	120,70	121,60
Plocha / Area: [cm²]	176,48	172,27
Objem / Volume: [cm³]	2130,10	2094,76
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,988	5,021
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2340	2400
Sila / Power: [kN]	64,0	59,6
Pevnosť v tlaku: [MPa]	3,6	3,5
Priemerná pevnosť v tlaku: [MPa]	3,6	
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-

Požiadavka - Requirement:
Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:
Ing. CARASECOVÁ Mopika

Kontroloval - Controlled by:
REPKO Ondrej

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 28.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5101c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strenght in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemska 13, SK-85007 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C5/6	Odobral :	Mgr. TOKOŠ Marek
Concrete identif.:		Sampler:	
Receptúra č. / CE:	neudaná	Odbor (dátum-čas):	20.09.2017
Prescriptions n. /		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	21.9.2017
Sampling site:		Entrance (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:	SPB/2017/5101c	Teplota:	[°C] 20,0
Records note nr.:		Temperature:	

Zloženie zmesi / componets of concrete mix:

Cement /Cement: CEM III/32,5 N
 Prísady / additions: -
 Prímiesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/19			
Dodací list / Dispath note:	51769			
ŠPZ / MVRP:	NR609ET			
Vlhkosť / Moisture:	[%]	-		
Vek telesa / Specimen age:	[dni]	5		
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.)	[mm]	149,70		
Rozmer / Dimension d3 (výška/height)	[mm]	120,80		
Plocha / Area:	[cm²]	176,01		
Objem / Volume:	[cm³]	2126,18		
Hmotnosť / Weight:	[kg]	4,937		
Obj.hmotnosť / Bulk density:	[kg/m³]	2320		
Sila / Power:	[kN]	61,7		
Pevnosť v tlaku:	[MPa]	3,5		
Compression strength:				
Stav povrchu telesa:	mokrý	mokrý	mokrý	mokrý
State of specimen surface:	wet	wet	wet	wet
Vyrovnanie povrchu telesa:	-	-	-	-
Line-uping of specimen surface:				
Zvláštny typ porušenia telesa:	-	-	-	-
Specific breaking type of specimen:				

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

REPKO Ondrej

Kontroloval - Controled by:

Ing. CARASECOVÁ Mopika

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCŠ Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 25.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov.
 Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/5102c

Pevnosť v tlaku - CBGM / Strenght in pressure - CBGM

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemská 13, SK-85007 Bratislava, betonáreň Nitra

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13286-41:2007	SP-B03/2	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	CBGM C5/6	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Concrete identif.:		Sampler:	
Receptúra č. / CE:	neudaná	Odbor (dátum-čas):	20.09.2017
Prescriptions n. /		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	21.9.2017
Sampling site:		Entrance (date-time):	
		Začiatok skúšky (dátum-čas):	18.10.2017
		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	18.10.2017
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5102c
 Records note nr.:
 Teplota: [°C] 20,0
 Temperature:

Zloženie zmesi / componets of concrete mix:

Cement /Cement: CEM III/32,5 N
 Prísady / additions: -
 Prímiesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/22	NRS/23	NRS/24
Dodací list / Dispath note:	51769	51769	51769
ŠPZ / MVRP:	NR609ET	NR609ET	NR609ET
Vlhkosť / Moisture: [%]	-	-	-
Vek telesa / Specimen age: [dni]	28	28	28
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	150,30	150,10	149,90
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	120,40	119,90	123,50
Plocha / Area: [cm²]	177,42	176,95	176,48
Objem / Volume: [cm³]	2136,16	2121,63	2179,52
Hmotnosť / Weight: [kg]	4,951	4,955	5,063
Obj. hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2320	2340	2320
Sila / Power: [kN]	134,4	129,8	119,8
Pevnosť v tlaku: [MPa]	7,5	7,5	7,0
Príemerná pevnosť v tlaku: [MPa]	7,5		
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet
Vyrovnanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 14227-1a súvisiacich noriem

[MPa]

≥ 6

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

REPKO Ondrej

Kontroloval - Controled by:

Ing. CARASECOVÁ Monika

Schválil - Confirmed by:

 Ing. DANCOS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 18.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-B03-4-10/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5103

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971
 Skúšobný postup: SP-Z07
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 7,4%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: CBGM C5/6
 Druh materiálu: CBGM C5/6 - CEM III 32,5 N
 Miesto merania: stavba
 Staničenie: vid. nižšie
 Odbor: Mgr. TOKOŠ Marek
 Odbor (dátum-čas): 20.09.2017
 Prevzatie (dátum-čas): 20.09.2017
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 20.09.2017
 Koniec skúšky (dátum-čas): 20.09.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5103
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	km 0,280	2176 5,97	2166 5,91	2176 5,84	2173 5,91	1,00	2173	99,2
2	km 0,200	2128 5,88	2133 5,90	2131 5,92	2131 5,90	1,00	2131	97,3
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		SK12/14/065/0906					2190	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Výrobňa: LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemska 13, SK-85007 Bratislava, betonáren Nitra

(N)

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltan

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 21.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/Nezhovuje
28.9.2017	SPB/2017/5301a	SO 120	0,050 - 0,200	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 P	Vývrty - zhutnenie a hrúbka	AC 22 P 35/50; I	2	min. 97%	98,0%; 98,1%	Vyhovuje
26.9.2017	SPB/2017/5189	SO 120	0,100	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 P	Rozbor zmesi	AC 22 P 35/50; I	1			Vyhovuje
26.9.2017	SPB/2017/5189a	SO 120	0,100	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 P	Odolnosť voči trv. deformáciám	AC 22 P 35/50; I	1			Vyhovuje
27.9.2017	SPB/2017/3444a	SO 120	0,000 - 0,330	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 P	Nerovnosť povrchu	AC 22 P 35/50; I	celý úsek	pozdižna max. 18mm; priečna max. 10 mm		Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/5301a

Objemová hmotnosť asfalt. zmesi na vývrtoch / Bulk density of asphalt mixture assigned on drilling sample

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o.(T), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: podkladová vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchýlky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 12697-5/O1:2013,-6:2012,STN 736121:200 SP-V01 2,1% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 22 P 35/50;I;ZH15 Odobral: KUCHÁR Jaroslav
 Material name: Sampler:
 Druh materiálu: AC 22 podklad 35/50 Označenie vzorky: SPB/2017/5301a Odber (dátum-čas): 28.09.2017
 Material type: Markings of sample: Sampling (date-time):
 Miesto odberu: stavba Staničenie: viď. nižšie Prevzatie (dátum-čas): 28.09.2017
 Sampling site: Stationing: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/5301a
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 02.10.2017
 Test ending (date-time):

Teleso Specimen	Staničenie Stationing	hp (N) [mm]	m1 [g]	m2 [g]	m3 [g]	ρ_w [Mg/m³]	ρ_{vz} [Mg/m³]
1	km 0,200 PS	64,8	924,20	545,20	927,00	0,9987	2,417
2		64,0	852,20	504,00	855,10	0,9987	2,424
3		64,4	922,30	544,10	924,60	0,9987	2,421
4		64,1	934,10	553,20	937,30	0,9987	2,429

Priemer / Average

2,423

Porovnávacia OH z protokolu a miera zhutnenia:

SPB/2017/5189

2,473

98,0 %

Comparations BD from protocol and compaction degree:

Teleso Specimen	Staničenie Stationing	hp (N) [mm]	m1 [g]	m2 [g]	m3 [g]	ρ_w [Mg/m³]	ρ_{vz} [Mg/m³]
1	km 0,050 L'S	65,7	1045,40	620,00	1051,10	0,9987	2,422
2		64,9	979,80	581,20	983,70	0,9987	2,431
3		64,2	995,80	589,10	999,50	0,9987	2,423
4		65,1	1055,70	624,90	1060,00	0,9987	2,423

Priemer / Average

2,425

Porovnávacia OH z protokolu a miera zhutnenia:

SPB/2017/5189

2,473

98,1 %

Comparations BD from protocol and compaction degree:

Teleso Specimen	Staničenie Stationing	hp (N) [mm]	m1 [g]	m2 [g]	m3 [g]	ρ_w [Mg/m³]	ρ_{vz} [Mg/m³]
1							
2							
3							
4							

Priemer / Average

Porovnávacia OH z protokolu a miera zhutnenia:

Comparations BD from protocol and compaction degree:

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia asfaltovej zmesi podľa TKP a platných noriem je:

MZ [%]
97,0

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5189

Rozbor asfaltovej zmesi / Analysis of asphalt mixture

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.

dohoda

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry-strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: podkladová vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 rada - STN EN 12697,STN EN 933-1 SP-AZ02,3,4,5,7 vid. výsledky žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 22 P 35/50;I;ZH15 Odbor: Mgr.TOKOŠ
 Material name: AC 22 P 35/50 Sampler:
 Druh materiálu: AC 22 P 35/50 Označenie vzorky: 7/2017/CI Nitra Odbor (dátum-čas): 26.09.2017 - 11:30
 Material type: AC 22 P 35/50 Markings of sample: Stationing: km 0,100 Sampling (date-time):
 Miesto odboru: stavba Prevezatie (dátum-čas): 26.09.2017
 sampling site: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/5189
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 02.10.2017
 Test ending (date-time):

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [g]	Prepad / pass s. [%]	Hm.vzorky / Sample weight [g]	Patrola / Filler cup [g]	Patr.+ filer / Filler cup + filler [g]
			1286,60	666,80	750,50
125		100	Čiara zrnitosti / Grading curve 		
90		100			
63		100			
56		100			
45		100			
31,5	0,0	100			
22,4	38,3	97			
16	77,0	91			
11,2	195,1	75			
8	121,0	65			
5,6	129,4	54			
4	127,8	44			
2,8		36			
2	196,0	28			
1	137,0	17			
0,5	62,5	12			
0,25	35,2	9			
0,125	19,5	7			
0,063	7,9	6,8			
dno	84,0	0,0			
Σ	1230,7	100,0			

PST - AC 22 P 35/50;I;ZH15

OCL (STN EN 13108-21)

Test	Parameter	Value	Neistota	Deklarované
AZ02-Obsah rozpustného spojiva / Soluble bitumen content:	S [%]	4,3	0,2 %	3,7 + 4,3
AZ03-Objemová hmotnosť / Bulk density	ρ _{bsad} [Mg/m³]	2,473		-
AZ03-Maximálna hmotnosť / Maximal density	ρ _{mv} [Mg/m³]	2,576	0,8%	-
AZ03-Medzerovitost' (vo vode) / Air voids content (in water)	V _m [%]	4,0		4,0 + 8,0
AZ05-Pomer hĺbka a sklon vy. kofaje / Proportional depth and strain of tracking	PRDAIR / WTS _{air} [% , mm]		0,2 mm	-
AZ04-Pomer pevnosti v priečnom ťahu / Indirect tensile strength ratio	ITSR [%]	82,3	1,5 %	min. 60
AZ07-Stekavosť asfaltového spojiva / Binder drainage	(N) D [%]			-
AZ03-Perc. medzier v kamenive vypl. asfaltom / Voids filled with binder	VFB [%]		-	-

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:**

(N)

Skúšal - Tested by:

ILKOVÁ Katarína

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elena

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 02.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5189d

Odolnosť asfaltovej zmesi proti trvalým deformáciám / Asphalt mixture resistance to permanent deformation

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.

dohoda

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 120
Konštrukcia / Construction: podkladová vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchýlky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
STN EN 12697-22+A1, O1:2008 SP-AZ05 0,2mm žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: AC 22 P 35/50;I;ZH15 Odbрал: Mgr. TOKOŠ Marek
Material name: AC 22 P 35/50;I;ZH15 Sampler:
Druh materiálu: AC 22 podklad 35/50 Označenie vzorky: 7/2017/CI Nitra Odbor (dátum-čas): 26.09.2017 - 11:30
Material type: AC 22 podklad 35/50 Markings of sample: Stationing: km 0,100 Prevzatie (dátum-čas): 26.09.2017
Miesto odberu: stavba Sampling site: Stationing: km 0,100 Entrance (date-time): 26.09.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5189-1 Metóda: metóda B (vzduch) Koniec skúšky (dátum-čas): 10.10.2017
Records note nr.: Method: Test ending (date-time):

Zloženie zmesi (PST) / Mixture proportion (TT)	[%]	Spôsob výroby zmesi / Mixture fabrication type:
		vo výrobe na obafovacej súprave
		Spôsob hutnenia vzorky / Type of sample compaction:
		vzorka pripravená segmentovým zhuťňovačom podľa STN EN 12697-33
		Teplota pri výrobe vzoriek / Fabrication temperature: 165,0°C
		Vek vzorky / Sample age: 12 dní
		Spôsob skladovania / Type of holding: laboratórium

Výsledky skúšok / Tests results	Vzorka / Sample 1	Vzorka / Sample 2	Priemer / Average
Rozdiel zhutnenia vzorky 1 a 2 / Differences of compaction degree of sample 1 and 2			
Priemerná hrúbka vzorky / Average sample thickness	60,40	60,30	60,35
Objemová hmotnosť vzorky / Bulk density of sample (STN EN 12697-6/D)	2,324	2,329	2,326
Priemerná teplota pri skúške / Average temperature at test			50,0
Hĺbka deformácie po / Deformation depth after: 5000 cy.	1,70	1,82	1,76
Hĺbka deformácie po / Deformation depth after: 10000 cy.	1,91	2,10	2,00
Sklon vyjazdenej koľaje / WTS _{air}	0,04	0,06	0,05
Pomer hĺbky vyjazdenej koľaje / PRD _{air}	3,2	3,5	3,3
Hĺbka vyjazdenej koľaje / RD _{air}	1,90	2,10	2,00

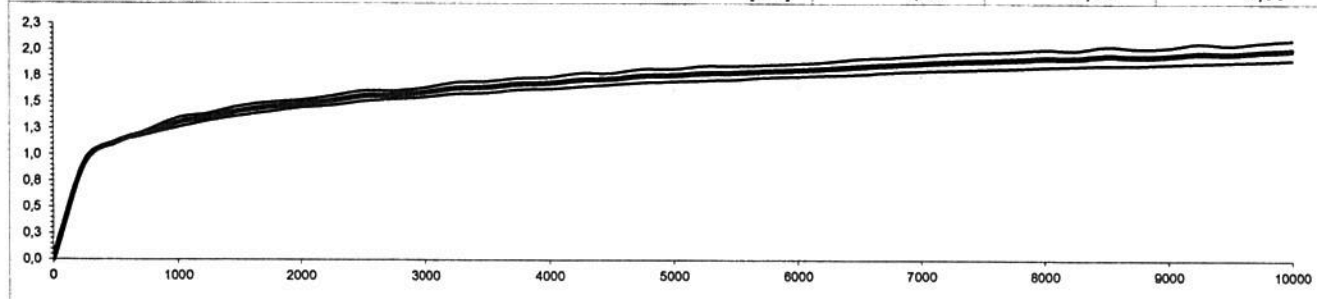

Požiadavka - Requirement:

Maximálne dovolené hodnoty sú podľa deklarovaných hodnôt v PST:

WTS_{air} [mm]

0,1

PRD_{air} [%]

5,0

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elena

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 11.10.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina STRED - pracovisko ZVOLEN
Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993



SNAS
Reg. No. 211/S-176


Protokol / Protocol: SZV/2017/3444a
Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
zmluva NS:FBAV

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)
Objekt / Building object: SO 120
Konštrukcia / Construction: podkladná vrstva krytu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
Skúšobný postup: SP-V03
Rozšírená neistota $U(k=2)$: 11,9%
Odchýlky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 22 P 35/50;I;ZH15

Druh materiálu: AC 22 podklad. 35/50

Miesto merania: stavba

Staničenie: vid'. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SZV/2017/3444
Records note nr.:

Metóda: 3m lata, planograf
Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral					
Measured evenness:					
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	-	číslo skúšky 2	číslo skúšky 1		
2	km 0,000	počet nevyhovujúcich	počet nevyhovujúcich		
3	až	hodnôt : 0	hodnôt : 0		
4	km 0,330	graf v prílohe	graf v prílohe		
5					
6					
7	km 0,017			3	3
8	km 0,057			3	4
9	km 0,097			2	3
10	km 0,137			3	2
11	km 0,177			3	3
12	km 0,217			4	3
13	km 0,257			3	2
14	km 0,297			2	4
15	km 0,323			3	3
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] ≤ 18
priečna [mm] ≤ 10

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

KOLLÁR Boris

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 05.10.2017
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-V03-10/17


(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1

Číslo skúšky: 1
Dátum : 27.9.2017

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom


Strana: 1

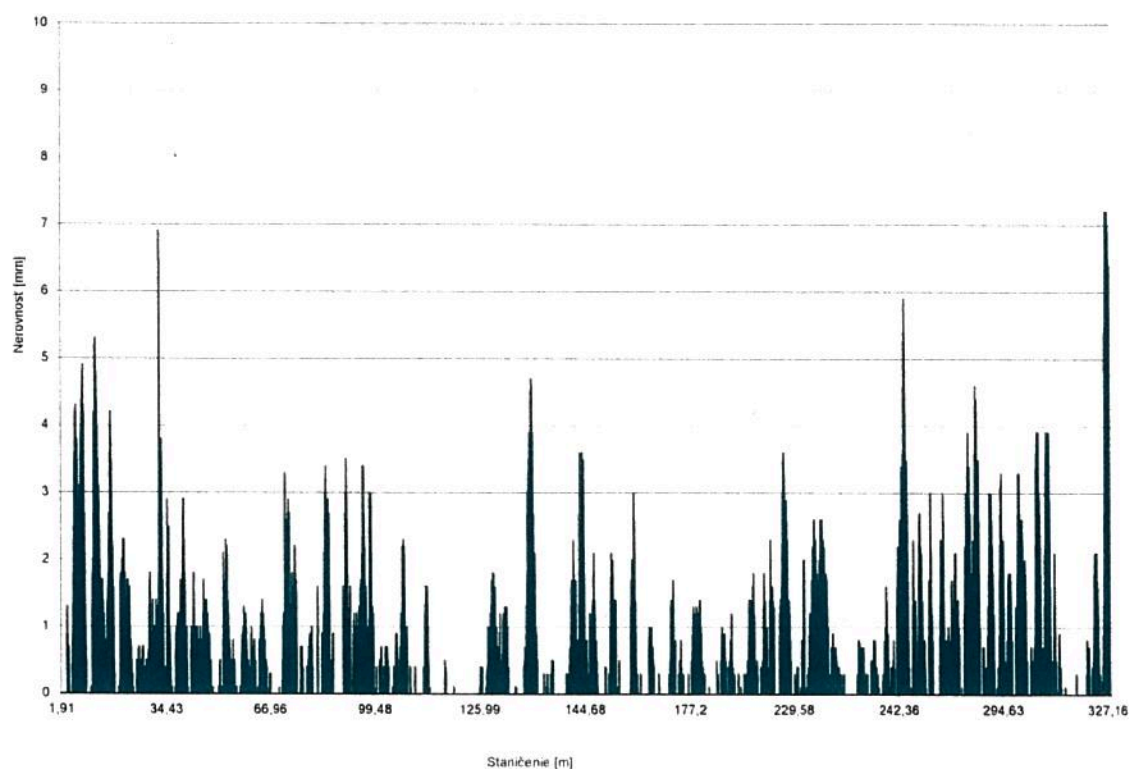

Číslo skúšky: 2
Dátum : 27.9.2017

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1

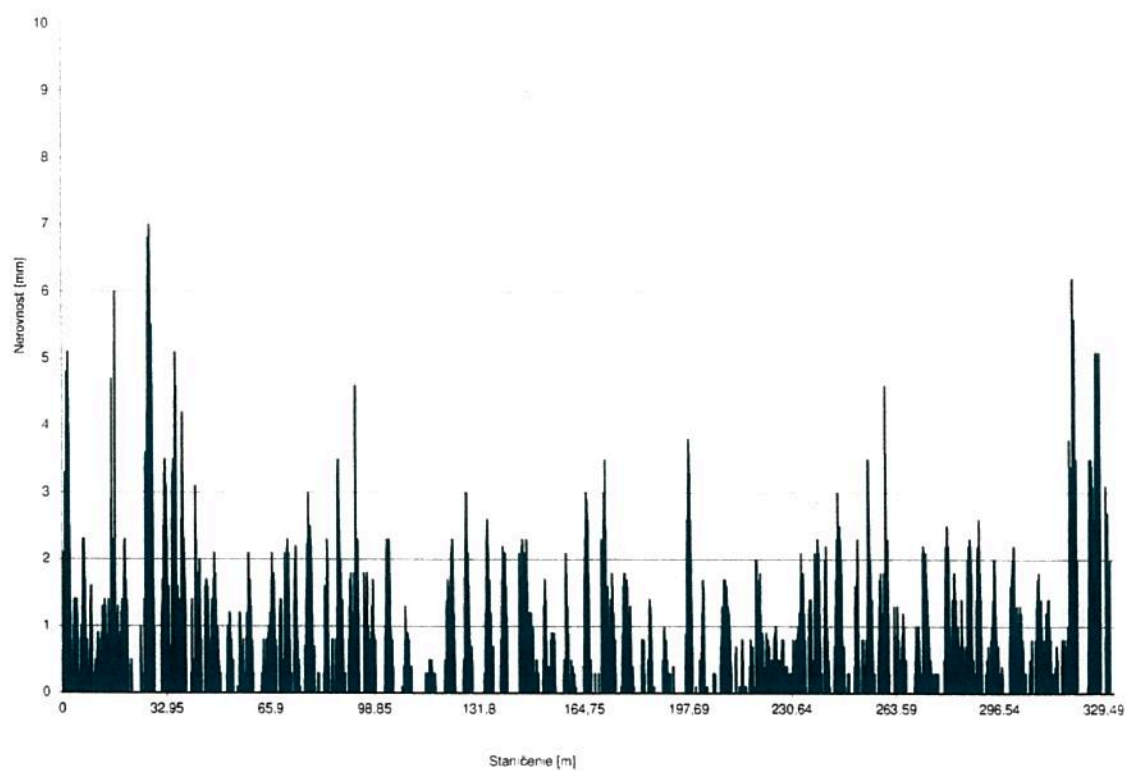

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
27.9.2017	SPB/2017/5461	SO 120	0,15	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 L	rádiometrické meranie objemovej hmotnosti	AC 22 L PMB 45/80-75;I	1	98%	0,98	Vyhovuje
28.9.2017	SPB/2017/3445a	SO 120	0,000 - 0,330	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 L	Nerovnosť povrchu	AC 22 L PMB 45/80-75;I	celý úsek	pozdlžna max. 8mm; priečna max. 6 mm		Vyhovuje
28.9.2017	SPB/2017/5199a	SO 120	0,150	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 L	Odolnosť voči trv.deformáciám	AC 22 L PMB 45/80-75;I	1			Vyhovuje
28.9.2017	SPB/2017/5199	SO 120	0,150	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 L	Rozbor zmesi	AC 22 L PMB 45/80-75;I	1			Vyhovuje
28.9.2017	SPB/2017/5302a	SO 120	0,050 - 0,200	Asfaltová vrstva vozovky AC 22 L	Vývrty - zhutnenie a hrúbka	AC 22 L PMB 45/80-75;I	2	min. 97%	98,7%; 99,0%	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/5461

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti vrstiev / Radiometric testing of density of layers

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o. (TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: ložná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 731375:1971
 Skúšobný postup: SP-V02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 22 L PMB 45/80-75;I; ZH26B

Druh materiálu: AC 22 ložn. PMB 45/80-75

Miesto merania: stavba
 Staničenie: km 0,150

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5461
 Records note nr.:

Teplota: [°C] 20,0
 Temperature:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 27.09.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie stationing	OH ₁ / BD ₁ [kg/m ³]	OH ₂ / BD ₂ [kg/m ³]	OH ₃ / BD ₃ [kg/m ³]	OH ₄ / BD ₄ [kg/m ³]	OH / BD priemer / average [kg/m ³]	Korelačný koeficient / Correlation factor	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	za finišeron	2002	2007	2000	2009	2004	1,0000	2004	83,2
2	M-bez vibrácie	2078	2079	2080	2074	2078	1,0000	2078	86,2
3	M-bez vibrácie	2099	2107	2091	2095	2098	1,0000	2098	87,1
4	M-s vibráciou	2198	2189	2200	2197	2196	1,0000	2196	91,1
5	M-s vibráciou	2277	2271	2280	2284	2278	1,0000	2278	94,5
6	V-bez vibrácie	2287	2280	2284	2279	2282	1,0000	2282	94,7
7	V-s vibráciou	2368	2364	2369	2370	2368	1,0000	2368	98,3
8	V-s vibráciou	2354	2354	2361	2368	2359	1,0000	2359	97,9
9	V-bez vibrácie	2355	2357	2360	2351	2356	1,0000	2356	97,8
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Porovnávací objemová hmotnosť určená v protokole: SPB/2017/5199								2410	[kg/m ³]
Comaprison buld density specified in protocol:									

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

[%]

97,0 Ø 98,0

Poznámky - Comments:

M= malý valec V= veľký valec

(N)

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 04.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina STRED - pracovisko Zvolen
 Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
 tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993



SNAS
 Reg. No. 211/S-176


Protokol / Protocol: SZV/2017/3445a
Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 zmluva NS:FBAV

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)
 Objekt / Building object: SO 120
 Konštrukcia / Construction: ložná vrstva krytu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
 Skúšobný postup: SP-V03
 Rozšírená neistota U(k=2): 11,9%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: AC 22 L PMB 45/80-75;I;ZH26B

Druh materiálu: AC 22 ložn. PMB 45/80-75

Miesto merania: stavba
 Stationing: vid'. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SZV/2017/3445
 Records note nr.:

Metóda: 3m lata, planograf
 Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 28.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 28.09.2017
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral					
Measured evenness:					
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	-	číslo skúšky 3	číslo skúšky 2		
2	km 0,000	počet nevyhovujúcich	počet nevyhovujúcich		
3	až	hodnôt : 0	hodnôt : 0		
4	km 0,330	graf v prílohe	graf v prílohe		
5					
6	km 0,030			3	3
7	km 0,070			2	3
8	km 0,110			3	3
9	km 0,150			3	2
10	km 0,190			2	2
11	km 0,230			3	4
12	km 0,270			4	3
13	km 0,310			3	3
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] ≤ 8
 priečna [mm] ≤ 6

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

SABACKÝ Peter
 Dátum vystavenia: 05.10.2017
 Date of issuance:



Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nezhodnosť kvality skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

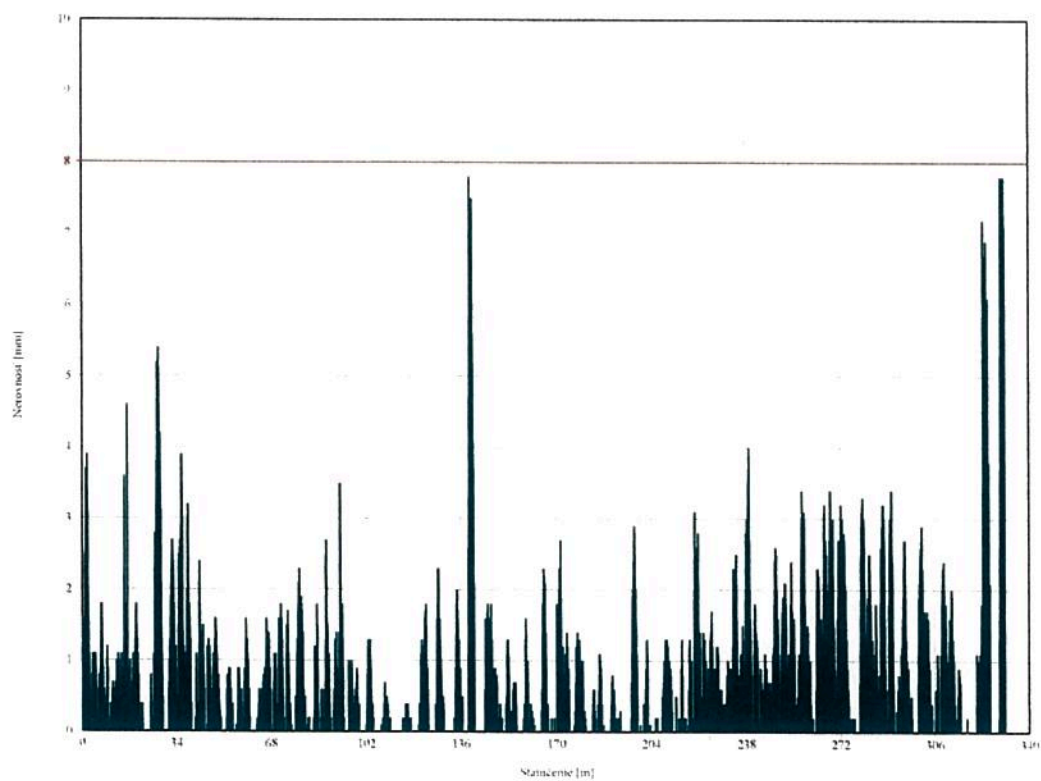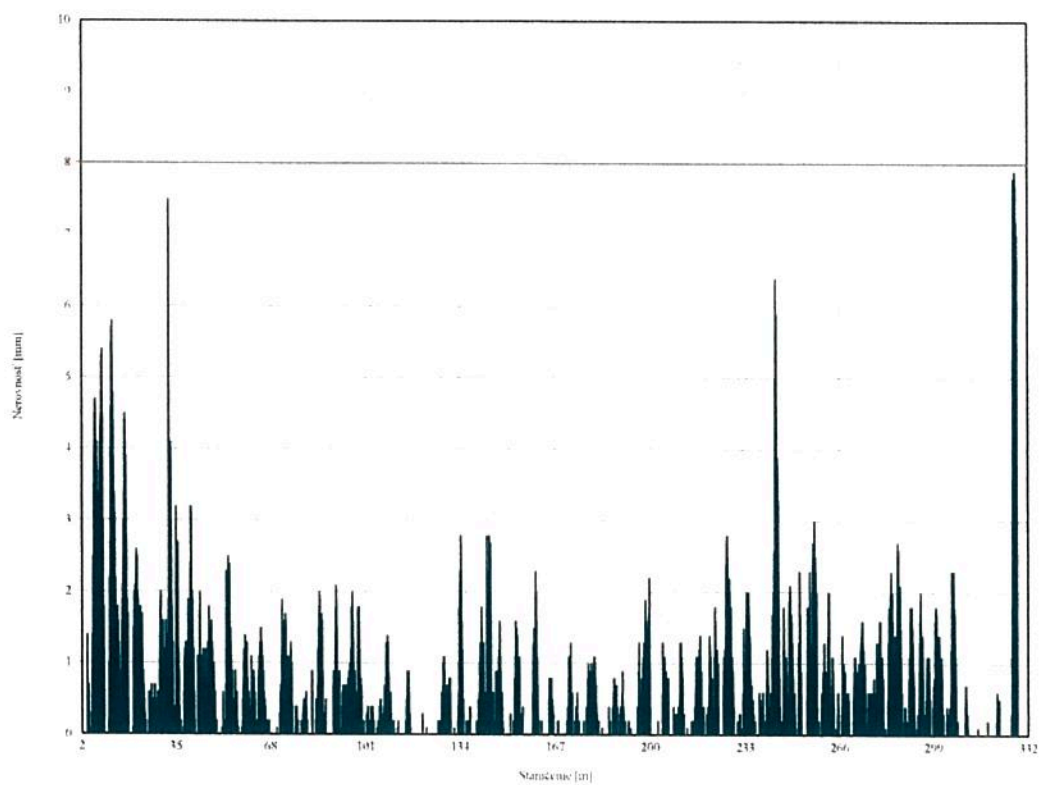


Číslo skúšky: 1

Dátum: 29.09.2017 08:56

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1

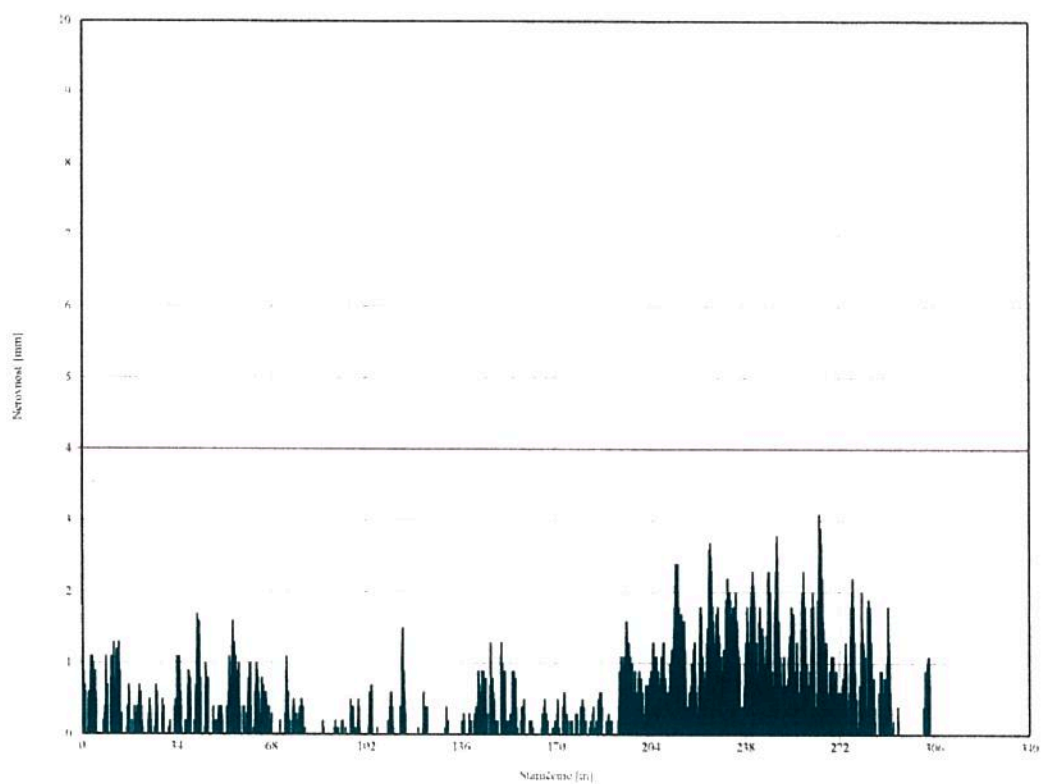


Číslo skúšky: 2

Dátum: 29.09.2017 09:00

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1

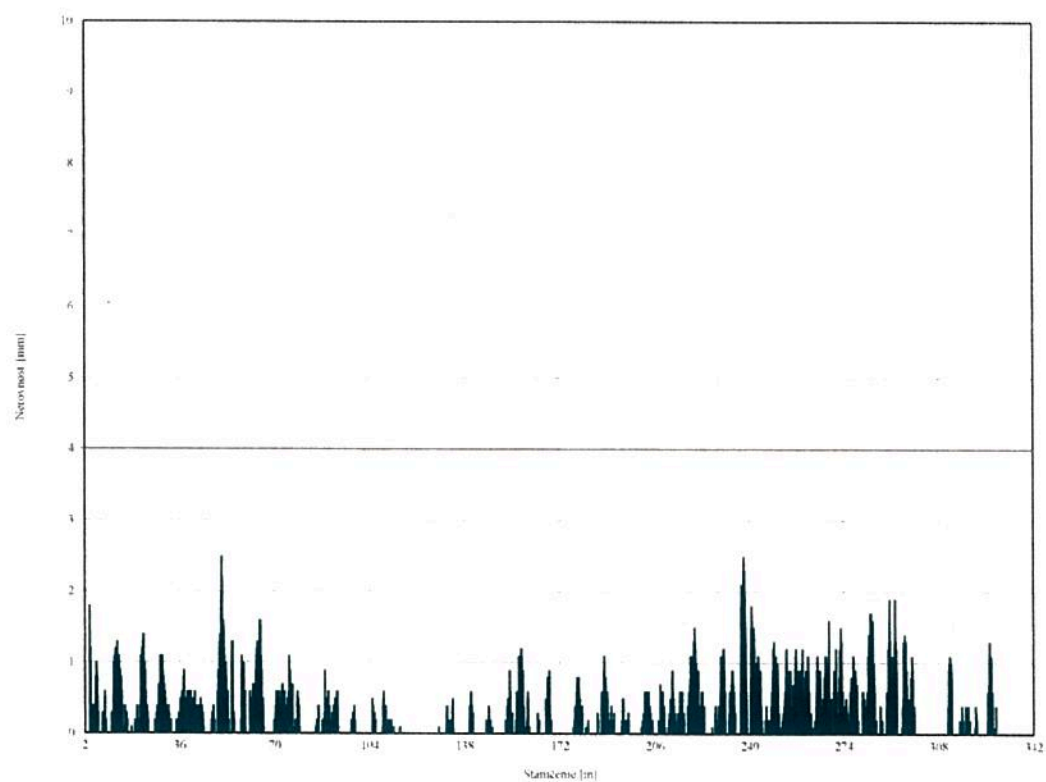



Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2017/5302a****Objemová hmotnosť asfalt. zmesi na vývrtoch / Bulk density of asphalt mixture assigned on drilling sample****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: ložná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 12697-5/O1:2013,-6:2012,STN 736121:20C SP-V01
 Rozšírená neistota U(k=2): 2,1%
 Skúšobný postup: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2):
 Odchylky od skúšobného postupu: Deviation from test procedure: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 22 L PMB 45/80-75;I; ZH26B
 Materiál name: Odobral: KUCHÁR Jaroslav
 Druh materiálu: AC 22 ložn. PMB 45/80-75
 Označenie vzorky: SPB/2017/5302
 Markings of sample: Odbor (dátum-čas): 28.09.2017
 Sampling (date-time):
 Miesto odberu: stavba
 Staničenie: vid. nižšie
 Stationing: Prevzatie (dátum-čas): 28.09.2017
 Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5302a
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 02.10.2017
 Test ending (date-time):

Teleso Specimen	Staničenie Stationing	hp [mm]	(N)	m1 [g]	m2 [g]	m3 [g]	ρ_w [Mg/m³]	ρ_{vz} [Mg/m³]
1	km 0,200 PS	64,5		999,70	584,90	1003,80	0,9987	2,383
2		65,1		1052,90	615,90	1056,90	0,9987	2,384
3		64,2		993,70	581,20	997,80	0,9987	2,382
4		64,4		987,90	578,40	990,70	0,9987	2,393
Priemer / Average								2,386

Porovnávacia OH z protokolu a miera zhutnenia:

Comparisons BD from protocol and compaction degree:

SPB/2017/5199

2,410

99,0 %

Teleso Specimen	Staničenie Stationing	hp [mm]	(N)	m1 [g]	m2 [g]	m3 [g]	ρ_w [Mg/m ³]	ρ_{vz} [Mg/m ³]
1	km 0,050 LS	66,4		1074,50	626,30	1078,00	0,9987	2,376
2		65,9		1072,40	627,60	1076,20	0,9987	2,387
3		64,7		1032,70	603,20	1037,10	0,9987	2,377
4		64,7		971,80	566,30	975,60	0,9987	2,371

Priemer / Average

2,378

Porovnávacia OH z protokolu a miera zhutnenia:

Comparisons BD from protocol and compaction degree:

SPB/2017/5199

2,410

98,7 %

Teleso Specimen	Staničenie Stationing	hp [mm]	(N)	m1 [g]	m2 [g]	m3 [g]	ρ_w [Mg/m ³]	ρ_{vz} [Mg/m ³]
1								
2								
3								
4								

Priemer / Average

Porovnávacia OH z protokolu a miera zhutnenia:

Comparisons BD from protocol and compaction degree:

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia asfaltovej zmesi podľa TKP a platných noriem je:

MZ [%]

97,0

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 03.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5199d

Odolnosť asfaltovej zmesi proti trvalým deformáciám / Asphalt mixture resistance to permanent deformation

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. (TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
 dohoda

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: ložná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN EN 12697-22+A1, O1:2008 SP-AZ05 0,2mm žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:


Názov materiálu: AC 22 L PMB 45/80-75;I;ZH26B Odbor: Mgr. TOKOŠ Marek
 Materiál: AC 22 ložn. PMB 45/80-75 Označenie vzorky: 8/2017/CI Nitra
 Druh materiálu: AC 22 ložn. PMB 45/80-75 Markings of sample: 8/2017/CI Nitra
 Materiál: AC 22 ložn. PMB 45/80-75 Staničenie: km 0,150
 Miesto odboru: stavba Stationing: km 0,150
 Sampling site: stavba

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5199-1 Metóda: metóda B (vzduch)
 Records note nr.: SPB/2017/5199-1 Method: Method: metóda B (vzduch)

Zloženie zmesi (PST) / Mixture proportion (TT)	[%]	Spôsob výroby zmesi / Mixture fabrication type:
		vo výrobe na obaľovacej súprave
		Spôsob hutnenia vzorky / Type of sample compaction:
		vzorka pripravená segmentovým zhutňovačom podľa STN EN 12697-33
		Teplota pri výrobe vzoriek / Fabrication temperature:
		155,0°C
		Vek vzorky / Sample age:
		11 dní
		Spôsob skladovania / Type of holding:
		laboratórium

Výsledky skúšok / Tests results		Vzorka / Sample 1	Vzorka / Sample 2	Priemer / Average
Rozdiel zhutnenia vzorky 1 a 2 / Differences of compaction degree of sample 1 and 2	[%]		0,2	
Priemerná hrúbka vzorky / Average sample thickness	[mm]	60,30	60,40	60,35
Objemová hmotnosť vzorky / Bulk density of sample (STN EN 12697-6/D)	[Mg/m³]	2,299	2,294	2,296
Priemerná teplota pri skúške / Average temperature at test	[°C]		50,0	
Hĺbka deformácie po / Deformation depth after: 5000 cy.	[mm]	1,61	1,59	1,60
Hĺbka deformácie po / Deformation depth after: 10000 cy.	[mm]	1,83	1,74	1,78
Sklon vyjazdenej koľaje /	WTS _{air} [mm]	0,04	0,03	0,04
Pomer hĺbky vyjazdenej koľaje /	PRD _{air} [%]	3,0	2,9	3,0
Hĺbka vyjazdenej koľaje /	RDA _{air} [mm]	1,80	1,70	1,80

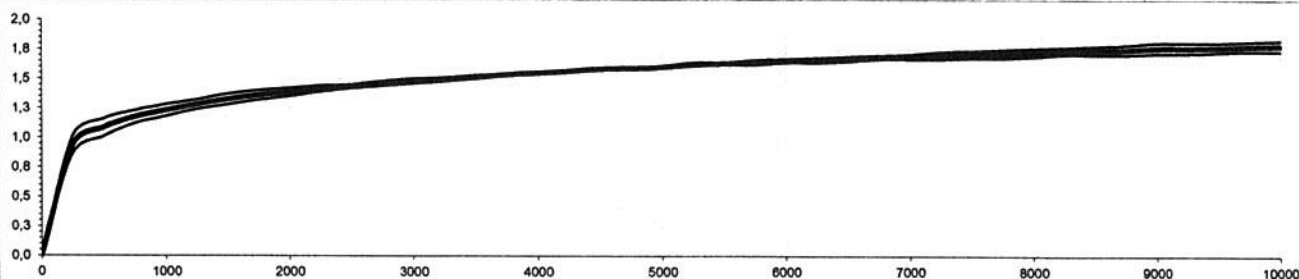

Požiadavka - Requirement:

Maximálne dovolené hodnoty sú podľa deklarovaných hodnôt v PST:

WTS_{air} [mm] 0,07
 PRD_{air} [%] 3,0

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek
 Dátum vystavenia: 16.10.2017
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elena

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5199

Rozbor asfaltovej zmesi / Analysis of asphalt mixture

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
 dohoda

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry-strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: ložná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 rada - STN EN 12697, STN EN 933-1 SP-AZ02,3,4,5,7 vid. výsledky žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: AC 22 L PMB 45/80-75;I;ZH26B Odbor: Mgr.TOKOŠ
 Material name: AC 22 ložn. PMB 45/80-75 Označenie vzorky: 8/2017/CI Nitra
 Druh materiálu: AC 22 ložn. PMB 45/80-75 Markings of sample: 8/2017/CI Nitra
 Material type: AC 22 ložn. PMB 45/80-75 Staničenie: km 0,150
 Miesto odboru: stavba Stationing: km 0,150
 Sampling site: stavba

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5199
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 28.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 02.10.2017
 Test ending (date-time):

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [g]	Prepad / pass s. [%]	Hm.vzorky / Sample weight [g]	Patrola / Filler cup [g]	Patr.+ filer / Filler cup + filler [g]
			1137,30	686,30	757,20
125		100	Čiara zrnitosti / Grading curve 		
90		100			
63		100			
56		100			
45		100			
31,5	0,0	100			
22,4	31,9	97			
16	281,3	71			
11,2	116,1	61			
8	80,3	53			
5,6	89,9	45			
4	77,7	38			
2,8		32			
2	131,0	26			
1	112,0	16			
0,5	51,4	11			
0,25	27,4	8			
0,125	14,2	7			
0,063	3,7	6,7			
dno	73,4	0,0			
Σ	1090,3	100,0			

AZ02-Obsah rozpustného spojiva / Soluble bitumen content:

AZ03-Objemová hmotnosť / Bulk density

AZ03-Maximálna hmotnosť / Maximal density

AZ03-Medzerovitost' (vo vode) / Air voids content (in water)

AZ05-Pomer hĺbka a sklon vyj.koľaje / Proportional depth and strain of tracking

AZ04-Pomer pevnosti v priečnom ťahu / Indirect tensile strength ratio

AZ07-Stekavosť asfaltového spojiva / Binder drainage

AZ03-Perc. medzier v kamenive vypl. asfaltom / Voids filled with binder

	Namerané	Neistota	Deklarované
S [%]	4,1	0,2 %	3,9 + 4,5
ρ_{bsd} [Mg/m ³]	2,410	0,8 %	-
ρ_{mv} [Mg/m ³]	2,523		-
V_m [%]	4,5		3,5 + 7,0
PRDAIR / WTSAIR [% , mm]		0,2 mm	-
ITSR [%]	88,8	1,5 %	min. 70
D [%]	(N)		-
VFB [%]			-

Požiadavka - Requirement:

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ILKOVÁ Katarína

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elená

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 02.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stančenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
29.9.2017	SPB/2017/5308a	SO 120	0,000 - 0,330	Asfaltová vrstva vozovky SMA 11	Nerovnosť povrchu	SMA 11 PMB 45/80-75	celý úsek	pozdižna max. 4mm; priečna max. 4 mm		Vyhovuje
28.9.2017	SPB/2017/5293	SO 120	0,250	Asfaltová vrstva vozovky SMA 11	Rozbor zmesi	SMA 11 PMB 45/80-75	1			Vyhovuje
29.9.2017	SPB/2017/5293a	SO 120	0,250	Asfaltová vrstva vozovky SMA 11	Odolnosť voči trv.deformáciám	SMA 11 PMB 45/80-75	1			Vyhovuje
29.9.2017	SPB/2017/5416	SO 120	0,080 - 0,225	Asfaltová vrstva vozovky SMA 11	troxler	SMA 11 PMB 45/80-75	4	97%	97,1 - 100,1	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/5416

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti vrstiev / Radiometric testing of density of layers

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.

Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 120

Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:

Skúšobný postup:

Rozšírená neistota $U(k=2)$:

Odhylky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...:

Test procedure:

Expand. uncertainty $U(k=2)$:

Deviation from test procedure:

STN 731375:1971

SP-V02

3,0%

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:

Material name: SMA 11 PMB 45/80-75;ZH5C

Druh materiálu:

Material type: SMA 11 PMB 45/80-75

Miesto merania:

Measuring site: stavba

Staničenie:

Stationing: vid'. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

29.09.2017

Test beginning (date-time):

Záznamový lis č.:

Records note nr.: SPB/2017/5416

Teplota:

Temperature: [°C] 18,0

Koniec skúšky (dátum-čas):

29.09.2017

Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie stationing	OH ₁ / BD ₁ [kg/m ³]	OH ₂ / BD ₂ [kg/m ³]	OH ₃ / BD ₃ [kg/m ³]	OH ₄ / BD ₄ [kg/m ³]	OH / BD priemer / average [kg/m ³]	Korelačný koeficient / Correlation factor	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	km 0,225 - L'S	2367	2364	2338	2345	2354	1,0000	2354	100,1
2	km 0,200 - PS	2315	2269	2285	2321	2298	1,0000	2298	97,7
3	km 0,150 - L'S	2266	2296	2265	2306	2283	1,0000	2283	97,1
4	km 0,080 - PS	2321	2285	2341	2308	2314	1,0000	2314	98,4
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Porovnávacia objemová hmotnosť určená v protokole: Comaprison buld density specified in protocol:								2352	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

[%]

97,0

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 04.10.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina STRED - pracovisko Zvolen
 Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
 tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993



SNAS
 Reg. No. 211/S-176


Protokol / Protocol: SZV/2017/3508a
Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 zmluva NS:FBAY

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Priprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)
 Objekt / Building object: SO 120
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva krytu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
 Skúšobný postup: SP-V03
 Rozšírená neistota U(k=2): 11,9%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: SMA 11 PMB 45/80-75;ZH5C
 Materiál name:

Druh materiálu: SMA 11 PMB 45/80-75
 Material type:

Miesto merania: stavba
 Stationing: viď. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SZV/2017/3508
 Records note nr.:

Metóda: 3m lata, planograf
 Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.09.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 29.09.2017
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	-	číslo skúšky 1	číslo skúšky 2		
2	km 0,000	počet nevyhovujúcich	počet nevyhovujúcich		
3	až	hodnôt : 0	hodnôt : 0		
4	km 0,330	graf v prílohe	graf v prílohe		
5					
6					
7	km 0,015			2	3
8	km 0,055			3	3
9	km 0,095			3	3
10	km 0,135			2	2
11	km 0,175			2	2
12	km 0,215			3	3
13	km 0,255			2	2
14	km 0,295			2	3
15	km 0,320			3	3
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] ≤ 4 priečna [mm] ≤ 4

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

SABACKÝ Peter
 Dátum vystavenia: 06.10.2017
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nezhodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2017/5293

Rozbor asfaltovej zmesi / Analysis of asphalt mixture

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
 dohoda

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry-strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:120
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 rada - STN EN 12697, STN EN 933-1 SP-AZ02,3,4,5,7 vid. výsledky žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: SMA 11 PMB 45/80-75;ZH5C Odbor: Kuchár Jaroslav
 Material name: SMA 11 PMB 45/80-75 Odbor (dátum-čas): 28.09.2017 - 09:30
 Druh materiálu: SMA 11 PMB 45/80-75 Označenie vzorky: 9/2017/CI Nitra Sampling (date-time):
 Material type: Miesto odberu: stavba Staničenie: km 0,250 Prevzatie (dátum-čas): 28.09.2017
 Sampling site: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/5293
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 02.10.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 06.10.2017
 Test ending (date-time):

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [g]	[%]	Prepad / pass s. [%]	Hm.vzorky / Sample weight [g]	Patrola / Filler cup [g]	Patr.+ filer / Filler cup + filler [g]
				1206,30	686,30	783,70
125			100	Čiara zrnitosti / Grading curve 		
90			100			
63			100			
56			100			
45			100			
31,5			100			
22,4			100			
16	0,0		100			
11,2	15,3	1,35	99			
8	494,1	43,75	55			
5,6	175,1	15,51	39			
4	87,5	7,75	32			
2,8			28			
2	86,6	7,67	24			
1	69,6	6,16	18			
0,5	48,1	4,26	14			
0,25	28,2	2,50	11			
0,125	16,7	1,48	10			
0,063	8,9	0,79	8,8			
dno	99,2	8,78	0,0			
Σ	1129,3	100,0	-	OCL (STN EN 13108-21) PST - SMA 11 PMB 45/80-75;ZH5C		

AZ02-Obsah rozpustného spojiva / Soluble bitumen content:

S [%] 6,4 0,2 % 6,4 + 7,0

AZ03-Objemová hmotnosť / Bulk density

p_{bsd} [Mg/m³] 2,352 -

AZ03-Maximálna hmotnosť / Maximal density

p_{mv} [Mg/m³] 2,437 0,8 % -

AZ03-Medzerovitost' (vo vode) / Air voids content (in water)

V_m [%] 3,5 2,5 + 4,5

AZ05-Pomer ná hĺbka a sklon vyj.koľaje / Proportional depth and strain of tracking

PRD_{AI} / WTS_{AI} [% , mm] 0,2 mm -

AZ04-Pomer pevnosti v priečnom ťahu / Indirect tensile strength ratio

ITSR [%] 86,0 1,5 % min. 80

AZ07-Stekavosť asfaltového spojiva / Binder drainage

(N) D [%] 0,1 0,3

AZ03-Perc. medzier v kamenive vypl. asfaltom / Voids filled with binder

VFB [%] 80,9 - 74,0 + 86,0

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

ILKOVÁ Katarína

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elena

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 06.10.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Výjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad / nezhodu s požadovanou kvalitou skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/5293d

Odolnosť asfaltovej zmesi proti trvalým deformáciám / Asphalt mixture resistance to permanent deformation

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. (TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.
 dohoda

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 12697-22+A1, O1:2008
 Skúšobný postup: SP-AZ05
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 0,2mm
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne


Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: SMA 11 PMB 45/80-75;ZH5C
 Materiál: SMA 11 PMB 45/80-75
 Druh materiálu: SMA 11 PMB 45/80-75
 Miesto odberu: stavba
 Odbor: KUCHÁR Jaroslav
 Odbor (dátum-čas): 28.09.2017 - 09:30
 Prevládanie (dátum-čas): 28.09.2017
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 05.10.2017
 Test ending (date-time): 13.10.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/5293-1
 Metóda: metóda B (vzdych)

Zloženie zmesi (PST) / Mixture proportion (TT)	[%]	Spôsob výroby zmesi / Mixture fabrication type: vo výrobe na obaľovacej súprave		
		Spôsob hutnenia vzorky / Type of sample compaction: vzorka pripravená segmentovým zhuťovačom podľa STN EN 12697-33		
		Teplota pri výrobe vzoriek / Fabrication temperature:		155,0°C
		Vek vzorky / Sample age:		8 dní
		Spôsob skladovania / Type of holding:		laboratórium
Výsledky skúšok / Tests results		Vzorka / Sample 1	Vzorka / Sample 2	Priemer / Average
Rozdiel zhutnenia vzorky 1 a 2 / Differences of compaction degree of sample 1 and 2	[%]	0,3		
Priemerná hrúbka vzorky / Average sample thickness	[mm]	40,10	40,10	40,10
Objemová hmotnosť vzorky / Bulk density of sample (STN EN 12697-6/D)	[Mg/m³]	2,239	2,245	2,242
Priemerná teplota pri skúške / Average temperature at test	[°C]	50,0		
Hĺbka deformácie po / Deformation depth after: 5000 cy.	[mm]	1,40	1,46	1,43
Hĺbka deformácie po / Deformation depth after: 10000 cy.	[mm]	1,55	1,59	1,57
Sklon vyjazdenej koľaje /	WTS _{AIR} [mm]	0,03	0,03	0,03
Pomer hĺbky vyjazdenej koľaje /	PRD _{AIR} [%]	3,9	4,0	3,9
Hĺbka vyjazdenej koľaje /	RD _{AIR} [mm]	1,60	1,60	1,60

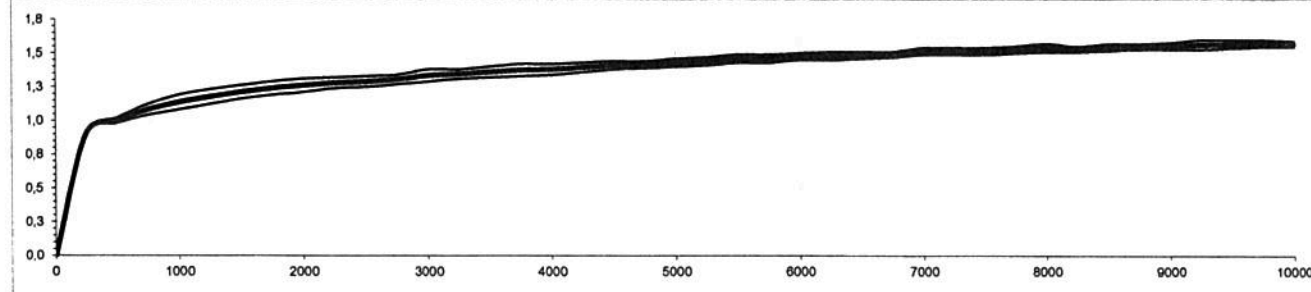

Požiadavka - Requirement:

Maximálne dovolené hodnoty sú podľa deklarovaných hodnôt v PST:

WTS_{air} [mm] 0,1
 PRD_{air} [%] 5,0

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elena

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 13.10.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/Nezhovuje
4.12.2017	SPB/2017/6545	SO 120	0,015	Nestmelená vrstva zo ŠD	rádiometrické meranie objemovej hmotnosti	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	97%	99%	Vyhovuje
5.12.2017	SPB/2017/6520h	SO 120	0,015 chodník	Nestmelená vrstva zo ŠD	rázová zaťažovacia skúška	štrkodrvina fr. 0-63mm	3	Edef min. 55 Mpa	72,4 až 85,5 Mpa	Vyhovuje
5.12.2017	SPB/2017/6580h	SO 120	ostrovček	Nestmelená vrstva zo ŠD	rázová zaťažovacia skúška	UM ŠD 0/31,5 Gc	3	Edef min. 90 Mpa	106,8 až 119,4 Mpa	Vyhovuje
5.12.2017	SPB/2017/6521a	SO 120	chodník	Nestmelená vrstva zo ŠD	zrornosť	štrkodrvina fr. 0-63mm	1			Vyhovuje
4.12.2017	SPB/2017/6544	SO 120	chodník	Nestmelená vrstva zo ŠD	Nerovnosť povrchu	štrkodrvina fr. 0-63mm	1	max. 20mm		Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/6545

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 120 - chodník
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstva od štrkodrviny

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971 - SP-Z07 7,4% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63 Odberal: ŠKORVAGA Peter (N)
 Material name: štrkodrvina 0/63 Sampler:
 Druh materiálu: štrkodrvina fr.:0/63, Pohranice Odber (dátum-čas): 04.12.2017
 Material type: štrkodrvina fr.:0/63, Pohranice Sampling (date-time):
 Miesto merania: stavba Staničenie: vid. nižšie Prevzatie (dátum-čas): 04.12.2017
 Measuring site: stavba Stationing: vid. nižšie Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6545
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 04.12.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 04.12.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	15m od vjazdu So: 120-cesta	1842 3,10	1791 3,00	1768 2,70	1800 2,93	1,00	1800	99,0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		15/2017/PS/ZV					1818	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

97,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 08.12.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/6520h

Rázová zaťažovacia skúška - Shock load test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: Nestmelená vrstva zo štrkodrviny (chodník)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 736133:2010 príloha G; STN 736192:2011
 Norm, regulation, ...: SP-Z09
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 3,0%
 Expand. uncertainty $U(k=2)$:
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne
 Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina Pohranice
 Material name:
 Druh materiálu: štrkodrvina
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: chodník 0,015 km
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6520h
 Records note nr.:

Korelačný súčiniteľ: 1,8
 Correlation factor:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 05.12.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 05.12.2017
 Test ending (date-time):

Miesto merania / place of measurement	Dynamický modul Dynamic module Evd [MPa]	Modul deformácie Deformation module Edef ₂ [MPa]	Priemerný def. modul Average def. module Edef ₂ [MPa]
Miesto č.1	47,5	85,5	78,8
Miesto č.2	40,2	72,4	
Miesto č.3	43,7	78,7	

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

Edef₂ [MPa]
≥ 55

Poznámky - Comments:

Hodnoty Evd boli prepočítané pomocou súčiniteľa 1,8 (pre daný materiál) na hodnotu Edef₂ na základe zápisu v stavebnom denníku.

(N)

Skúšal - Tested by:

Ing. HALAJ Maroš

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 07.12.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2017/6580h****Rázová zaťažovacia skúška - Shock load test****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.

Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 120

Konštrukcia / Construction: nestmelná vrstva z UM (ŠD)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:

Skúšobný postup:

Rozšírená neistota $U(k=2)$:

Odchylky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...:

Test procedure:

Expand. uncertainty $U(k=2)$:

Deviation from test procedure:

STN 736133:2010 príloha G; STN 736192:2011

SP-Z09

3,0%

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:

Material name: štrkodrvina

Druh materiálu:

Material type: Pohranice UM (ŠD) D_{max} 31,5

Miesto merania:

Measuring site: stavba

Staničenie:

Stationing: vid. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

05.12.2017

Test beginning (date-time):

Koniec skúšky (dátum-čas):

05.12.2017

Test ending (date-time):

Záznamový lis č.:

Records note nr.: SPB/2017/6580h

Korelačný súčiniteľ:

Correlation factor:

2

Miesto merania / place of measurement	Dynamický modul Dynamic module E_{vd} [MPa]	Modul deformácie Deformation module E_{def2} [MPa]	Priemerný def. modul Average def. module E_{def2} [MPa]
ostrovček č.1	53,4	106,8	113,3
ostrovček č.2	59,7	119,4	
ostrovček č.3	56,9	113,8	
			113,3

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť je podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

 E_{def2} [MPa]

≥ 90

Poznámky - Comments:Hodnoty E_{vd} boli prepočítané pomocou súčiniteľa 2,0 (pre daný materiál) na hodnotu E_{def2} .

(N)

Skúšaný - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 12.12.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/6521a

Zrntosť kameniva / Mineral grading

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 120

Konštrukcia / Construction: Nestmelená vrstva zo štrkodrviny (chodník)

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:
 Norm, regulation, ...:

STN EN 933-1:2012, 933-1/O1:2013

Skúšobný postup:

Test procedure:

SP-K02

Rozšírená neistota U(k=2):

Expand. uncertainty U(k=2):

3,2%

Odchylky od skúšobného postupu:

Deviation from test procedure:

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: štrkodrvina 0/63 Pohranice

Odobral:

Sampler:

Ing. HALAJ Maroš

Frakcia materiálu:
Material fraction: 0/63

Označenie vzorky:

Markings of sample:

532/2017/MH/K

Odbor (dátum-čas):

Sampling (date-time):

5.12.2017

Miesto odberu:
Sampling site: stavba

Staničenie:

Stationing:

chodník

Prevzatie (dátum-čas):

Entrance (date-time):

Začiatok skúšky (dátum-čas):

Test beginning (date-time):

05.01.2017

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

07.12.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.:

Records note nr.:

SPB/2017/6521a


Metóda:

Method:

mokry rozbor

wet analysis

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [10 ⁻³ kg]	Prepad / pass s. [%]
125		100
90	0,0	100
63	2410,0	95
56		89
45	4815,0	84
31,5	5260,0	72
22,4	3785,0	64
16	3485,0	56
11,2	5980,0	43
8	3375,0	35
5,6	2860,0	29
4	3080,0	22
2,8		19
2	2240,0	17
1	1820,0	13
0,5	1605,0	9
0,25	965,0	7
0,125	485,0	6
0,063	710,0	4,2
0,063P	105,0	
0,063T	1785,0	0,0
Σ	44765,0	100,0

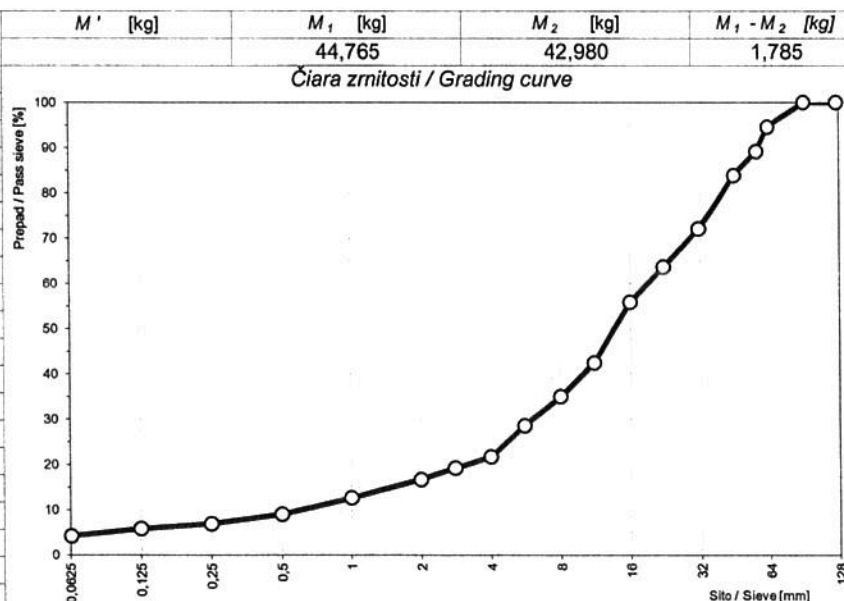**Kategória podľa /Category according to:**

STN EN 13242

Sito / Sieve:	[-]	2D	1,4D	D	D/2	d	d/2	f
	[mm]	125	90	63	31,5	-	-	0,063
Hmot. podiel prepadu / mass ratio pass sieve:	[%]	100	100	95	72	-	-	4,2
Dosiahnuté kategórie / Achieved categories		G _A 85		-		f ₅		

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Ing. HALAJ Maroš

Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOTÁK Juraj

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 07.12.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/6544a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 120 - chodník
 Konštrukcia / Construction: nestmelená vrstev zo štrkodrviny

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
 Skúšobný postup: SP-V03
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 11,9%
 Odklady od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina 0/63
 Material name:
 Druh materiálu: štrkodrvina fr.:0/63, Pohranice
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: I. časť, dĺžka - 15,5m
 Stationing: II. Časť, dĺžka - 37,5m

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6544a
 Records note nr.:
 Metóda: 3m lata
 Method:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 04.12.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 04.12.2017
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral					
Measured evenness:					
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1		I. časť		I. časť	
2	0,007	18		12	
3					
4		II. Časť		II. časť	
5	0,015	14		17	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] ≤ 20
 priečna [mm] ≤ 20

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán


Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 12.12.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

ZDROUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA Dopravár STRABAG										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
20.9.2017	SPB/2017/5103	120	0,200 - 0,280 chodník	hydraulicky stmelená vrstva z CBGM	objemová hmotnosť asf.zmesi	CBGM C5/6		97%	97,3 - 99,2%	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2017/5103

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemin / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
 zmluva

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 120
 Konštrukcia / Construction: Hydraulicky stmelená vrstva z CBGM

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchytky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:

STN 73 6133:2010 príloha E, STN 731375:1971

SP-Z07

7,4%

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: CBGM C5/6

Material name:

Druh materiálu: CBGM C5/6 - CEM III 32,5 N

Material type:

Miesto merania: stavba

Measuring site:

Staničenie:

Stationing:

vid'. nižšie

Odberal:

Sampler:

Mgr. TOKOŠ Marek

Odber (dátum-čas):

Sampling (date-time):

20.09.2017

Prevzatie (dátum-čas):

Entrance (date-time):

20.09.2017

Začiatok skúšky (dátum-čas):

Test beginning (date-time):

20.09.2017

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

20.09.2017

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:

Records note nr.:

SPB/2017/5103

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁ vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	OH ₂ / BD ₂ vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	OH ₃ / BD ₃ vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	OH _{pr} / BD _{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	km 0,280	2176	2166	2176	2173	1,00	2173	99,2
2	km 0,200	2128	2133	2131	2131	1,00	2131	97,3
3		5,88	5,90	5,92	5,90			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole:

Maximal buld density specified in protocol:

SK12/14/065/0906

2190

[kg/m³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek KSP a súvisiacich noriem

97,0 %
(N)

Poznámky - Comments:

Výrobňa: LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemska 13, SK-85007 Bratislava, betonáreň Nitra

Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:

Date of issuance:

21.09.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špeciálnych predpisov.
 Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

F17A-Z07-1-04/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

ZDRAŽENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA
Dopravný STRAŽAG

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Stančenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Material	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
5.12.2017	SPB/2017/6547	SO 120	chodník	Asfaltová vrstva vozovky AC 16 P	rádiometrické meranie objemovej hmotnosti	AC 16 P 50/70; II	1	min 97%	97,2%	Vyhovuje
5.12.2017	SPB/2017/6546a	SO 120	chodník	Asfaltová vrstva vozovky AC 16 P	Nerovnosť povrchu	AC 16 P 50/70; II	celý úsek	pozdižna max. 20mm; pričná max. 12 mm		Vyhovuje



Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2017/6547****Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti vrstiev / Radiometric testing of density of layers****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 120 - chodník
 Konštrukcia / Construction: podkladová vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 731375:1971
 Skúšobný postup: SP-V02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,0%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 16 P 50/70;II;ZH11

Druh materiálu: AC 16 Podklad 50/70
 Materiál type:

Miesto merania: stavba
 Measuring site: Staničenie: 12m od vjazdu na
 Stationing: So:120 - komunikáciu

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2017/6547
 Records note nr.:

Teplota: [°C] 4,0
 Temperature:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 05.12.2017
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 05.12.2017
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie stationing	OH ₁ / BD ₁ [kg/m ³]	OH ₂ / BD ₂ [kg/m ³]	OH ₃ / BD ₃ [kg/m ³]	OH ₄ / BD ₄ [kg/m ³]	OH / BD priemer / average [kg/m ³]	Korelačný koeficient / Correlation factor	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	12m od vjazdu	2393	2424	2417	2388	2406	1,0000	2406	97,2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Porovnávacia objemová hmotnosť určená v protokole: Comaprison buld density specified in protocol:							PST: AC 16 P 50/70;II;ZH11	2475	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

[%]

97,0

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 08.12.2017
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2017/6546a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO: 120 - chodník
 Konštrukcia / Construction: podkladová vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
 Skúšobný postup: SP-V03
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 11,9%
 Odklony od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 16 P 50/70;II;ZH11

Material name:

Druh materiálu: AC 16 Podklad 50/70

Material type:

Miesto merania: stavba

Measuring site:

Staničenie:

Stationing:

I. časť, dĺžka - 15,5m

II. časť, dĺžka - 37,5m

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový list č.: SPB/2017/6546a

Records note nr.:

Metóda:

Method:

3m lata

Začiatok skúšky (dátum-čas):

Test beginning (date-time):

05.12.2017

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

05.12.2017

Meraná rovinatosť:

Measured evenness:

Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral

P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1		I. časť		I. časť	
2	0,01	11,9,14,8,17		8	
3	0,015	4,13			
4		II. časť		II. časť	
5	0,01	12,9,17,11,10			
6	0,02	7,9,13,17,6		11	
7	0,03	14,11,15,9,8			
8	0,037	6,10,8			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm]

priečna [mm]

≤ 20

≤ 12

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 12.12.2017

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-V03-10/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZDRUŽENIE INFRASTRUKTÚRA NITRA
Dopravné inžinierstvo
STRABAG

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
5.12.2017	SPB/20176549	SO 120	chodník	Asfaltová vrstva vozovky AC 8 O	rádiometrické meranie objemovej hmotnosti	AC 8 O 50/70-II	1	min 97%	97,1%	Vyhovuje
7.12.2017	SPB/20176548a	SO 120	chodník	Asfaltová vrstva vozovky AC 8 O	Nerovnosť povrchu	AC 8 O 50/70-II	celý úsek	max. 5mm		Vyhovuje

**Protokol / Protocol: SPB/2017/6549****Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti vrstiev / Radiometric testing of density of layers****Všeobecné údaje - General information**

Zákazka č. / Order nr.

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

objednávka

Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra

Objekt / Building object: SO: 120 - chodník

Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 731375:1971 SP-V02 3,0% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 8 O 50/70;II;ZH1

Material name:

Druh materiálu: AC 8 Obrus 50/70

Material type:

Miesto merania: stavba Staničenie: 15m od vjazdu na So:

Measuring site: Stationing: 120-cesta

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 07.12.2017

Test beginning (date-time):

Koniec skúšky (dátum-čas): 07.12.2017

Test ending (date-time):

Záznamový lis č.: SPB/2017/6549

Records note nr.:

Teplota: [°C] 4,0

Temperature:

P.č. No.	staničenie stationing	OH ₁ / BD ₁ [kg/m³]	OH ₂ / BD ₂ [kg/m³]	OH ₃ / BD ₃ [kg/m³]	OH ₄ / BD ₄ [kg/m³]	OH / BD priemer / average [kg/m³]	Korelačný koeficient / Correlation factor	Výsledná OH Final BD [kg/m³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	15m od vjazdu	2383	2411	2407	2398	2400	1,0000	2400	97,1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Porovnávacia objemová hmotnosť určená v protokole:		PST: AC 8 O 50/70;II;ZH1						2471	[kg/m³]
Comaprison buld density specified in protocol:									

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

[%]

97,0

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia: 08.12.2017

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Protokol / Protocol: SPB/2017/6548a

Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
Objekt / Building object: SO: 120 - chodník
Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:
Material name: AC 8 O 50/70;II;ZH1

Druh materiálu:
Material type: AC 8 Obrus 50/70

Miesto merania: Measuring site: stavba	Staničenie: Stationing: I. časť, dĺžka - 15,5m II. časť, dĺžka - 37,5m
---	--

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.:
Records note nr.: SPB/2017/6548a

Metóda:
Method: 3m lata

Začiatok skúšky (dátum-čas):
Test beginning (date-time): 07.12.2017
Koniec skúšky (dátum-čas):
Test ending (date-time): 07.12.2017

Meraná rovinatosť: Measured evenness:

Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral

P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1		I. časť		I. časť	
2	0,01	4,2,4,1,3		3	
3	0,15	3,4			
4		II. časť		II. časť	
5	0,01	5,4,1,4,3			
6	0,02	4,2,1,1,3		2	
7	0,03	2,4,5,3,1			
8	0,037	3,4,2			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] ≤ 5 priečna [mm] ≤ 5

Poznámky - Comments:

Skúšan - Tested by:

ŠKORVAGA Peter

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 12.12.2017

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

☐ Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
 Centrálny laboratórny denník

ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA										
Dopravný inžinier STRABAG										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
27.10.2017	SPB/2017/6268h	SO 120	km 0,020 - 0,220	Krajnica fr. 0-22mm	LDD	štrkodrvina fr. 0/22mm		Edef2 min. 90 Mpa	98 - 150,2 Mpa	vyhovuje

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

3. VYHODNOTENÉ KSP, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riadietstvo, Dnešná 27, 820 56 Bratislava				Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP				Vyhodnotenie skúšok			
Hodnotený prvok		Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Počet skúšok - vyhovujúcich	Počet skúšok - nevyhovujúcich	Počet skúšok - opravných		
A	B	C	D	F	H	I	J	K	L		
Prípravné práce											
1	Geodetické a vytyčovací práce	1	kpl	vytyčovací protokol protokol o vytyčení IS	pred začatím	1		-	-		
2	Dopravné a inžinierske opatrenia	1	kpl	vizuálne	pred začatím	1		-	-		
3	Zabezpečenie staveniska	1	kpl	vizuálne	priebežne	1		-	-		
Zemné práce											
4	Zlepšenie zeminy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix hr. 500 mm	2 910,0	m3	posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	1	-	-		
				pevnosť hydraulického spojiva	1 x mesačne	1 x mesačne	1	-	-		
				vlhkosť	2x denne	2x denne	2	-	-		
				kalifornský pomer únosnosti CBR	1x za dva dni	1x za dva dni	1	-	-		
				dávkovanie spojiva	1 x denne	zápis v SD	2	-	-		
				únosnosť	1 sk./2000 m2	1	3	-	-		
				miera zhutnenia	1 sk./1000 m3 (1sk./1500 m2)	2	2	-	-		
5	Konštrukcie z homín - prechodové vrstvy so zhutnením (sanácia podlažia) + násyp (mimo aktívnej zóny)	1581 + 126	m3	index okamžitej únosnosti IBI	1x denne	1x denne	1	-	-		
				posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	-	-		
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m3	1	1xSZS / 1xTroxler	-	-		
				zrntosť	1sk/5000 m3	1	1	-	-		
6	Násyp so zhutnením (mimo aktívnej zóny)	135	m3	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	-	-		
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m3	1	2	-	-		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Dnešová 27, 829 56 Bratislava				Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP				Vyhodnotenie skúšok			
Hodnotený prvok		Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Počet skúšok - vyhovujúcich	Počet skúšok - nevyhovujúcich	Počet skúšok - opravných		
A	B	C	D	F	H	I	J	K	L		
				zrmitosť	1sk/5000 m3	1	1	-	-		
7	Aktívna zóna vozovky - úprava pláne so zrútnením v násypoch	1 468	m3	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	-	-		
				miera zrútnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	3	3	-	-		
				rovinatosť priečna	po 100 m	priebežne	celý úsek	-	-		
				rovinatosť pozdĺžna	po 100 m	priebežne	celý úsek	-	-		
				zrmitosť	1sk/5000 m3	1	1	-	-		
8	Úprava pláne so zrútnením v násypoch - pláň pod aktívnou zónou	2 740	m2	celistosť povrchu	priebežne vizuálne		-	-	-		
				posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	-	-		
				miera zrútnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	4	4	-	-		
				zrmitosť	1sk/5000 m3	1	1	-	-		
				celistosť povrchu	priebežne vizuálne		-	-	-		
9	Spevňovanie homín a konštrukcií, opliáštenie, spevnenie geotextiliou a geomrežovinou	6 110	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
Konštrukcia vozovky											
10	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nesímelené, UMŠD fr.0-32 hr. 200 mm	845,59 m3 3595 m2	m3 m2	posúdenie vhodnosti materiálu; vyhlásenie o parametroch	1/ druh	1	1	-	-		
				zrmitosť	1 sk./1000m3	1	1 chodník	-	-		
				vlhkosť zmesi	2 sk/ deň	2	2	-	-		
				miera zrútnenia/únosnosť	1 sk./1500 m2	3	2x troxer / 2x SZS	-	-		
				hrúbka vrstvy, odchýlka od priečného sklonu max. (%) (niveľáciou)	po 100 m	geodetické zameranie	geodetické zameranie	-	-		
				nerovnosť - priečna	po 100 m	po 100 m	celý úsek	-	-		
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	celý úsek	-	-		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56, Bratislava				Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP				Vyhodnotenie skúšok			
Hodnotený prvok		Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Počet skúšok - vyhovujúcich	Počet skúšok - nevyhovujúcich	Počet skúšok - opravných		
A	B	C	D	F	H	I	J	K	L		
11	Spevnenie krajnic štrkodrinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.200 mm	105	m3	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1	-	-		
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m2 (pre nepriame metódy je potrebný trojnásobný počet skúšok)	min. 3	6	-	-		
12	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, CBGM C5/6 hr. 200 mm	3 340	m2	posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	1	-	-		
				zrnitosť kameniva	1 x za týždeň	výrobca	výrobca	-	-		
				pevnosť cementu	1 x mesačne	výrobca	výrobca	-	-		
				pevnosť v tlaku fc7	1 x denne	1	2	-	-		
				pevnosť v tlaku fc28	1 x denne	1	1	-	-		
				miera zhutnenia	1 sk./1 500 m2	2	2	-	-		
				vlhkosť zmesi	2sk/deň	2	2	-	-		
				hrúbka vrstvy, odchýlka od pričného sklonu max. (%) (niveľáciou)	po 100 m	po 100 m	-	-	-		
				nerovnosť - priečna	po 100 m	po 100 m	-	-	-		
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	-	-	-		
13	Infiltračný postrek 0,7 kg/m2	3 375	m2	vyhlásenie o parametroch	1x	1	1	-	-		
14	Spojovací postrek 0,5 kg/m2	6 683	m2	vyhlásenie o parametroch	1x	1	1	-	-		
				vlastností asfaltovej zmesi + VoP	variant asfaltovej zmesi	1	1	-	-		
				zhutňovací pokus	variant asfaltovej zmesi	1	1	-	-		
				vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo sklady vo výrobní AZ)	1sk/2000t	1	-	-	-		
				vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobni AZ)	1sk/600t	1	-	-	-		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Dnešova 27, 826 56 Bratislava  				Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 120 Účelová komunikácia medzi krížovatkou "J" a "L" - KSP				Vyhodnotenie skúšok			
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Počet skúšok - vyhovujúcich	Počet skúšok - nevyhovujúcich	Počet skúšok - opravných		
16	B zmesasfaltový betón modifikovaný AC 22 L; PMB 45/80-75; 1 hr. 70mm	C	D 544t 231,70m 3	F	H	I	J	K	L		
				objemová hmotnosť, medzerovitost'	1 sk./ 500 t	1	1	-	-		
				pomer pevnosti v pričnom ťahu (citlivosť na vodu)	1 sk./ 5000 t	1	1	-	-		
				miera zhutnenia vrstvy na vývrtoch	1 sk./ 2000 m2	2	2	-	-		
				meranie teploty zmesi	1sk/auto			-	-		
				hrúbka vrstvy (vývrt alebo niveľáciou)	1 sk./ 2000 m2	2	2	-	-		
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	celý úsek	-	-		
				nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m	celý úsek	-	-		
				max.pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air	1/3000 t	1	1	-	-		
				max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air	1/3000 t	1	1	-	-		
				geodetické zameranie	každú vrstvu	geodeticky	geodetické zameranie	-	-		
				vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	variant asfaltovej zmesi	1	1	-	-		
				zhutňovací pokus	variant asfaltovej zmesi	1	1	-	-		
				vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo sklady vo výrobní AZ)	1sk/2000t	1	--	-	-		
				vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobni AZ)	1sk/600t	1	-	-	-		
17	Obrusné vrstvy z asfaltových zmesí, asfaltový koberec masťixový modifikovaný SMA 11 O; PMB 45/80-	3 320	3320m2 312t 132 km3	vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/300t	2	-	-	-		
				rozbor asfalt. zmesi	1 sk./ 500 t	2	1	-	-		
				miera zhutnenia vrstvy (resp. vodonepriepustnosť)	1 sk./ 1000 m2	4	4x troxler	-	-		
				objemová hmotnosť, medzerovitost'	1 sk./ 500 t	1	1	-	-		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA DOPRASTAV - STRABAG Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 829 56 Bratislava				Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP				Vyhodnotenie skúšok			
Hodnotený prvok		Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	Počet skúšok - vyhovujúcich	Počet skúšok - nevyhovujúcich	Počet skúšok - opravných		
A	B	C	D	F	H	I	J	K	L		
	75; I, hr. 40 mm			hrúbka vrstvy (niveľáciou)	1 sk./ 2000 m2	1	geodetické zameranie	-	-		
				meranie teploty zmesi	1sk/auto	1	-	-	-		
				stiekavosť	5000t	1	1	-	-		
				min a max. percento medzier v kam. vyplnených asfaltom	500t	1	1	-	-		
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	celý úsek	-	-		
				nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m	celý úsek	-	-		
				max.pomer hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air	1/5000 t	1	1	-	-		
				pomer pevnosti v priečnom ťahu (citlivosť na vodu)	1 sk./ 3000 t	1*	1	-	-		
				max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air	1/5000 t	1	1	-	-		
				geodetické zameranie	každú vrstvu	každú vrstvu	geodetické zameranie	-	-		
18	Chodník AC 16 P 50/70; II	3,60	m3	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
19	Chodník AC 8 O 50/70; II	1,59	m3	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
20	Asfaltová zálievka	88	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
21	Smerový stĺpik + gombíky	42	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
22	Dopravné značky, zvislé	1 + 103	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
23	Dopravné značky, vodorovné striekané a náterové	291	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
24	Obrubníky	173 + 80	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	-	-		
25	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	24 903	m2	miešací protokol, skúšky kľúčivosti, uzŕnavací list, posúdenie vzorky osiva	každá dodávka	1	1	-	-		

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/014

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-02
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu odstránenia humusovej vrstvy zeminy

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 20.4.2017
Prijal za dozora : Ing. Miroslav Spišák	Podpis :  Dátum : 20.4.17

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	schválený */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Ing. Miroslav Spišák	Podpis :  Dátum : 20.4.17

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-02

Pre realizáciu odstránenia humusovej vrstvy zeminy (odhumusovanie)

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Zrduženie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	20.4.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Schválil:	MH Invest, s.r.o.	Ing. Miloslav Spišák	Stavebný dozor	20.4.17	

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/015

Stavba: Príprava strategického parku Nitra

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-03
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu zlepšenia zemín v podloží s použitím hydraulického spojiva

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.

Podpis :  Dátum : 20.4.2017

Prijal za dozora : Ing. Miroslav Spišák

Podpis :  Dátum : 20.4.17

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	schválený */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Ing. Miroslav Spišák

Podpis :  Dátum : 20.4.17



Technologický postup č. TP-03
Úprava zemín v podloží hydraulickým spojivom

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Zrduženie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	20.4.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Schválil:	MH Invest, s.r.o.	Ing. Miloslav Spišák	Stavebný dozor	20.4.17	


Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/019

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-04
Výrobca / spracovateľ	Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu sanačnej vrstvy podložia s použitím geosyntetických materiálov

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 04.05.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 5.5.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 5.5.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - ŠTRABAG

Generálne riaditeľstvo Drieňová 27 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-04

Realizácia sanačnej vrstvy podložia s použitím geosyntetických materiálov

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Zrduženie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitar	27.4.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	27.4.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	27.4.2017	
Schválil:	MH Invest, s.r.o. SBC INVE BA	Ing. Miloslav Spišák Daning Simbela	Stavebný dozor Krol Jar SJ	19.5.2017	


Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/027

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-05
Výrobca / spracovateľ	Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu násypového telesa pozemných komunikácií

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 15.5.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 1.6.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> * / neschválený * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 1.6.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-05

Realizácia násypov a aktívnej zóny (po konštrukčnú plán)

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	6.5.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	24.5.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor		

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/058

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-07
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy
Konštrukcia	Nestmelená podkladová vrstva UM ŠD
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu nestmelenej podkladovej vrstvy UMŠD

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlasenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :	Dátum : 11.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :	Dátum : 28.8.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis : <i>Darina Šimková</i>	Dátum : 31.8.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-07 Pre realizáciu nestmelenej podkladovej vrstvy UMŠD

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	11.7.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	11.7.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor	31.8.2017	

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/059

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-08
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy
Konštrukcia	Stmelená podkladová vrstva CBGM
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu stmelenej podkladovej vrstvy CBGM

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatková skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis : _____	Dátum : 11.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis : <i>D. Šimková</i>	Dátum : 30.8.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> / neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis : <i>D. Šimková</i>	Dátum : 6.9.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava		



Technologický postup č. TP-08
Pre realizáciu stmelenej podkladovej vrstvy CBGM

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	11.7.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	11.7.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor	6.9.2017	



Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/060

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
 Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-09
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy
Konštrukcia	AC vrstvy vozovky
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu AC vrstiev vozovky

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis : 	Dátum : 11.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis : 	Dátum : 30.8.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	PRIPOMIENKA : • OBYRSNÁ A VOŠNÁ JASŤVA VOZOVOK TDR. I. a II. ST. SA KRAJOU NABAZ NA CEÚ ŠITKU • ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ PRI POKUŠENÍ KONTROLNE MERANÍ ZHUTNENIA TADR. I. a II. ST.

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis : 	Dátum : 6.9.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava		



Technologický postup č. TP-09
Pre realizáciu asfaltových vrstiev vozovky

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	11.7.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	11.7.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šímková	Stavebný dozor	6.9.2017	


Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/081

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
 Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup realizácie monolitického odvodňovacieho žľabu
Výrobca / spracovateľ	Doprastav a.s.
Objekt	Všetky objekty pozemných komunikácií
Konstrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu monolitického odvodňovacieho žľabu

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 26.9.2017
Prijal za dozora : Mgr. Ivana Šimková, PhD.	Podpis :  Dátum : 2.10.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Mgr. Ivana Šimková, PhD.	Podpis :  Dátum : 9.10.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	



Technologický postup č. TP-11
Pre realizáciu monolitického žľabu

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky objekty stavby

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	26.9.17	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	26.9.17	
		Ing. Viliam Tóth	Špecialista SO	29.9.17	
Schválil:	SSC IVSC	Mgr. Ivana Šimková, PhD.	Stavebný dozor	9.10.17	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



Kontrolný a skúšobný plán č. 120-KSP-01 časť sanácia podložia, násyp po konštrukčnú pláň, vozovka

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Stavebný objekt: SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkami „J“ a „L“

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Ružinov

Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. Slovenská správa ciest IVSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

dozor:

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	STRABAG s.r.o.	Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár		
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA A NITRA“	Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár		
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA		Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra				SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP	
 		Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok
A	B	C	D	F	H	I	
Prípravné práce							
1	Geodetické a vytyčovací práce	1	kpl	vytyčovací protokol protokol o vytyčení IS	pred začatím	1	
2	Dopravné a inžinierske opatrenia	1	kpl	vizuálne	pred začatím	1	
3	Zabezpečenie staveniska	1	kpl	vizuálne	priebežne	1	
Zemné práce							
4	Zlepšenie zeminy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix hr. 500 mm	2 910,0	m3	posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch pevnosť hydraulického spojiva vlhkosť kalifornský pomer únosnosti CBR dávkovanie spojiva únosnosť miera zhutnenia index okamžitej únosnosti IBI	1/druh 1 x mesačne 2x denne 1x za dva dni 1 x denne 1 sk./2000 m2 1 sk./1000 m3 (1sk./1500 m2) 1x denne	1 1 x mesačne 2x denne 1x za dva dni zápis v SD 1 2 1x denne	
5	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením (sanácia podložia) + násyp (mimo aktívnej zóny)	1581 + 126	m3	posúdenie vhodnosti materiálu miera zhutnenia/únosnosť zrnitosť	každý druh sypaniny 1 sk./2000 m3 1sk/5000 m3	1 1 1	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA							
DOPRASTAV - STRABAG							
General Engineering, Bratislava 27, 820 05 Bratislava							
							
							
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra							
SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP							
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok	
A	B	C	D	F	H	I	
6	Násyp so zhutnením (mimo aktívnej zóny)	135	m3	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m3	1	
				zrntosť	1sk/5000 m3	1	
7	Aktívna zóna vozovky - úprava pláne so zhutnením v násypoch	1 468	m3	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	3	
				rovinatosť priečna	po 100 m	priebežne	
				rovinatosť pozdĺžna	po 100 m	priebežne	
		2 740	m2	zrntosť	1sk/5000 m3	1	
				celistvosť povrchu	priebežne vizuálne		
8	Úprava pláne so zhutnením v násypoch - pláň pod aktívnou zónou	4 225	m2	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	
				miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	4	
				zrntosť	1sk/5000 m3	1	
				celistvosť povrchu	priebežne vizuálne		
9	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	6 110	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	
Konštrukcia vozovky							
				posúdenie vhodnosti materiálu; vyhlásenie o parametroch	1/ druh	1	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo Drienčova 2/ 626 50, Bratislava



**Príprava cestnej infraštruktúry –
strategický park Nitra**
**SO 120 Účelová komunikácia medzi
križovatkou "J" a "L" - KSP**

	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok
A	B	C	D	F	H	I
13	Infiltračný postrek 0,7 kg/m ²	3 375	m ²	vyhlásenie o parametroch	1x	1
14	Spojovací postrek 0,5 kg/m ²	6 683	m ²	vyhlásenie o parametroch	1x	1
				vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	variant asfaltovej zmesi	1
				zhutňovací pokus	variant asfaltovej zmesi	1
				vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	1sk/2000t	1
				vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/600t	1
				vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/300t	1
15	Podkladové vrstvy z asfaltových zmesí asfaltový betón AC 22 P; 35/50; 1 hr. 70mm	3 030	3030m ² 549 t 233,76m ³	rozbor asfalt. zmesi	1 sk./ 1000 t	1
				objemová hmotnosť, medzerovitost'	1 sk./ 1000 t	1
				pomer pevností v priečnom ťahu (citlivosť na vodu)	1 sk./ 5000 t	1
				miera zhutnenia vrstvy na vývrtoch	1 sk./ 2000 m ²	2
				meranie teploty zmesi	1sk/auto	priebežne
				hrúbka vrstvy (vývrt)	1 sk./ 2000 m ²	2
				nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne
				nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m
				max.pomerčná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air	1/3000 t	1
				max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air	1/3000 t	1
				geodetické zameranie	každú vrstvu	každú vrstvu

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA			Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra		
 			SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP		
Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok
A	B	C	F	H	I
17	Obrusné vrstvy z asfaltových zmesí, asfaltový koberec masťový modifikovaný SMA 11 O; PMB 45/80-75; I, hr. 40 mm	3 320	vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	variant asfaltovej zmesi	1
			zhutňovací pokus	variant asfaltovej zmesi	1
			vstupné materiály-kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	1sk/2000t	1
			vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobni AZ)	1sk/600t	1
			vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/300t	2
			rozbór asfalt. zmesi	1 sk./ 500 t	2
			miera zhutnenia vrstvy (resp. vodonepriepustnosť)	1 sk./ 1000 m2	4
			objemová hmotnosť, medzerovitost'	1 sk./ 500 t	1
			hrúbka vrstvy (niveľáciou)	1 sk./ 2000 m2	1
			meranie teploty zmesi stekavost'	1sk/auto 5000t	1
		3320m2 312t 132,8m3	min a max. percento medzier v kam. vyplnených asfaltom	500t	1
			nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne
			nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m
			max.pomerčná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD air	1/5000 t	1
			pomer pevností v priečnom ťahu (citlivosť na vodu)	1 sk./ 3000 t	1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA		Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra		SO 120 Účelová komunikácia medzi križovatkou "J" a "L" - KSP		
DOPRASTAV - STRABAG Generátor tradičtivity Drieňová 27 020 01, Banská		STRABAG				
doprastav						
	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok
A	B	C	D	F	H	I
				max. sklon vyjazdenej koľaje WTS air	1/5000 t	1
				geodetické zameranie	každú vrstvu	každú vrstvu
18	Chodník AC 16 P 50/70; II	3,60	m3	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
19	Chodník AC 8 O 50/70; II	1,59	m3	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
20	Asfaltová zálievka	88	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
21	Smerový stĺpik + gombíky	42	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
22	Dopravné značky, zvislé	1 + 103	ks	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
23	Dopravné značky, vodorovné striekané a náterové	291	m2	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
24	Obrubníky	173 + 80	m	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1
25	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	24 903	m2	miešací protokol, skúšky klíčivosti, uznávací list, posúdenie vzorky osiva	každá dodávka	1
