



TESScontrol, s.r.o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS
Reg. No. 569/S-375

Protokol o skúške

číslo: 241/5/2018/10.32/ZV
denník číslo: 1/5018/10.32/ZV

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTURA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTURA NITRA"
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00 chodník
Staničenie:	km: 0,000 - 0,303 PS LS	Konštrukcia:	UMŠD - podsyp
Názov výrobku:	UMŠD 0/31,5	Poveternostné podmienky:	polojasno 9°C
Výrobca:	Pohranice	Dátum skúšky:	5.4.2018
		Dátum vystavenia:	30.4.2018
Metóda merania:	STN EN 13036-7	Číslo SP:	SP-10.39
Merací prístroj:	3 m lata, kľin	Evidenčná karta meradla:	ZV 1000, ZV 1001

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Pozdĺžna nerovnosť [mm]

Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
									Hodnota	Norma
1	PS	0	31	0,087	0	60	0,177	2	max. 20,0 mm	STN 73 6121
2	0,000	2	32	0,090	2	62	0,180	4		
3	0,003	0	33	0,093	5	63	0,183	7		
4	0,006	1	34	0,096	0	64	0,186	2		
5	0,009	4	35	0,099	1	65	0,189	5		
6	0,012	0	36	0,102	4	66	0,192	3		
7	0,015	2	37	0,105	2	67	0,195	6		
8	0,018	5	38	0,108	5	68	0,198	8		
9	0,021	2	39	0,111	1	69	0,201	6		
10	0,024	3	40	0,114	4	70	0,204	5		
11	0,027	5	41	0,117	2	71	0,207	8		
12	0,030	3	42	0,120	0	72	0,210	6		
13	0,033	10	43	0,123	1	73	0,213	5		
14	0,036	2	44	0,126	2	74	0,216	4		
15	0,039	5	45	0,129	9	75	0,219	7		
16	0,042	3	46	0,132	6	76	0,222	5		
17	0,045	2	47	0,135	5	77	0,225	10		
18	0,048	5	48	0,138	4	78	0,228	2		
19	0,051	4	49	0,141	7	79	0,231	1		
20	0,054	8	50	0,144	5	80	0,234	5		
21	0,057	5	51	0,147	2	81	0,237	4		
22	0,060	4	52	0,150	1	82	0,240	7		
23	0,063	2	53	0,153	10	83	0,243	11		
24	0,066	11	54	0,156	8	84	0,246	5		
25	0,069	4	55	0,159	5	85	0,249	3		
26	0,072	5	56	0,162	4	86	0,252	1		
27	0,075	2	57	0,165	6	87	0,255	4		
28	0,078	1	58	0,168	12	88	0,258	2		
29	0,081	8	59	0,171	8	89	0,261	5		
30	0,084	5	60	0,174	4	90	0,264	2		

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).

Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak		Skúšal	Jozek		Kontroloval a schválil		TESScontrol, s. r. o. Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
						-43-	Odtlačok pečiatky:



TESScontrol, s.r.o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS
Reg. No. 569/S-375

Protokol o skúške

číslo: 242/5/2018/10.32/ZV
denník číslo: 1/5018/10.32/ZV

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00 chodník
Staničenie:	km: 0,000 - 0,303 PS LS	Konštrukcia:	UMŠD - podsyp
Názov výrobku:	UMŠD 0/31,5	Poveternostné podmienky:	polojasno 9°C
Výrobca:	Pohranice	Dátum skúšky:	5.4.2018
		Dátum vystavenia:	30.4.2018
Metóda merania:	STN EN 13036-7	Číslo SP:	SP-10.39
Merací prístroj:	3 m lata, klin	Evidenčná karta meradla:	ZV 1000, ZV 1001

VYSLEDKY SKÚŠOK

Pozdĺžna nerovnosť [mm]

Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
									Hodnota	Norma
1	PS		31	0,045	2	60	0,135	2	max. 20,0 mm	STN 73 6121
2	0,267	1	32	0,048	8	62	0,138	2		
3	0,270	0	33	0,051	6	63	0,141	0		
4	0,273	5	34	0,054	4	64	0,144	4		
5	0,276	2	35	0,057	8	65	0,147	8		
6	0,279	1	36	0,060	5	66	0,150	6		
7	0,282	0	37	0,063	3	67	0,153	4		
8	0,285	4	38	0,066	1	68	0,156	14		
9	0,288	3	39	0,069	4	69	0,159	8		
10	0,291	6	40	0,072	2	70	0,162	6		
11	0,294	3	41	0,075	5	71	0,165	4		
12	0,297	6	42	0,078	0	72	0,168	5		
13	0,300	5	43	0,081	2	73	0,171	4		
14	0,303	1	44	0,084	1	74	0,174	10		
15	LS		45	0,087	8	75	0,177	8		
16	0,000	10	46	0,090	5	76	0,180	6		
17	0,003	5	47	0,093	11	77	0,183	11		
18	0,006	3	48	0,096	5	78	0,186	8		
19	0,009	4	49	0,099	4	79	0,189	2		
20	0,012	8	50	0,102	2	80	0,192	8		
21	0,015	5	51	0,105	1	81	0,195	3		
22	0,018	2	52	0,108	4	82	0,198	4		
23	0,021	1	53	0,111	5	83	0,201	8		
24	0,024	4	54	0,114	8	84	0,204	11		
25	0,027	0	55	0,117	6	85	0,207	8		
26	0,030	2	56	0,120	4	86	0,210	6		
27	0,033	3	57	0,123	5	87	0,213	2		
28	0,036	2	58	0,126	8	88	0,216	4		
29	0,039	1	59	0,129	5	89	0,219	5		
30	0,042	4	60	0,132	2	90	0,222	7		

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).
Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak		Skúšal	Jozek		Kontroloval a schválil
--------	--	--------	-------	--	------------------------

TESScontrol, s. r. o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava



TESScontrol, s.r.o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS
Reg. No. 569/S-375

Protokol o skúške

číslo: 243/5/2018/10.32/ZV
denník číslo: 1/5018/10.32/ZV

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00 chodník
Staničenie:	km: 0,000 - 0,303 PS LS	Konštrukcia:	UMŠD - podsyp
Názov výrobku:	UMŠD 0/31,5	Poveternostné podmienky:	polojasno 9°C
Výrobca:	Pohranice	Dátum skúšky:	5.4.2018
		Dátum vystavenia:	30.4.2018
Metóda merania:	STN EN 13036-7	Číslo SP:	SP-10.39
Merací prístroj:	3 m lata, klin	Evidenčná karta meradla:	ZV 1000, ZV 1001

VÝSLEDKY SKUŠŔOK

Pozdĺžna nerovnosť [mm]

Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
									Hodnota	Norma
1	LS		31			60			max. 20,0 mm	STN 73 6121
2	0,225	2	32			62				
3	0,228	4	33			63				
4	0,231	2	34			64				
5	0,234	4	35			65				
6	0,237	2	36			66				
7	0,240	1	37			67				
8	0,243	0	38			68				
9	0,246	1	39			69				
10	0,249	4	40			70				
11	0,252	2	41			71				
12	0,255	0	42			72				
13	0,258	2	43			73				
14	0,261	5	44			74				
15	0,264	8	45			75				
16	0,267	6	46			76				
17	0,270	5	47			77				
18	0,273	8	48			78				
19	0,276	7	49			79				
20	0,279	4	50			80				
21	0,282	5	51			81				
22	0,285	3	52			82				
23	0,288	5	53			83				
24	0,291	3	54			84				
25	0,294	4	55			85				
26	0,297	5	56			86				
27	0,300	2	57			87				
28	0,303	1	58			88				
29			59			89				
30			60			90				

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).
Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak		Skúšal	Jozek		Kontroloval a schválil
--------	--	--------	-------	--	------------------------

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen



TESScontrol, s.r.o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen



SNAS
Reg. No. 569/S-375

Protokol o skúške

číslo: 244/5/2018/10.32/ZV
denník číslo: 1/5018/10.32/ZV

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTURA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTURA NITRA"
Stavba:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00 chodník
Staničenie:	km: 0,000 - 0,303 PS LS	Konštrukcia:	UMŠD - podsyp
Názov výrobku:	UMŠD 0/31,5	Poveternostné podmienky:	polojasno 9°C
Výrobca:	Pohranice	Dátum skúšky:	5.4.2018
		Dátum vystavenia:	30.4.2018
Metóda merania:	STN EN 13036-7	Číslo SP:	SP-10.39
Merací prístroj:	3 m lata, klin	Evidenčná karta meradla:	ZV 1000, ZV 1001

VÝSLEDKY SKUŠOK

Priečna nerovnosť [mm]

Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
									Hodnota	Norma
1	LS		31			60			max. 20,0 mm	STN 73 6121
2	0,020	5	32			62				
3	0,050	2	33			63				
4	0,080	4	34			64				
5	0,110	2	35			65				
6	0,140	1	36			66				
7	0,170	4	37			67				
8	0,200	2	38			68				
9	0,230	0	39			69				
10	0,260	1	40			70				
11	0,290	4	41			71				
12	PS		42			72				
13	0,280	6	43			73				
14	0,250	4	44			74				
15	0,220	2	45			75				
16	0,190	0	46			76				
17	0,160	1	47			77				
18	0,130	5	48			78				
19	0,100	8	49			79				
20	0,070	5	50			80				
21	0,040	11	51			81				
22	0,010	4	52			82				
23			53			83				
24			54			84				
25			55			85				
26			56			86				
27			57			87				
28			58			88				
29			59			89				
30			60			90				

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).
Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak		Skúšal	Jozek		Kontroloval a schválil	TESScontrol, s. r. o. Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava Odtlačok pečiatky:
--------	--	--------	-------	--	------------------------	---

Protokol o skúške / Protocol about the test

číslo / number: 81/5/2017/2.7/ZV
Denník č. / Number of diary: 5/2017/2.7/ZV
číslo / number PNI:

MIERA ZHUTNENIA ZEMÍN, SYPANÍN A PODKLADNÝCH VRSTIEV VOZOVKY DEGREE OF COMPACTION

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Objekt/Object: SO 123-00
Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE	Konštrukcia/Construction: nestmelená podkladná vrstva - podsyp
Stavba/Buiding: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Počet meraní: 7
Staničenie/Stationing: km: 0,000 - 0,303	
Skúšaný materiál/Tested material: UMŠD 0/31,5	Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 8°C
Z lokality/ From quarry locality: Pohranice	Dátum skúšky/ Test date: 6.11.2017
Max. objemová hmotnosť $\rho_{d,max}$ [kg.m ⁻³]: 2110	Dátum vystavenia / Date of issuance: 30.11.2017
Optimálna vlhkosť w_{opt} [%]: 4,0	
Normy / Norms: STN 73 1375 Radiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti a súv.	Číslo SP/Number of TP: SP-2.7
Merací prístroj/Measuring instrument: Radiálny hutnomer TROXLER	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 22

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

číslo m number	Miesto a staničenia / point and stationing	Objemová hmotnosť/Bulk density [kg/m3]		Vlhkosť/ Danmpress	Miera zhutnenia/ measured value
		vlhká/dampy	suchá/dry		
		pw	pd	w [%]	D [%]
1	km 0,025 LS priemer z troch meraní	2183	2097	4,1	99,4
		2223	2137	4,0	101,3
		229	222	3,5	10,5
		1545	1485	3,9	70,4
2	km 0,075 PS priemer z troch meraní	2212	2127	4,0	100,8
		2225	2144	3,8	101,6
		2219	2135	3,9	101,2
		2219	2135	3,9	101,2
3	km 0,125 OS priemer z troch meraní	2201	2110	4,3	100,0
		2189	2091	4,7	99,1
		2236	2137	4,6	101,3
		2209	2113	4,5	100,1
4	km 0,200 LS priemer z troch meraní	2194	2102	4,4	99,6
		2193	2087	5,1	98,9
		2198	2095	4,9	99,3
		2195	2095	4,8	99,3
5	km 0,250 PS priemer z troch meraní	2227	2125	4,8	100,7
		2220	2114	5,0	100,2
		2244	2140	4,9	101,4
		2230	2126	4,9	100,8
6	km 0,275 LS priemer z troch meraní	2238	2140	4,6	101,4
		2190	2106	4,0	99,8
		2207	2121	4,1	100,5
		2212	2122	4,2	100,6
7	km 0,280 PS priemer z troch meraní	2229	2140	4,2	101,4
		2202	2102	4,8	99,6
		2174	2083	4,4	98,7
		2202	2108	4,5	99,9

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6126

Požadovaná hodnota - Required value

D [%] = min 97 %

Dosiahnutá Ø D [%]

96,0

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN 73 6124 / Controlled bed conforms to the requirements STN 73 6124

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný

len vtedy, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they

aren't substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Zošíak

Skúša/ Tested by

Gerek

Kontroloval/Controlled by

Doprastav

Doprastav a.s.
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
0994 600 000

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo : 4711/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo : 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI :

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																				
Stavba/Building:	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	123-00																																				
Staničenie/Stationing:	km: 0,025 OS (0,000 - 0,303)	Konštrukcia/Construction:	nestmelená podkladná vrstva - podsyp																																				
Skušany material/Tested material:	UMŠD 0/31,5	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 8°C																																				
Lokalita/Localita:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	6.11.2017																																				
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.11.2017																																				
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	26,9																																				
Metóda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																				
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																				
	odchylkomer		ZV 2121																																				
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odľahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,14</td> <td>0,33</td> <td>0,79</td> <td>1,24</td> <td>0,99</td> <td>0,87</td> <td>0,58</td> <td>0,70</td> <td>0,81</td> <td>1,03</td> <td>0,64</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odľahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,14	0,33	0,79	1,24	0,99	0,87	0,58	0,70	0,81	1,03	0,64		
I.					odľahčenie - unloading		II.																																
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																												
0	0,14	0,33	0,79	1,24	0,99	0,87	0,58	0,70	0,81	1,03	0,64																												
$h_1 = 0,46$ $0,5$ $E_{def1} = 58,48$ MPa		$h_2 = 0,22$ mm $E_{def2} = 122,27$ MPa $E_{def2} / E_{def1} = 2,09$																																					
Napätie / Tension (kPa)																																							
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : E_{def2} (Mpa) ≥ 120 Mpa $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,2$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																							
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.																																							
Zošiak Skúšan/Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	Doprastav Ošľach pečiatky Doprastav, a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -																																					

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 472/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	123-00
Staničenie/Stationing:	km: 0,150 LS (0,000 - 0,303)	Konštrukcia/Construction:	nestmelená podkladná vrstva - podsyp
Skúšaný materiál/Tested material:	UMŠD 0/31,5	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 8°C
Lokalita/Localita:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	6.11.2017
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.11.2017
		Doporučené hodnoty/Recommended value k =	26,9

Metoda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž.súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191
	odchylkomer		ZV 2121

Údaje o skúške - Information about the test :

Zaťažovací cyklus - Load cycle

I.					odfahčenie - unloading		II.				
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0
0	0,21	0,44	0,87	1,30	1,13	0,98	0,70	0,81	0,91	1,11	0,75


$$h_1 = 0,43 \quad 0,5$$

$$h_2 = 0,2 \text{ mm}$$

$$E_{\text{def1}} = 62,56 \text{ MPa}$$

$$E_{\text{def2}} = 134,50 \text{ MPa}$$

$$E_{\text{def2}} / E_{\text{def1}} = 2,15$$

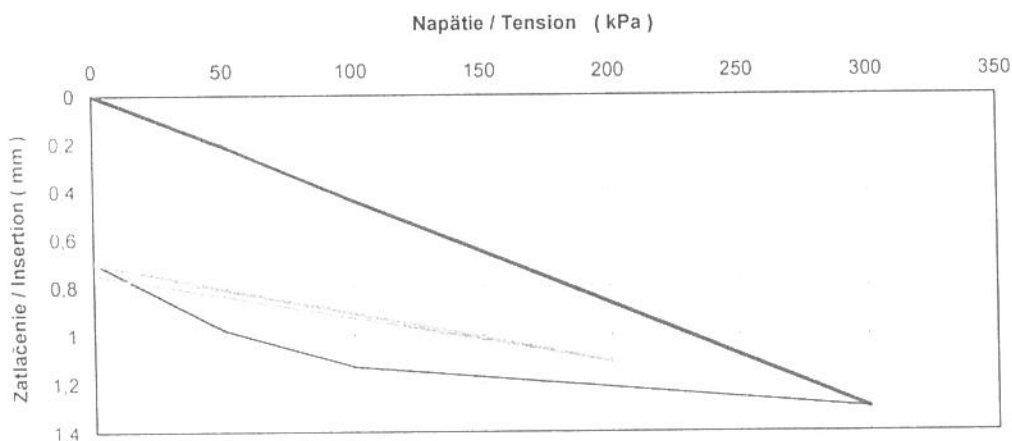

Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP.

Požadované hodnoty /Required value : $E_{\text{def2}} \text{ (Mpa)} \geq 120 \text{ Mpa}$

$$E_{\text{def2}} / E_{\text{def1}} \leq 2,2$$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšky sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak

Skúšan/ Tested by

Gerek

Kontroloval / controlled by

Doprastav

Otlačok pečiatky

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo: 473/5/2017/2.2/ZV
 denník číslo: 5/2017/2.2/ZV
 číslo / number PNI:

STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA / STATIC LOAD TEST

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTR. NITRA"																																																			
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	123-00																																																			
Staničenie/Stationing:	km: 0,280 PS (0,000 - 0,303)	Konštrukcia/Construction:	nestmelená podkladná vrstva - podsyp																																																			
Skušany materiál/Tested material:	UMŠD 0/31,5	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 4°C																																																			
Lokalita/Localita:	Pohranice	Dátum skúšky/ Test date:	7.11.2017																																																			
Poissonove číslo/Poisson No:	$\nu = 0,20$	Dátum vystavenia / date of issuance:	30.11.2017																																																			
		Doporučené hodnoty/Recommended value $k =$	26,9																																																			
Metoda merania/Test method:	STN 73 6190	Číslo SP/Number of TP:	SP-2.2																																																			
Merací prístroj/Measuring instrument:	statická zaťaž súpr. Fochler ECI Ø 357 mm	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV 2191																																																			
	odchylkomer		ZV 2121																																																			
Údaje o skúške - Information about the test :		Zaťažovací cyklus - Load cycle																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">I.</th> <th colspan="2">odfahčenie - unloading</th> <th colspan="5">II.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0,13</td> <td>0,33</td> <td>0,72</td> <td>1,14</td> <td>1,00</td> <td>0,90</td> <td>0,67</td> <td>0,75</td> <td>0,85</td> <td>1,04</td> <td>0,71</td> </tr> </tbody> </table>		I.					odfahčenie - unloading		II.					0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0	0	0,13	0,33	0,72	1,14	1,00	0,90	0,67	0,75	0,85	1,04	0,71	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>$h_1 =$</td> <td>0,39</td> <td>0,5</td> <td>$h_2 =$</td> <td>0,19 mm</td> </tr> <tr> <td>$E_{def1} =$</td> <td>68,97 MPa</td> <td></td> <td>$E_{def2} =$</td> <td>141,58 MPa</td> </tr> <tr> <td colspan="5">$E_{def2} / E_{def1} = 2,05$</td> </tr> </tbody> </table>		$h_1 =$	0,39	0,5	$h_2 =$	0,19 mm	$E_{def1} =$	68,97 MPa		$E_{def2} =$	141,58 MPa	$E_{def2} / E_{def1} = 2,05$				
I.					odfahčenie - unloading		II.																																															
0	50	100	200	300	100	50	0	50	100	200	0																																											
0	0,13	0,33	0,72	1,14	1,00	0,90	0,67	0,75	0,85	1,04	0,71																																											
$h_1 =$	0,39	0,5	$h_2 =$	0,19 mm																																																		
$E_{def1} =$	68,97 MPa		$E_{def2} =$	141,58 MPa																																																		
$E_{def2} / E_{def1} = 2,05$																																																						
Napätie / Tension (kPa) Zatlačenie / Insertion (mm)																																																						
Vyhodnotenie/Evaluation: Požiadavka podľa TKP. Požadované hodnoty /Required value : $E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 120 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \leq 2,2$ Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám TKP..																																																						
Prehlásenie/Resolution: Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory																																																						
Zošiak Skušal/ Tested by				Gerek Kontroloval / controlled by				Doprastav Otlačok pečiatky Doprastav a.s.																																														



TESScontrol, s.r.o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen



Protokol o skúške

číslo: 46/5//2018/2.8/ZV
denník číslo: 5/2018/2.8/ZV

ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA DYNAMICKOU DOSKOU

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00
Staničenie:	km: 0,000 - 0,303	Konštrukcia:	nestmelená podkladná vrstva - podsyp (chodník)
Skúšaný materiál:	ŠD	Poveternostné podmienky:	polojasno 9°C
Z lokality:	Pohranice	Dátum skúšky:	5.4.2018
Frakcia:	0/31,5	Dátum vystavenia:	30.4.2018
Metóda merania:	STN 73 6192	Číslo SP:	SP-2.8
Merací prístroj:	Ľahká dynamická doska	Evidenčná karta meradla:	ZV 1010

Technické údaje - metóda merania :

kalibrácia dynamickej dosky podľa statickej zaťažovacej skúšky na základe STN 73 6133

korelácia pre daný typ sypaniny - prepočítavci vzťah $E_{def} = E_{vd} \cdot 2,2$

Prepočítavací koeficient bol stanovený na základe statickej zaťažovacej skúšky zo dňa 7.3.2018 č. 151/5/2018/2.2/ZV

VÝSLEDKY SKÚŠOK

číslo skúšky-dátum	miesto merania	dynamický modul deformácie E_{vd} (MPa)	modul deformácie E_{def} (MPa)	vyhodnotenie
5.4.2018	km: 0,025 ĽS	49,6	109,1	vyhovuje
	km: 0,100 ĽS	52,2	114,8	vyhovuje
	km: 0,150 ĽS	44,7	98,3	vyhovuje
	km: 0,250 ĽS	62,3	137,1	vyhovuje
	km: 0,250 PS	55,8	122,8	vyhovuje
	km: 0,175 PS	61,3	134,9	vyhovuje
	km: 0,100 PS	65,1	143,2	vyhovuje
	km: 0,050 PS	58,2	128,0	vyhovuje

Vyhodnotenie:

Požadované hodnoty :

$$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70,0$$

$$E_{vd} \text{ (Mpa)} \geq 31,8$$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám PD.

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).

Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak Skúšal	Gerek Kontroloval a schválil	 TESScontrol, s. r. o. Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava -43- Odtlačok pečiatky:
----------------------	-------------------------------------	---

Protokol o skúške - Certificate of test

číslo/number 280/1/2017/4.4/ZV

denník č./number of diary 1/2017/4.4/ZV


STANOVENIE ZRNITOSTI. SÍTOVÝ ROZBOR / SIEVING METHOD

Objednávateľ/Client:	Združenie Infraštruktúra Nitra	Odberateľ/Customer:	Združenie
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštr. strategický park Nitra	Objekt/Object:	SO 123-00
Staničenie:	skládka - trasa	Konštrukcia/Construction:	nestmelená podkladná vrstva
Názov výr./Product Name:	UMSD STN EN 13285- 0/31,5- Gc-OC ₉₀ -UF ₅ -LF ₂	Dátum odberu/Date of sampling:	7.11.2017
Výrobca:	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zl.Moravce	Dátum skúšky/test date:	22.11.2017
Lokalita/Locality:	lom Pohranice	Dátum vystavenia/Date reported:	30.11.2017
Odobral/Sampler:	zákazník	Odborný listok/Markings of sample:	256/2017/K/ZV 115/2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 933-1 + A1	Odchýlky od skúšobného postupu/Deviation from test procedure:	žiadne
Číslo SP/Number of TP:	SP- 4.4	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	ZV1132-ZV1149
Merací prístroj/Measuring instrument:	sada sit		ZV 1008
	váha		

VÝSLEDKY SKÚŠOK / RESULT OF TESTS

veľkosť sít/sieve size of sieve (mm) základný súbor - subor 1	hmotnosť zostatku/weight of residue (kg)	podiel zostatkov/ part of residues Mx (%)	celkový podiel prepadov-totál part of passings (%)
200	0,000	0,0	100,0
125	0,000	0,0	100,0
90	0,000	0,0	100,0
2D	63	0,000	100,0
1/4D	45	0,000	100,0
D	31,5	0,357	98,8
	22,4	5,217	81
D/2	16	4,836	65
	11,2	2,776	55
	8	2,654	46
	5,6	2,731	37
	4	2,056	30
	2	1,867	23
	1	1,644	18
	0,5	1,609	12
	0,25	1,318	8
	0,125	0,907	5
	0,063	0,421	3,3
Dno	0,0010	0,015	0,0
Hmotnosť vz. M2	28,408	96,7	
pod síťom 0,063	0,962	3,3	
hmotn. vz. M1	29,370	100,0	
Hmotnosť vz. M2	28,409		

Čiara zrnitosti

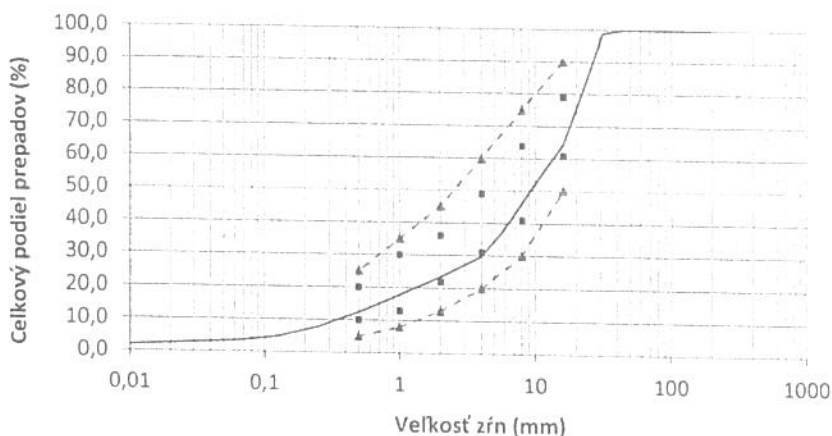

Podiel jemných zrn pod síťom < 0,063 mm	f = 3,3 %
Platnosť výsledkov.	0,0 < 1 %

STN 72 1001	číslo nerovnozrnatosti	Cu = 36,30
STN 72 1001	číslo krivosti krivky	Cc = 3,13

Katégorie podľa / Category according to:	deklarované	STN EN 13285
Síť [-]		2D 1,4D D D/2 d f
Frakcia kameniva [mm]	0/31,5	63 45 31,5 16 - 0,063
Hmot. podiel prepadu:	100	100 98,8 65 - 3,3
Odchýlky typickej triedy zrnitosti	G _c	G _c
Optimálna vlhkosť	3,50%	nestanovené
Trieda zrnitosti	OC ₉₀	OC ₉₀
maximálny obsah jemných častíc	f ₅	UF ₅
minimálny obsah jemných častíc	f ₂	LF ₂
		f = 3,3 %

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovatelný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Hrončiaková
Skúšan/Tested by:

Szúdor
Kontroloval/Controlled by:

Odtlačok pečiatky/Copy stamp

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY PARKU NITRA OPERAČNÝ PROGRAM										
DOPLNOK										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TRP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
11.11.2017	83/5/2017/2.7/ZV	123	0,00 - 0,290	stmelená vrstva	troxler	CBGM	7	min. 97%	98,7 - 101,2%	Vyhovuje
11.11.2017	64/5/2017/10.32/ZV	123	úsek	stmelená vrstva	rovinatosť	CBGM	úsek	max 15mm	0 - 12mm	Vyhovuje
11.11.2017	65/5/2017/10.32/ZV	123	úsek	stmelená vrstva	rovinatosť	CBGM	úsek	max 15mm	0 - 12mm	Vyhovuje
7.11.2017	88/1/2017/3.6/ZV	123	úsek	stmelená vrstva	pevnosť po 28 dňoch	CBGM	1	6 - 10 Mpa	7,7 Mpa	Vyhovuje
9.11.2017	89/1/2017/3.6/ZV	123	úsek	stmelená vrstva	pevnosť po 28 dňoch	CBGM	1	6 - 10 Mpa	7,2 Mpa	Vyhovuje

MIERA ZHUTNENIA ZEMÍN, SYPANÍN A PODKLADNÝCH VRSTIEV VOZOVKY DEGREE OF COMPACTION

Objednávateľ/Client: ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Objekt/Object: SO 123-00
Odberateľ/Customer: ZDRUŽENIE	Konštrukcia/Construction: hydr.stmelená podkladná vrstva vozovky
Stavba/Buiding: Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Počet meraní: 7
Staničenie/Stationing: km: 0,000 - 0,303 PS LS	
Skúšaný materiál/Tested material: CBGM C5/6	Povet. podm./Atm. Conditions: polojasno 5°C
Z lokality/From quarry locality: ALAS	Dátum skúšky/ Test date: 11.11.2017
Max. objemová hmotnosť $\rho_{d\max}$ [kg.m ³]: 2208	Dátum vystavenia / Date of issuance: 30.11.2017
Optimálna vlhkosť w_{opt} [%]: 5,9	
Normy / Norms: STN 73 1375 Radiometrické skúšanie objemovej hmotnosti a vlhkosti a súv.	Číslo SP/Number of TP: SP-2.7
Merací prístroj/Measuring instrument: Radiálny hutnomer TROXLER	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZV 22

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

číslo m. number	Miesto a staničenie / point and stationing	Objemová hmotnosť/Bulk density [kg/m ³]		Vlhkosť/ Danmpness w [%]	Miera zhutnenia/ measured value D [%]
		vlhká/dampy pw	suchá/dry pd		
1	km 0,015 PS priemer z troch meraní	2343	2217	5,7	100,4
		2331	2199	6,0	99,6
		2375	2237	6,2	101,3
		2350	2218	6,0	100,4
2	km 0,050 LS priemer z troch meraní	2312	2182	6,0	98,8
		2301	2173	5,9	98,4
		2304	2186	5,4	99,0
		2306	2180	5,8	98,7
3	km 0,100 OS priemer z troch meraní	2343	2212	5,9	100,2
		2359	2226	6,0	100,8
		2324	2188	6,2	99,1
		2342	2209	6,0	100,0
4	km 0,150 LS priemer z troch meraní	2334	2219	5,2	100,5
		2364	2234	5,8	101,2
		2359	2223	6,1	100,7
		2353	2226	5,7	100,8
5	km 0,175 PS priemer z troch meraní	2311	2190	5,5	99,2
		2325	2199	5,7	99,6
		2319	2188	6,0	99,1
		2318	2193	5,7	99,3
6	km 0,250 OS priemer z troch meraní	2360	2232	5,7	101,1
		2364	2230	6,0	101,0
		2373	2243	5,8	101,6
		2366	2235	5,8	101,2
7	km 0,290 LS priemer z troch meraní	2323	2204	5,4	99,8
		2332	2219	5,1	100,5
		2336	2208	5,8	100,0
		2330	2210	5,4	100,1

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6124 (tab. č.15)

Požadovaná hodnota - Required value

D [%] = min 97 %

Dosiahnutá Ø D [%]

100,1

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN 73 6124 / Controlled bed conforms to the requirements STN 73 6124

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný

len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória / Results from the test are in accordance with the test and they

can be substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak

Gerek

Doprastav a.s.
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
otlačok pečiatky

Kontroloval/Controlled by

Protokol o skúške / Protocol about the test

MERANIE NEROVNOSTI VRSTIEV VOZOVKY LATOU / IRREGULARITY MEASUREMENT OF PAVEMENT COURSES

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	123-00
Staničenie/Stationing:	km 0,000 - 0,303	Konštrukcia/Construction:	hydr.stmelená podkladná vrstva vozovky
Názov výrobku/Product name:	CBGM C5/6	Povet. podm./Atm. Conditions:	poločasno 5 °C
Výrobca/Manufacturer:	ALAS	Dátum skúšky/ Test date:	11.11.2017
		Dátum skúšky/ Test date:	30.11.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13036-7	Číslo SP/Number of TP:	SP-10.32
Merací prístroj/Measuring instrument:	merací klin, lata 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	M 2208

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Pozdĺžna / priečna nerovnosť - Longitudinal / cross irregularity [mm]

Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)	Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)	Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)
1.	pozdižne	0,0000	12	30.	pozdižne	0,0870	2	59.	pozdižne	0,1740	10
2.	pozdižne	0,0030	8	31.	pozdižne	0,0900	8	60.	pozdižne	0,1770	5
3.	pozdižne	0,0060	6	32.	pozdižne	0,0930	5	61.	pozdižne	0,1800	6
4.	pozdižne	0,0090	8	33.	pozdižne	0,0960	2	62.	pozdižne	0,1830	5
5.	pozdižne	0,0120	5	34.	pozdižne	0,0990	4	63.	pozdižne	0,1860	5
6.	pozdižne	0,0150	7	35.	pozdižne	0,1020	2	64.	pozdižne	0,1890	4
7.	pozdižne	0,0180	4	36.	pozdižne	0,1050	5	65.	pozdižne	0,1920	5
8.	pozdižne	0,0210	5	37.	pozdižne	0,1080	6	66.	pozdižne	0,1950	4
9.	pozdižne	0,0240	8	38.	pozdižne	0,1110	8	67.	pozdižne	0,1980	5
10.	pozdižne	0,0270	10	39.	pozdižne	0,1140	10	68.	pozdižne	0,2010	6
11.	pozdižne	0,0300	5	40.	pozdižne	0,1170	5	69.	pozdižne	0,2040	8
12.	pozdižne	0,0330	6	41.	pozdižne	0,1200	2	70.	pozdižne	0,2070	5
13.	pozdižne	0,0360	9	42.	pozdižne	0,1230	5	71.	pozdižne	0,2100	1
14.	pozdižne	0,0390	5	43.	pozdižne	0,1260	7	72.	pozdižne	0,2130	11
15.	pozdižne	0,0420	4	44.	pozdižne	0,1290	5	73.	pozdižne	0,2160	8
16.	pozdižne	0,0450	11	45.	pozdižne	0,1320	8	74.	pozdižne	0,2190	5
17.	pozdižne	0,0480	8	46.	pozdižne	0,1350	9	75.	pozdižne	0,2220	8
18.	pozdižne	0,0510	6	47.	pozdižne	0,1380	10	76.	pozdižne	0,2250	12
19.	pozdižne	0,0540	9	48.	pozdižne	0,1410	5	77.	pozdižne	0,2280	5
20.	pozdižne	0,0570	13	49.	pozdižne	0,1440	7	78.	pozdižne	0,2310	7
21.	pozdižne	0,0600	8	50.	pozdižne	0,1470	5	79.	pozdižne	0,2340	5
22.	pozdižne	0,0630	6	51.	pozdižne	0,1500	5	80.	pozdižne	0,2370	4
23.	pozdižne	0,0660	4	52.	pozdižne	0,1530	5	81.	pozdižne	0,2400	1
24.	pozdižne	0,0690	5	53.	pozdižne	0,1560	11	82.	pozdižne	0,2430	2
25.	pozdižne	0,0720	5	54.	pozdižne	0,1590	8	83.	pozdižne	0,2460	10
26.	pozdižne	0,0750	6	55.	pozdižne	0,1620	5	84.	pozdižne	0,2490	5
27.	pozdižne	0,0780	8	56.	pozdižne	0,1650	12	85.	pozdižne	0,2520	8
28.	pozdižne	0,0810	10	57.	pozdižne	0,1680	8	86.	pozdižne	0,2550	9
29.	pozdižne	0,0840	7	58.	pozdižne	0,1710	4	87.	pozdižne	0,2580	7

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.

Požadovaná hodnota - Required value max. 15 mm pozdižna max. 15 mm priečna

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN. Controlled bed conforme to the requirements STN.

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak Skúšal/Tested by	Gerek Kontroloval / controlled by	 odňačok pečať TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava - 0994 -
--------------------------------	--	---



Doprastav, a.s., Technický a skúšobný servis
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen
Hronska 1, 960 93 Zvolen



číslo / number: 65/5/2017/10.32/ZV

Denník č. / Number of diary: 5/2017/10.32/ZV

číslo / number PNI:

Protokol o skúške / Protocol about the test

MERANIE NEROVNOSTI VRSTIEV VOZOVKY LATOU / IRREGULARITY MEASUREMENT OF PAVEMENT COURSES

Objednávateľ/Client:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ/Customer:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba/Buiding	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt/Object:	123-00
Staničenie/Stationing	km 0,000 - 0,303	Konštrukcia/Construction:	hydr.stmelená podkladná vrstva vozovky
Názov výrobku/Product name:	CBGM C5/6	Povet. podm./Atm. Conditions:	polojasno 5 °C
Výrobca/Manufacturer:	ALAS	Dátum skúšky/ Test date:	11.11.2017
		Dátum skúšky/ Test date:	30.11.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13036-7	Číslo SP/Number of TP:	SP-10.32
Merací prístroj/Measuring instrument:	merací klin, lata 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	M 2208

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Pozdĺžna / priečna nerovnosť - Longitudinal / cross irregularity [mm]

Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)	Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)	Číslo number	Miesto point	staničenie stationing	hodnota(value)
1.	pozdlžne	0,2610	6	30.				59.			
2.	pozdlžne	0,2640	2	31.				60.			
3.	pozdlžne	0,2670	5	32.				61.			
4.	pozdlžne	0,2700	7	33.				62.			
5.	pozdlžne	0,2730	5	34.				63.			
6.	pozdlžne	0,2760	8	35.				64.			
7.	pozdlžne	0,2790	5	36.				65.			
8.	pozdlžne	0,2820	11	37.				66.			
9.	pozdlžne	0,2850	5	38.				67.			
10.	pozdlžne	0,2880	4	39.				68.			
11.	pozdlžne	0,2910	7	40.				69.			
12.	pozdlžne	0,2940	11	41.				70.			
13.	pozdlžne	0,2970	5	42.				71.			
14.	pozdlžne	0,3000	12	43.				72.			
15.	pozdlžne	0,3030	4	44.				73.			
16.	priečne	0,2900	1	45.				74.			
17.	priečne	0,2500	5	46.				75.			
18.	priečne	0,2100	9	47.				76.			
19.	priečne	0,1700	10	48.				77.			
20.	priečne	0,1300	5	49.				78.			
21.	priečne	0,0900	8	50.				79.			
22.	priečne	0,0500	3	51.				80.			
23.	priečne	0,0100	5	52.				81.			
24.				53.				82.			
25.				54.				83.			
26.				55.				84.			
27.				56.				85.			
28.				57.				86.			
29.				58.				87.			

Vyhodnotenie/Evaluation: STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.

Požadovaná hodnota - Required value max. 15 mm pozdĺžna max. 15 mm priečna

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám STN Controlled bed conforme to the requirements STN

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. / Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Zošiak		Gerek		
	Skúšal/Tested by		Kontroloval / controlled by	Doprastav a.s. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava 0994-SP-13.3



Protokol o skúške - Protocol about the test
PEVNOSŤ V TLAKU - CBGM
STRENGTH IN PRESSURE

číslo - number 88/12017/3.6/ZV
 denník č. - number of diary 1/2017/3.6/ZV

Objednávateľ/Client:		Združenie INFRAŠTRUKTÚRA Nitra		Odberteľ/Customer:		Združenie INFRAŠTRUKTÚRA Nitra	
Stavba/Buiding:		Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Objekt/Object:		SO123-00	
Nazov výrobku/Product name :		CBGM STN EN 14227-1 -C5/6		Konštrukcia/Construction:		CBGM	
Výrobca/Manufacturer:		ALAS SLOVAKIA		Dodací list č./Markings of sample:		7.11.2017	
Miesto odberu/Excavation site:		Stavba		Dátum odberu/ Date of taking:		5.12.2017	
Odberal/1) Sampler 1):		Gerek		Dátum skúšky/ Test date:		5.12.2017	
Číslo SP/Number of TP:		SP-3.6		Dátum vystavenia/Date of issuance:		5.12.2017	
Metóda merania:		STN EN 13286-41		Nazov meradla - Name of gauge/Ev karta meradla-Registration card of gauge:		váža CP 16001S-OCE	
				Skúšobný lis ALPHA		ZV203	
				posuvné meradlo SONET		ZV2150	

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS												
Označenie vzorky	Spôsob výroby vzoriek	Rozmery			Objem V (m ³)	Hmotnosť m (kg)	Objemová hmotnosť ρ (kg.m ⁻³)	Sila F (kN)	Pevnosť v tlaku R _c =F/A _c (MPa)	ØR _c (MPa)	Typ porušenia vzoriek	Stav porušenia tellesa
		d1 - Ø valca(m)	d2-vyška valca(m)	plocha A _c (m ²)								
1.)	0,150	0,122	0,01766	0,0022	4,792	2224	140,2	8,0			bežné	nasyténé
2.)	STN EN 13286-50 čl. 7	0,150	0,123	0,01766	0,0022	4,830	2223	128,6	7,5	7,7	bežné	nasyténé
3.)	0,150	0,121	0,01766	0,0021	4,791	2242	130,6	7,5			bežné	nasyténé

Vyhodnotenie/Evaluation:		
Dosiadnutá pevnosť v tlaku po 28 dnoch tvrdnutia:		7,7 MPa

Prehlásenie/Resolution:		
Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú ine dokumenty (napr. spraveného charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória TESS.		
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory TESS.		
Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.		

Poznámka: 1) Neakreditovaná činnosť		
Robert Szudor Skúšan/ Tested by	Robert Szudor - vedúci OL	Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL
	Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by	



Protokol o skúške - Protocol about the test
PEVNOSŤ V TLAKU - CBGM
STRENGTH IN PRESSURE

číslo - number 89/12017/3.6/ZV
 denník č. - number of diary 1/2017/3.6/ZV

Objednávateľ/Client:		Združenie INFRAŠTRUKTÚRA Nitra		Odberteľ/Customer:		Združenie INFRAŠTRUKTÚRA Nitra	
Stavba/Building:		Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Objekt/Object:		SO123-00	
				Konštrukcia/Construction:		CBGM	
Nazov výrobku/Product name:		CBGM STN EN 14227-1 -C5/6		Dodací list č./Markings of sample:		9.11.2017	
Výrobca/Manufacturer:		ALAS SLOVAKIA		Datum odberu/ Date of taking:		7.12.2017	
Miesto odberu/Excavation site:		Stavba		Datum skúšky/ Test date:		7.12.2017	
Odobral/ Sampler:		Gerek		Datum vystavenia/Date of issuance:		7.12.2017	
Číslo SP/Number of TP:		SP-3.6		Nazov meradla - Name of gauge/Ex karta meradla-Registration card of gauge:		ZV1108	
Metóda merania:		STN EN 13286-41		váha CP 16001S-OCE		ZV203	
				Skúšobný lis ALPHA		ZV2150	
				posuvné meradlo SONET		ZV2150	

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS												
Označenie vzorky	Spôsob výroby vzoriek	Rozmery			Objem V (m ³)	Hmotnosť m (kg)	Objemová hustota ρ (kg m ⁻³)	Sila F (kN)	Pevnosť v tlaku R _c =F/A _c (MPa)	ØR _c (MPa)	Typ porušenia vzoriek	Sav porušenia testu
		d1 - Ø valca(m)	d2-výška valca(m)	plocha A _c (m ²)								
1.)	STN EN	0,150	0,123	0,01766	0,0022	4,801	2210	122,5	7,0		bežné	nasyténé
2.)	13286-50 čl. 7	0,150	0,125	0,01766	0,0022	4,935	2244	129,1	7,5	7,2	bežné	nasyténé
3.)		0,150	0,123	0,01766	0,0022	4,920	2265	120,7	7,0		bežné	nasyténé

Vyhodnotenie/Evaluation:		7,2		MPa	
Dosiadaná pevnosť v tlaku po 28 dnoch tvrdnutia:					

Prehlásenie/Resolution:	
Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória TESS.	
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory TESS.	
Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.	
Poznámka: 1) Neakreditovaná činnosť	
Robert Szudor Skúšan/ Tested by	Robert Szudor - vedúci OL Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by
Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL	

Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZODUŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY A NITRA DOPRAVNÝ VÝVOJ										
Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
1.6.2018	15a/1/2018/10.21/BA	123	chodník	podkladová vrstva	troxler	AC 16 P 50/70; II	3	min 97%	98,1 - 98,7%	vyhovuje
23.5.2018	132J/2/2017/10.19/NR	123	chodník	podkladová vrstva	rozbor	AC 16 P 50/70; II	1	ST	v súlade	v súlade
1.6.2018	22a/1/2017/10.39/BA	123	chodník	podkladová vrstva	lata	AC 16 P 50/70; II		18mm	0 - 8mm	vyhovuje
1.6.2018	39a/1/2017/10.39/BA	123	chodník	podkladová vrstva	lata	AC 16 P 50/70; II		10mm	0 - 8mm	vyhovuje

Protokol o skúške
MIERA ZHUTNENIA ASFALTOVÝCH VRSTVIEV

Dodávateľ:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Objekt:	SO 123 chodník pre peších
Objednávateľ:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Konštrukcia:	podkladová vrstva
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	hrúbka úpravy:	40 mm
Staničenie:	km 0,000-0,300	Dátum skúšky:	16.2018
Názov výrobku:	AC 16 P 50/70; II; 04/2017	Dátum vystavenia:	16.2018
Výrobca:	Slovenské Asfalty s.r.o. OS Senec	Číslo SP:	SP-16 21
Normy: STN EN 12697-7 Asfaltové zmesi Skúšobné metódy pre asf. zmesi skúšané za horúca Časť 7: Stanovenie obj. hmotnosti asfaltovej zmesi pomocou lúčov gama			
Merací prístroj:	Radiačný hutnomer TROXLER	Evidenčná karta meradla:	BA 30

VÝSLEDKY SKÚŠOK

		Objemová hmotnosť [kg/m ³]							D [%]	
číslo m.	Miesto	staničenie	Nameraná hodnota					po korekcii	Marshall sk.	Dosiadnutá Ø D [%]
			1.	2.	3.	4.	Φ			
1	miesto č. 1	km 0,060 v ľavo	2423	2417	2420	2414	2419	2421	2458	98,5
2	miesto č. 2	km 0,180 v pravo	2427	2421	2426	2416	2423	2425	2458	98,7
3.	miesto č. 3	km 0,265 vľavo	2405	2411	2410	2408	2409	2411	2458	98,1

Vyhodnotenie: STN 73 6121 Stavba vozoviek - Hutnené asfaltové vrstvy
Požadovaná hodnota D (%) : min. 97 Dosiadnutá Ø D [%] 98,4
Ø D (%): min. 98

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť len po písomnej súhlase skúšobného laboratória.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu



TESScontrol, s.r.o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Bratislava, Laboratórium Senec
Stavbárska 4, 903 01 Senec



Protokol o skúške


číslo 132J/2/2018/10.19/PA
denník č. 2/2018/10.19/PA

ROZBOR ASFALTOVEJ ZMESI

Objednávateľ: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberteľ: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba: Jaguar Land Rover	Objekt: SO 123
Staničenie: neudané	Konštrukcia: podkladná vrstva
Názov výrobku: AC 16 P 50/70; II; 04/2017	Označenie vzorky: 132/2018/AZ/SC
Výrobca: Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu: 23.5.2018
Miesto odberu: stavba	Dátum skúšky: 25.5.2018
Odobral ¹⁾ : objednávateľ	Dátum vystavenia: 25.5.2018
	Teplota zmesi: 178°C
Číslo SP: SP-10.19, SP- 10.11, SP- 10.12, SP-10.40	Ev. karta meradla: BA15, BA70A-70K, BA109, BA103 BA105, BA19, BAZ101, BAS2, BAZ100, BA128, sada sit BA70/K, DHM 79280

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Technická špecifikácia	Jednotka	Metóda merania	Merací prístroj	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
					Hodnota	Výsledok
Obsah asfaltu po extrakcii:	%	STN EN 12697-1	Automat. analyzátor	4,5	4,5 (± 0,3)	Výsledok parametrov 04.1.1)
Objemová hmotnosť:	Mg/m ³	STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy	2,455		
Max. objemová hmotnosť:	Mg/m ³	STN EN 12697-5	Pyknometer	2,586		
Medzerovitý vo vode:	%	STN EN 12697-8	Vypočet	5,1	4,0 - 7,0	
Percento medzier v zmesi kameniva vyplnených spojivom VFB	%	STN EN 12697-6	Vypočet	-		
Stekavosť ¹⁾ :	%	STN EN 12697-18	Hydrostatické váhy	-	-	Výsledok parametrov 04.1.1)
Teplota asfaltovej zmesi:	°C	STN EN 12697-13	Teplomér	150	-	
Zrinitosť asfaltovej zmesi:	%	STN EN 933-1	Sada sit			

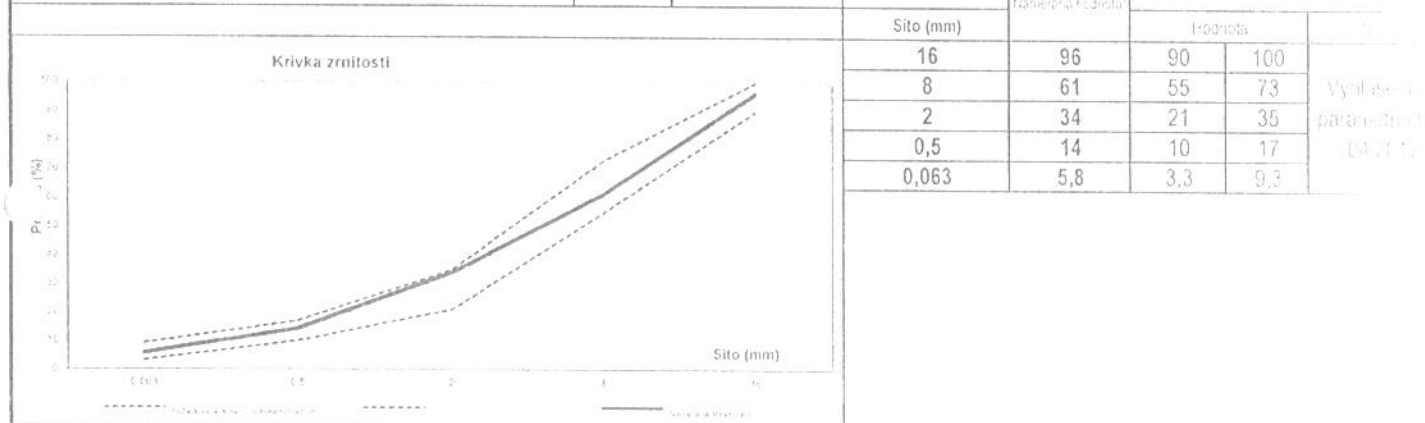

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).
Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Neistoty meraní sú dostupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka:

1) - neakreditovaná činnosť



TESScontrol, s. r. o.

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

21-

Odtlačok pečiatky SK

Edita Antalová

Rastislav Kováčik - vedúci OL

Kontrolovať a schváliť



TESScontrol, s.r.o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Bratislava, Laboratórium Bratislava
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava

Protokol o skúške

číslo 22a/1/2018/10.25/E
denník číslo 1/2018: 10.25 E

NEROVNOSŤ POVRCHU PODKLADNÝCH VRSTIEV

Objednávateľ:	Doprastav a.s. Bratislava, závod Bratislava	Odberateľ:	
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt:	SO 123 chodník pre peších
Staničenie:	km 0,000-0,300 L' + P strana	Konštrukcia:	podkladová vrstva
Názov výrobku:	AC 16 P 50/70; II; 04/2017	Poveternostné podmienky:	24 °C
Výrobca:	Slovenské asfalty s.r.o.	Dátum skúšky:	1.6.2018
		Dátum vystavenia:	5.6.2018
Metóda merania:	STN 736176	Číslo SP:	SP-10.25
Merací prístroj:	Planograf 3 m	Evidenčná karta meradia:	BA 48

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Nerovnosť [mm]

Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Požadované hodnoty	
									Hodnota	Max.
SO 123 km 0,000-0,300 ľavá strana			SO 123 km 0,000-0,300 ľavá strana							
1	km 0,029	8	1	km 0,147	8					
2	km 0,032	8	2	km 0,151	8					
3	km 0,035	8	3	km 0,155	8					
4	km 0,038	8	4	km 0,159	8					
5	km 0,041	8	5	km 0,163	8					
6	km 0,044	8	6	km 0,167	8					
7	km 0,047	8	7	km 0,171	8					
8	km 0,050	8	8	km 0,175	8					
9	km 0,053	8	9	km 0,179	8					
10	km 0,056	8	10	km 0,183	8					
11	km 0,059	8	11	km 0,187	8					
12	km 0,062	8	12	km 0,191	8					
13	km 0,065	8	13	km 0,195	8					
14	km 0,068	8	14	km 0,199	8					
15	km 0,071	8	15	km 0,203	8					
16	km 0,074	8	16	km 0,207	8					
17	km 0,077	8	17	km 0,211	8					
18	km 0,080	8	18	km 0,215	8					
19	km 0,083	8	19	km 0,219	8					
20	km 0,086	8	20	km 0,223	8					
			21	km 0,227	8					
			22	km 0,231	8					
			23	km 0,235	8					
			24	km 0,239	8					
			25	km 0,243	8					

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).

Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Nesúhlasí merania sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka: V protokole sú zaznamenané najvyššie namerané hodnoty na celom úseku. Ostatné namerané hodnoty neprekročili hodnotu 18 mm.



TESScontrol, s. r. o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
23

Marek Babic
Skúšajú

Rastislav Kováčik - vedúci OJ
Kontrolovať a schvaľovať

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Dopravný podnik		Dopravný podnik		Dopravný podnik		Dopravný podnik		Dopravný podnik	
	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
14.11.2017	67/1/2017/10.25/BA	123	km 0,000-0,303	podkladová vrstva	planograf	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	1	18	vyhovuje	vyhovuje
14.11.2017	119/1/2017/10.39/BA	123	km 0,000-0,303	podkladová vrstva	lata	AC 22 P 35/50; I; 10/2017		10	vyhovuje	vyhovuje
13.11.2017	5/2/2017/10.19/NR	110-114-123		podkladová vrstva	rozbor	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	1	ST	v súlade	v súlade
15.11.2017	126/1/2017/10.36/ZA	123		podkladová vrstva	citlivosť na vodu	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	1	ST	v súlade	v súlade
15.11.2017	158/1/2017/10.36/ZA	123		podkladová vrstva	Odolnosť asf.zmesi proti trvalým def.	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	1	ST	v súlade	v súlade
14.11.2017	82/1/2017/10.27/BA	123		podkladová vrstva	Vývrty	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	3	min. 97%	99,1; 84,4mm	vyhovuje



Doprastav a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis
Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Bratislava
Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava

číslo/number: 67/1/2017/10.25/BA

denník č./number of diary: 1/2017/10.25/BA

Protokol o skúške - Certificate of test

POZDĹŽNA NEROVNOSŤ POVRCHU VOZOVKY / IRREGULARITY SURFACE OF BASIS LAYERS

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Odberateľ/Customer:	
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt/Object:	SO 123
Staničenie/Stationing:	km 0,000-0,303	Konštrukcia/Construction:	podkladová vrstva
Názov výrobku/Product name:	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	Povet. podm./Atm. Conditions:	12°C
Výrobca/Manufacturer:	Slovenské asfalty s.r.o.	Dátum skúšky/ Test date:	14.11.2017
		Dátum vystavenia/Date of issuance:	15.11.2017
Metóda merania/Test method:	STN 73 6176	Číslo SP/Number of TP:	10.25
Merací prístroj/Measuring instrument:	PLANOGRAPH 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	BA48

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Nerovnosť/Irregularity [mm]

Číslo nerovnosti/ Irregularity number	Miesto nerovnosti/km Irregularity point	Nameraná hodnota/mm Measured value	Číslo nerovnosti/ Irregularity number	Miesto nerovnosti/km Irregularity point	Nameraná hodnota/mm Measured value	Číslo nerovnosti/ Irregularity number	Miesto nerovnosti/km Irregularity point	Nameraná hodnota/mm Measured value	Požadované kritérium/Asked criterium	
zaznamenané najvyššie namerané hodnoty na meranom úseku										
ostatné namerané hodnoty sú menšie ako 7 mm										
Ľavá strana			Pravá strana						max. 18 mm	STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
1	km 0,005	7	1	km 0,287	7					
2	km 0,024	8	2	km 0,281	8					
3	km 0,025	9	3	km 0,211	8					
4	km 0,029	9	4	km 0,204	8					
5	km 0,087	7	5	km 0,179	9					
6	km 0,091	9	6	km 0,178	8					
7	km 0,139	7	7	km 0,153	7					
8	km 0,180	7	8	km 0,147	8					
9	km 0,203	8	9	km 0,146	9					
10	km 0,204	7	10	km 0,144	9					
11	km 0,276	7	11	km 0,108	9					
			12	km 0,067	8					
			13	km 0,045	7					
			14	km 0,018	8					
Poznámka: v protokole sú zaznamenané najvyššie namerané hodnoty na celom meranom úseku. Ostatné namerané hodnoty neprekročili hodnotu 7 mm.										

Vyhodnotenie/Evaluation : podľa STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy

Prehlásenie/Resolution

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OL.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the head of OL.

Marek Babio
Skušal/Tested by

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL



Doprastav a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblasťné laboratórium Bratislava

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava



SNAS

Reg. No. 060/S-094

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo/number: 119/1/2017/10.39/B

denník č./number of diary: 1/2017/11.9 BA

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY / IRREGULARITY SURFACE STRUCTURAL LAYER

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Odberateľ/Customer:	
Stavba/Buiding:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt/Object:	SO 123-00
Staničenie/Stationing:	km 0,000-0,303	Konštrukcia/Construction:	Podkladová vrstva
Názov výrobku/Product name:	AC 22 P 35/50; I; 10/2017	Povet. podm./Atm. Conditions:	17°C
Výrobca/Manufacturer:	Slov. asfalty - Senec	Dátum skúšky/ Test date:	14.11.2017
		Dátum vystavenia/Date of issuance:	16.11.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13036-7	Číslo SP/Number of TP:	SP-10.39
Merací prístroj/Measuring instrument:	Lata dĺžky 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	BA 43

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Priečna nerovnosť/Cross irregularity [mm]

Číslo merania/ Measuring number	Miesto merania/ Measuring point	Priečny smer - strana/Cross line - side			Číslo merania/ Measuring number	Miesto merania/ Measuring point	Priečny smer - strana/Cross line - side			Požadované kritérium/Asked criterium	
		pravá/right	stred/centre	ľavá/left			pravá/right	stred/centre	ľavá/left	Hodnota/Value	Norma/Standard
SO 123 pravá strana					SO 123 ľavá strana					max 10 mm STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy	
1	km 0,040	3	4	4	1	km 0,040	3	1	3		
2	km 0,080	2	3	2	2	km 0,080	2	3	2		
3	km 0,120	2	2	1	3	km 0,120	1	0	1		
4	km 0,160	3	3	1	4	km 0,160	1	3	1		
5	km 0,200	2	2	2	5	km 0,200	2	2	2		
6	km 0,240	2	1	3	6	km 0,240	3	1	1		
7	km 0,280	3	2	2	7	km 0,280	4	1	2		

Vyhodnotenie/Evaluation: podľa STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy

Prehlásenie/Resolution:

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory, TESS.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Marek Babic
Skušal/Tested by

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL

Protokol o skúške - Protocol about the test


číslo/number: 5/2017/10.19/NR
denník č./number of diary: 2/2017/10.19/BA

ROZBOR ASFALTOVEJ ZMESI/ASPHALTIC MIXTURE ANALYSIS

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberteľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Building: Jaguár Land Rover - Nitra	Objekt/Object: SO 123
Staničenie/Stationing: neudané	Konštrukcia/Construction: podkladová vrstva
Názov výrobku/Product name: AC 22 P 35/50; I; 10/2017	Označenie vzorky/Markings of sample: 5/2017/AZ/SC
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu/ Date of taking: 13.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Datum skúšky/ Test date: 13.11.2017
Odobral/ Sampler ¹⁾ : objednávateľ	Dátum vystavenia/Date of issuance: 13.11.2017
	Teplota zmesi/Mixture temperature: 175°C
Číslo SP/Number of TP: SP-10.19, SP- 10.11, SP- 10.12, SP-10.40	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: BA15, BA70A-70K,BA109, BA103 BA105, BA19, BAZ101, BAS2, BAZ100, BA128, sada sit BA70/K, DHM 79280

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion		
					Hodnota/Value	Norma/Stand.	
Obsah asfaltu po extrakcii/Bitumen content of soluble bind:	%	STN EN 12697-1	Automat. analyzátor	4,4	4,1 (± 0,3)	10:2017	
Objemová hmotnosť/Bulk density:	Mg/m ³	STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy	2,449			
Max. objemová hmotnosť/Max. bulk density:	Mg/m ³	STN EN 12697-5	Pyknometer	2,594			
Medzerovitosť vo vode/Air voids in water:	%	STN EN 12697-8	Výpočet	5,6	4,0 - 8,0		
Percento medzier v zmesi kameniva vyplnených spojivom VFB Rate of gap in aggregate mix with agglutinan	%	STN EN 12697-8	Výpočet	65,6			
Stekavosť/Flowidity ¹⁾ :	%	STN EN 12697-18	Hydrostatické váhy	-	-		
Teplota asfaltovej zmesi/Bitument temperatur:	°C	STN EN 12697-13	Teploměr	165	-		
Zrinitosť asfaltovej zmesi/Grading asphalt mixture:	%	STN EN 933-1	Sada sit/Sieve pack	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion		
			Sito/Sieve (mm)		Hodnota/Value	Norma/Stand.	
Krivka zrinitosti/Grading curve 			22,4	99	90	100	10:2017
			11,2	76	60	76	
			2	29	21	35	
			0,5	11	7	17	
			0,063	6,2	3,5	9,5	

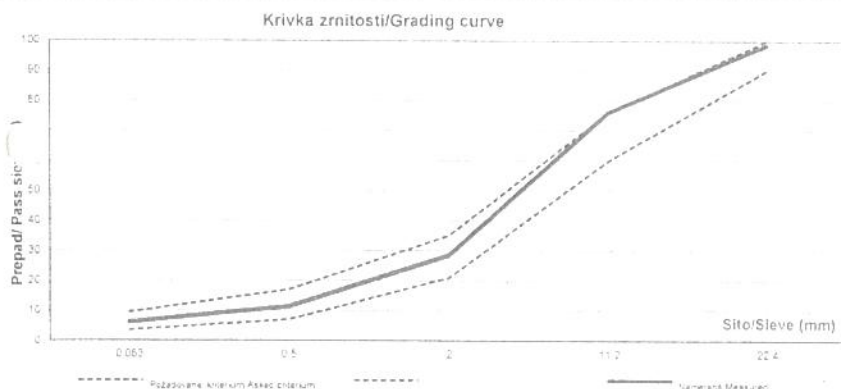

Prehlásenie :

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu

Poznámka:

1) - neakreditovaná činnosť

Edita Antalová
Skúšan/ Tested by

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

Doprastav a.s.
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochnianska 1/A, Bratislava
Oblasťné laboratórium Bratislava, Laboratórium Senec

CITLIVOSŤ ASFALTOVEJ ZMESI NA VODU / DETERMINATION OF THE WATER SENSITIVITY OF BITUMINOUS SPECIMENS

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberateľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Site/Project: Jaguár Land Rover	Objekt/Object: SO: 123-00
Staničenie/Chainage: km 0,000 - 0,303	Konštrukcia/Construction: podkladová vrstva
Názov výrobku/Product name : AC 22 P 35/50; I; 10/2017	Použitie/Application: podkladová vrstva
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty s.r.o., OS Senec	Datum odberu/ Date of taking: 15.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Datum výroby vzoriek/Date of manufacture samples: 16.11.2017
Odberateľ ¹⁾ / Sampler ¹⁾ : objednávatel'	Dátum skúšky/ Date tested: 20.11.-23.11.2017
Odborný listok/Markings of sample: 328/2017/AZIZA (7/2017/AZINR)	Dátum vystavenia/Date reported: 30.11.2017
Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZA 4, ZA 6, ZA 21, ZA 29, ZA 32, ZA 101	
Číslo SPI/Number of TP: SP-10.36	

VÝSLEDKY SKUSOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Test equipment	Nameraná hodnota/Measured value		Požadované kritérium/Asked criterion	
				Ø		Hodnota/Value Norma/Standard	
Pevnosť v priečnom ťahu suchých telies ITSd: Strenght in transverse pull of dry samples	kPa	STN EN 12697-23	Marshallov lis InfraTest	1 167,8	1 107,0	1121,9	
Pevnosť v priečnom ťahu mokvých telies ITSs: Strenght in transverse pull of wet samples	kPa	STN EN 12697-23	Marshallov lis InfraTest	905,7	874,0	884,9	
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr: Ratio of strenghts in transverse pull	%	STN EN 12697-12/O1				78,9	KLAZ I/3

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol má byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Tested in accordance with the above test method. Test report could be reproduced only completely, reproduction in parts is subjected to a permit of the laboratory.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.
 Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť

Doprastav

Doprastav a.s.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
 Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
 - 0911 -

Kontroloval/ a schválil/Controlled by and approved by

Ing. Juraj Bútora

Ing. Lukáš Jachym
 Skúšan/ Tested by

ODOLNOSŤ ASFALTOVEJ ZMESI PROTI TRVALÝM DEFORMÁCIÁM ASPHALT MIXTURE RESISTANCE TO PERMANENT DEFORMATION

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberateľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Building: Jaguar Land Rover Nitra	Objekt/Object: SO :123-00
Staničenie/Stationing: km: 0,000 - 0,303	Konštrukcia/Construction: podkladová vrstva
Názov výrobku/Product name : AC 22 P 35/50; I; 10/2017	Použitie/Application: podkladová vrstva
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty OS Senec	Dátum odberu/ Date of taking: 15.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum výroby vzoriek/ Date of marking sample: 6.12.2017
Odobrat/ Sampler ¹⁾ : objednávatel'	Dátum skúšky/ Test date: 12.12.2017
Odborný listok/Markings of sample: 328/2017/AZIZA (7/2017/AZ/INR)	Dátum vystavenia/Date of issuance: 13.12.2017
Číslo SP/Number of TP: SP-10.37	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZA74

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/Measured value		Pozadované kritérium/Asked criterion	
				vz. č. 1./sample nr 1	vz. č. 2./sample nr. 2	Ø	Hodnota/Value
Hĺbka vyjadzenej kolajaje RD _{AIR} :	mm	STN EN 12697-22 +A1, 2008	Spurtest	1,9	2,0	2,0	KLAZ I/3
Pomerná hĺbka vyjadzenej kolajaje PRD _{AIR} :	%	skúšané na zahradení malých rozmerov, postup B na vzduchu		3,2	3,2	PRD _{AIR} 5,0	
Sklon vyjadzenej kolajaje WTS _{AIR} :	mm/10 ³ zať. cyklov			0,03	0,04	WTS _{AIR} 0,10	
Doplňujúce údaje/Subsidiary data:							
Objemová hmotnosť/Bulk density	2,442 Mg/m ³		Obsah asfaltu/Bitumen content of		-		
Miera zhutnenia vzorky/Measure concretion of sample	98 [%]		Hrúbka vzorky/Thickness layer		61 [mm]		
Teplota pri skúške/Temperature at test	50 [°C]		Teplota pri výrobe vzorky/temperature at production sample		165 [°C]		

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú prímerných skúšok a neobsahujú žiadne dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len rely, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test, and they aren't substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Výsledky meraní sú prístupné a vedeckému laboratóriu a sú vyjadrené na základě oficiálneho nariadenia.

Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť

Dušan Mendel	Ing. Juraj Bitora - vedúci OL
Podpísaný/signed by	Podpísaný/signed by

Doprastav


Lubochmianska 1/A, 831 04 Bratislava
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ZÁKLAD
0993 -

Wheel tracking

EN 12697-22 (Procedure B)

Name of test	158/1/2017/10.37/ZA
line 2	AC 22 P 35/50;I;10/2017
line 3	Jaguar Land Rover Nitra
line 4	SO: 123-00
line 5	Slovenske Asfalty , OS Senec
line 6	OH:2,442 Mg/m ³
line 7	odber: 15.11.2017
line 8	vzorka: 6.12.2017
line 9	skuska: 12.12.2017
line 10	l=61 mm; p=61 mm

Sample	Wheel-tracking slope [mm/1000 cycles]	Wheel-tracking slope (linear part) [mm/1000 cycles]	Rut depth [mm]	prop. rut depth [%]
Left	0.03 (d10000-d5000)	0.03 (d9125-d7125)	1.9 (d10000)	3.2 (d10000)
Right	0.04 (d10000-d5000)	0.05 (d8150-d6150)	2.0 (d10000)	3.2 (d10000)
Average value	0.04	0.04	2.0	3.2

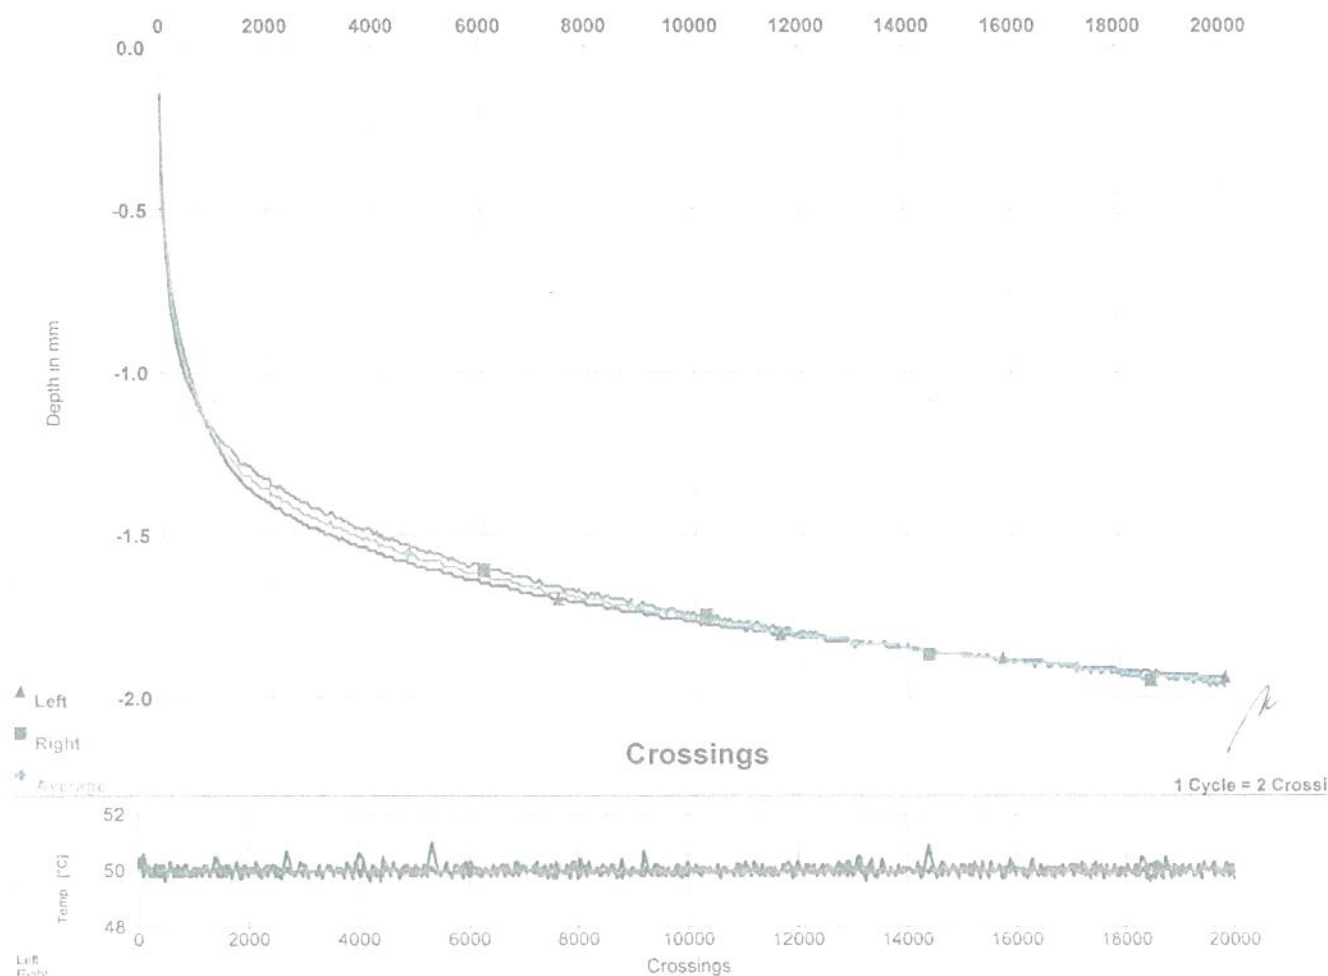

MIERA ZHUTNENIA A HRÚBK A ASFALTOVÝCH VRSTVIEV/MEASURE CONCRETION AND THICKNESS ASPHALTIC LAYER

Objednávateľ/Cliet:	Doprastav a.s., závod Bratislava	Objekt/Subject:	SO 123
Stavba/Building:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Konštrukcia/Construction:	podkladová vrstva
Stla. iženie/Stationing:	km 0,000 - 0,303	Odborný listok/Markings of sample:	41/2017/AZ/BA
Názov výrobku/Product name:	AC 22 P 35/50; I, 10/2017	Hrúbka vrstvy/Thickness layer:	70 mm
Výrobca/Manufacturer:	Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu/ Date of taking:	14.11.2017
Miesto odberu/Excavation site:	stavba	Dátum skúšky/ Test date:	15.11.2017
Odobral/ Sample ¹⁾ :	Babic	Dátum vystavenia/Date of issuance:	15.11.2017

Číslo SP/Number of TP:	SP-10.12	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	BA 14, BA 102
------------------------	----------	---	---------------

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Číslo merania/ Measuring number	Miesto merania/ Measuring point	Objemová hmotnosť/Bulk density [Mg/m ³]		Miera zhutnenia/Measure concretion [%]		Hrúbka vrstvy/Thickness layer [mm]		
		Metóda merania/Test method:	Merací prístroj/Measuring instrument:	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion	Norma/Standard
		STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy SARTORIUS					
		Nameraná hodnota/ Measured value	Hodnota z protokolu/Value of protocol	Hodnota/Value	Zo dňa /from day			
1.		2,427	2,449	13.11.2017		83,5		
2.		2,410	2,449	13.11.2017		84,0		
3.	km 0,080	2,439	2,449	13.11.2017		88,0		
4.		2,426	2,449	13.11.2017		85,0		
5.		2,427	2,449	13.11.2017		82,5		
6.		2,440	2,449	13.11.2017		85,5		
7.	km 0,170	2,416	2,449	13.11.2017		84,0		
8.		2,424	2,449	13.11.2017		83,5		
9.		2,435	2,449	13.11.2017		84,0		
10.		2,426	2,449	13.11.2017		84,5		
11.	km 0,250	2,431	2,449	13.11.2017		84,0		
12.		2,433	2,449	13.11.2017		84,0		
				</				

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZOBRAZENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA VÝKRESNÝ DENÍK										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
20.11.2017	129/1/2017/10.36/ZA	123		ložná vrstva	citlivosť na vodu	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	1	ST	v súlade	v súlade
20.11.2017	156/1/2017/10.37/ZA	123		ložná vrstva	odolnosť voči deformáciám	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	1	ST	v súlade	v súlade
22.11.2017	128/1/2017/10.39/BA	110-114-123	km 0,000 - 0,480	ložná vrstva	rovinatosť	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14		max 6mm	vyhovuje	vyhovuje
21.11.2017	122/1/2017/10.39/BA	123	km 0,000-0,303	ložná vrstva	rovinatosť	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14		max 6mm	vyhovuje	vyhovuje
21.11.2017	70/1/2017/10.25/BA	123	km 0,000-0,303	ložná vrstva	rovinatosť	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	1	max 8mm	vyhovuje	vyhovuje
22.11.2017	72/1/2017/10.25/BA	110-114-123	km 0,000 - 0,480	ložná vrstva	rovinatosť	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	1	max 8mm	vyhovuje	vyhovuje
20.11.2017	8/2/2017/10.19/NR	123		ložná vrstva	rozbor	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	1	ST	v súlade	v súlade
20.11.2017	11/2/2017/10.19/NR	123		ložná vrstva	rozbor	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	1	ST	v súlade	v súlade
21.11.2017	92/1/2017/10.25/BA	123	km 0,000 - 0,290	ložná vrstva	troxler	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	5	min. 97%	98,3 - 98,6%	vyhovuje
22.11.2017	85/1/2017/10.27/BA	123	km 0,000 - 0,260	ložná vrstva	Vývrty	AC 22 L PmB 45/80-75; I; 04/14	3	min. 97%	98,70	vyhovuje



CITLIVOSŤ ASFAĽ TOVEJ ZMESI NA VODU / DETERMINATION OF THE WATER SENSITIVITY OF BITUMINOUS SPECIMENS

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s. Bratislava	Objekt/Subject: SO: 123-00	Odberateľ/Customer: Doprastav a.s. Bratislava
Stavba/Site/Project: Jaguar Land Rover Nitra	Konštrukcia/Construction: ložná vrstva	
Staničenie/Chainage: neuvedené	Použitie/Application: ložná vrstva	
Názov výrobku/Product name: AC 22 L PmB 45/80-75; I; PST 04/14	Dátum odberu/ Date of taking: 20.11.2017	
Výrobca/Manufacturer: Slovenske Asfalty s.r.o., OS Senec	Datum výroby vzorky/Date of manufacture samples: 26.11.2017	
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum skúšky/ Date tested: 27.11 - 30.11.2017	
Odobral ¹⁾ / Sampler ¹⁾ : objednávateľ	Dátum vystavenia/Date reported: 30.11.2017	
Odberný lisok/Markings of sample: 329/2017/AZIZA (8/2017/AZINR)		
Číslo SP/Number of TP: SP-10.36		Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZA 4, ZA 6, ZA 21, ZA 29, ZA 32, ZA 101

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Test equipment	Nameraná hodnota/Measured value		Požadované kritérium/Asked criterium	
				Ø		Hodnota/Value	Norma/Standard
Pevnosť v priečnom ťahu suchých telies ITSd: Strenght in transverse pull of dry samples	kPa	STN EN 12697-23	Marshall lis InfraTest	1 336,0			
				1 217,0	1249,9		
				1 196,8			
Pevnosť v priečnom ťahu mokrych telies ITSsw: Strenght in transverse pull of wet samples	kPa	STN EN 12697-23	Marshall lis InfraTest	1 061,9			
				1 148,6	1132,0		
				1 185,4			
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr: Ratio of strenghts in transverse pull	%	STN EN 12697-12/O1			90,6	min.70,0	KLAZ I/2

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Tested in accordance with the above test method. Test report could be reproduced only completely, reproduction in parts is subjected to a permit of the laboratory.

Nesúhlasí so zisteniami sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypracované na základe interného predpisu.

Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť



Doprastav a.s.

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Odtlačok pečiatky odtlačky stamp RL

Dušan Mendel
Skúšan/Tested by

Ing. Juraj Bútora
Kontroloval/ a schválil/Controlled by and approved by



Protokol o skúške - Protocol about the test

ODOLNOSŤ ASFALTOVEJ ZMESI PROTI TRVALÝM DEFORMÁCIÁM ASPHALT MIXTURE RESISTANCE TO PERMANENT DEFORMATION

Objednávateľ/Cliet: Doprastav a.s., závod Bratislava	Oderateľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Building: Jaguar Land Rover Nitra	Objekt/Object: 123-00
Staničenie/Stations: km: 0,000 - 0,303	Konštrukcia/Construction: ložná vrstva
Názov výrobku/Product name: AC 22 L PMB 45/80-75; PST 04/14	Použitie/Application: ložná vrstva
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty, OS Senec	Dátum odberu/ Date of taking: 20.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum výroby vzoriek/ Date of marking sample: 1.12.2017
Odbor/ Sampler: objednávateľ	Dátum skúšky/ Test date: 8.12.2017
Odborný listok/Markings of sample: 329/2017/AZ/ZA (8/2017/AZ/NR)	Dátum vystavenia/Date of issuance: 11.12.2017
Číslo SP/Number of TP: SP-10.37	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZA74

VÝSLEDKY SKÚSOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/Measured value		Požadované kritérium/Asked criterion	
				vz. č. 1./sample nr 1	vz. č. 2./sample nr 2	Hodnota/Value	Norma/Standard
Hĺbka vyjazdenej koľaje RD _{AIR} :	mm	STN EN 12697-22 -A1: 2008	Spurtest	1,5	1,9	-	KLAZ I/2 PRD _{AIR} 3,0 WTS _{AIR} 0,07
Pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje PRD _{AIR} :	%	skúšané na zaradení malých		2,4	3,1		
Sklon vyjazdenej koľaje WTS _{AIR} :	mm/10 ³ za 1 cyklus	rozmernov, postup B na vzduchu		0,04	0,05		
Doplňujúce údaje/Subsidiary data:							
Objemová hmotnosť/Bulk density	2,462 Mg/m ³		Obsah asfaltu/Bitumen content	-			
Miera zhutnenia vzorky/Measure concretion of sample	98 %		Hrúbka vzorky/Thickness layer	60 mm			
Teplota pri skúške/Temperature at test	50 °C		Teplota pri výrobe vzorky/Temperature at production sample	160 °C			

Prehľadnenie/Resolution:

Výsledky skúsk sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Nasledujúce údaje sú výsledkami skúšky a sú súčasťou výsledkov skúšky.

Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť

Dušan Mendel	Ing. Juraj Butora - vedúci OL
Generál/checked by	Kontrola a schválenie/Controlled by and approved by




Wheel tracking

EN 12697-22 (Procedure B)

Name of test	156/1/2017/10.37/ZA
line 2	AC 22 L PMB 45/80-75; I; PST-04/2014
line 3	Jaguar Land Rover Nitra
line 4	SO: 123-00
line 5	Slovenske Asfalty s.r.o., OS Senec
line 6	OH:2,462 Mg/m ³
line 7	odber: 20.11.2017
line 8	vzorka: 1.12.2017
line 9	skuska: 8.12.2017
line 10	l=60 mm; p=60 mm

Sample	Wheel-tracking slope [mm/1000 cycles]	Wheel-tracking slope (linear part) [mm/1000 cycles]	Rut depth [mm]	prop. rut depth [%]
Left	0.04 (d10000-d5000)	0.06 (d5800-d3800)	1.5 (d10000)	2.4 (d10000)
Right	0.05 (d10000-d5000)	0.05 (d9175-d7175)	1.9 (d10000)	3.1 (d10000)
Average value	0.05	0.05	1.7	2.8

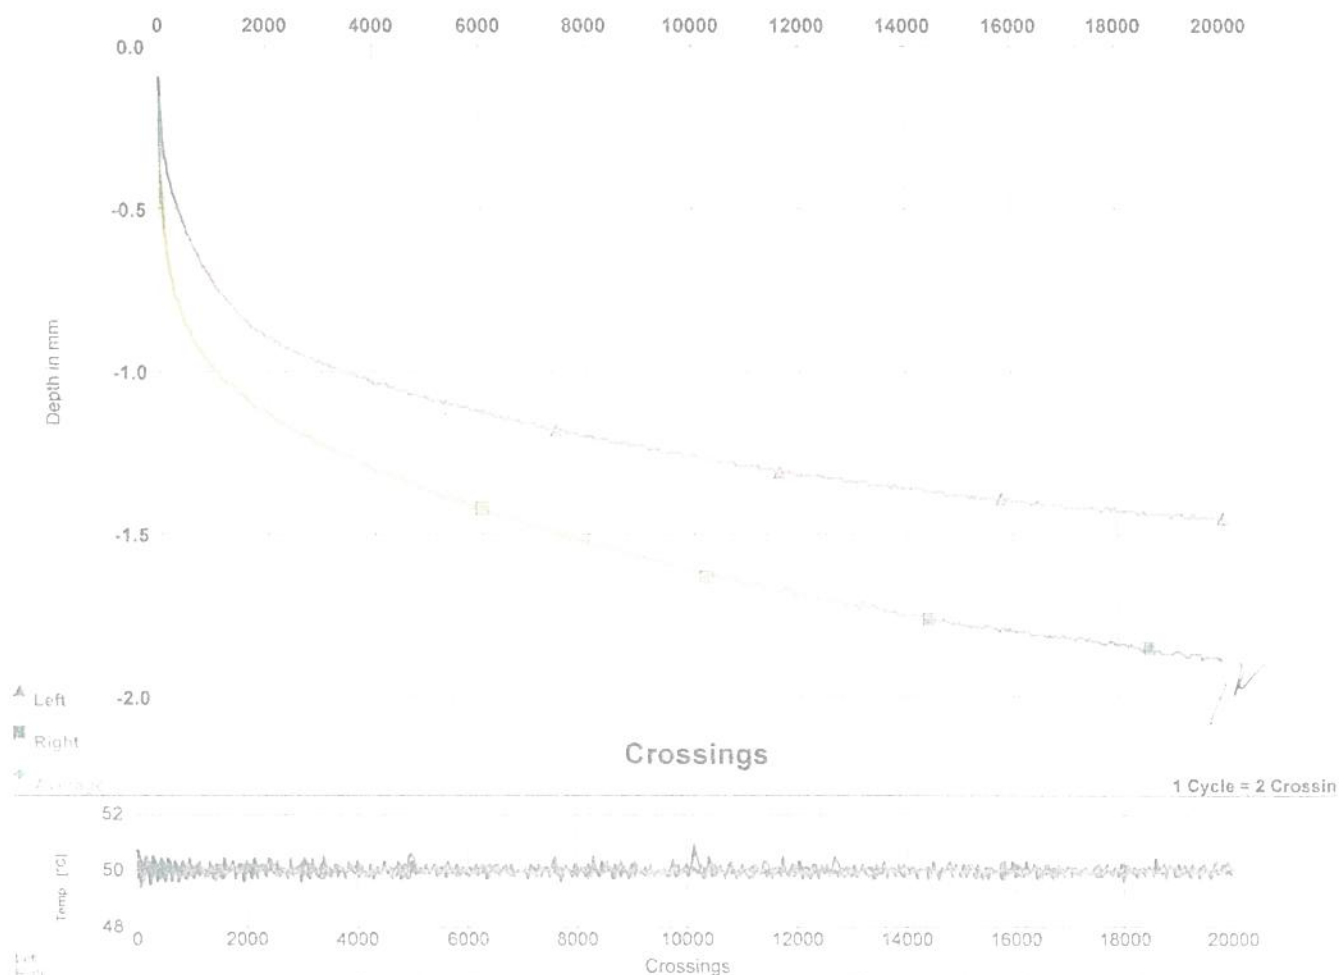


Protokol o skúške - Protocol about the test


číslo/number: 8/2017/10.19/NR
denník č./number of diary: 2/2017/10.19/BA

ROZBOR ASFALTOVEJ ZMESI/ASPHALTIC MIXTURE ANALYSIS

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberteľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Buiding: Jaguar Land Rover - Nitra	Objekt/Object: SO 123
Staničenie/Stationing: neudané	Konstruktia/Construction: ložná vrstva
Názov výrobku/Product name: AC 22 L PMB 45/80-75; I, PST-04/14	Označenie vzorky/Markings of sample: 8/2017/AZ/NR
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu/ Date of taking: 20.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum skúšky/ Test date: 20.11.2017
Odoberač/ Sampler ¹⁾ : objednávateľ	Dátum vystavenia/Date of issuance: 20.11.2017
	Teplota zmesi/Mixture temperature: 178°C
Číslo SP/Number of TP: SP-10.19, SP- 10.11, SP- 10.12, SP-10.40	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: BA15, BA70A-70K, BA109, BA103, BA105, BA19, BAZ101, BAS2, BAZ100, BA128, sada sit BA70/K, DHM 79280

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterium		
					Hodnota/Value	Norma/Standard	
Obsah asfaltu po extrakcii/Bitumen content of soluble bind:	%	STN EN 12697-1	Automat. analyzátor	4,5	4,4 (± 0,3)	PST-04/14	
Objemová hmotnosť/Bulk density:	Mg/m3	STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy	2,462			
Max. objemová hmotnosť/Max. bulk density:	Mg/m3	STN EN 12697-5	Pyknometer	2,573			
Medzerovitosť vo vode/Air voids in water:	%	STN EN 12697-8	Výpočet	4,3	3,5 - 7,0		
Percento medzier v zmesi kameniva vyplnených spojivom VFB Rate of gap in aggregate mix with agglutinan	%	STN EN 12697-8	Výpočet	-			
Stekavosť/Flowidity ¹⁾ :	%	STN EN 12697-18	Hydrostatické váhy	-	-		
Teplota asfaltovej zmesi/Bitument temperatur:	°C	STN EN 12697-13	Teploměr	155	-		
Zrinitosť asfaltovej zmesi/Grading asphalt mixture:	%	STN EN 933-1	Sada sit/Sieve pack	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterium		
			Sito/Sieve (mm)		Hodnota/Value	Norma/Standard	
Krivka zrinitosti/Grading curve 			22,4	98	90	100	PST-04/14
			11,2	71	60	77	
			2	34	26	40	
			0,5	14	10	19	
			0,063	6,2	3,2	9,2	

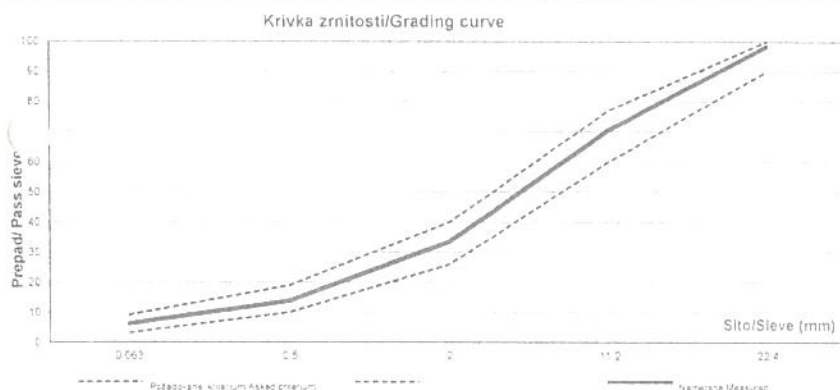

Prehlásenie :

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, ner part can be used only after written consent of the laboratory.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka:

1) - neakreditovaná činnosť

Doprastav

Edita Antálková
Skúšal/ Tested by

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
Lubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
- 0911 -

Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo/number: 11/2017/10.19/NR

denník č./number of diary: 2/2017/10.19/NR

ROZBOR ASFALTOVEJ ZMESI/ASPHALTIC MIXTURE ANALYSIS

Objednávateľ/Client: Slovenské Asfalty s.r.o.	Odberateľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Buiding: Jaguar Land Rover - Nitra	Objekt/Object: SO 123
Staničenie/Stationing: neudané	Konštrukcia/Construction: ložná vrstva
Názov výrobku/Product name: AC 22 L PMB 45/80-75; I, PST-04/14	Označenie vzorky/Markings of sample: 11/2017/AZ/NR
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu/ Date of taking: 20.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum skúšky/ Test date: 20.11.2017
Odobral/ Sampler ¹⁾ : objednávateľ	Dátum vystavenia/Date of issuance: 20.11.2017
	Teplota zmesi/Mixture temperature: 174°C
Číslo SP/Number of TP: SP-10.19, SP- 10.11, SP- 10.12, SP-10.40	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: BA15, BA70A-70K,BA109, BA103 BA105, BA19, BAZ101, BAS2, BAZ100, BA128, sada sit BA70/K, DHM 79280

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion			
					Hodnota/Value	Norma/Standard		
Obsah asfaltu po extrakcii/Bitumen content of soluble bind:	%	STN EN 12697-1	Automat. analyzátor	4,7	4,4 (± 0,3)	PST-04/1		
Objemová hmotnosť/Bulk density:	Mg/m ³	STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy	2,470				
Max. objemová hmotnosť/Max. bulk density:	Mg/m ³	STN EN 12697-5	Pyknometer	2,566				
Medzerovitost' vo vode/Air voids in water:	%	STN EN 12697-8	Výpočet	3,8	3,5 - 7,0			
Percento medzier v zmesi kameniva vyplnených spojivom VFB Rate of gap in aggregate mix with agglutinan	%	STN EN 12697-8	Výpočet	-				
Stekavosť/Flowidity ¹⁾ :	%	STN EN 12697-18	Hydrostatické váhy	-	-			
Teplota asfaltovej zmesi/Bitument temperatur:	°C	STN EN 12697-13	Teploměr	155	-			
Zrinitosť asfaltovej zmesi/Grading asphalt mixture:	%	STN EN 933-1	Sada sit/Sieve pack	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion			
				Sito/Sieve (mm)	Measured value	Hodnota/Value	Norma/Standard	
				22,4	98	90	100	PST-04/1
				11,2	71	60	77	
				2	33	26	40	
				0,5	14	10	19	
				0,063	6,1	3,2	9,2	


Krivka zrinitosti/Grading curve

Prepad/ Pass sieve (%)

Sito/Sieve (mm)

----- POŽADOVANÉ KRITÉRIUM/ASKED CRITERIUM -----

————— Nameraná/Measured —————

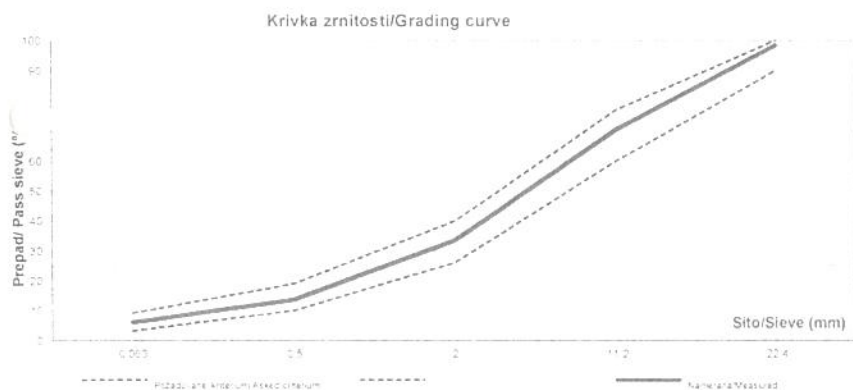

Prehlásenie :

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka:

1) - neakreditovaná činnosť

Edita Antalová Skúšať/Téstd by	Rastislav Kováčik - vedúci OL Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by	Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL
-----------------------------------	---	------------------------------------

číslo / number: 92/1/2017/10.21/BA

Denník č. / Number of dairy: 1/2017/10.21/BA

Protokol o skúške / Protocol about the test

MIERA ZHUTNENIA ASFALTOVÝCH VRSTIEV / MEASURE CONCRETION ASPHALTIC LAYER

Dodávateľ stavebných prác / Contractor of buildings works

Zákazník / Client: Doprastav a.s. závod Bratislava

Stavba/Buiding: Jaguar-Land Rover Nitra

Objekt/Object:

Konštrukcia/Construction:

Hr. úpravy - thickness modif:

SO 123-00

ložná vrstva

70 mm

Názov výrobku/Product name : AC 22 L PMB 45/80-75; I. PST-04/14

Výrobca/Manufacturer: Slovenské asfalty s.r.o.

Dátum skúšky/ Date of test :

22.11.2017

Dátum vystavenia / Date of issuance:

30.11.2017

Normy / Norms: STN EN 12 697-7 Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracované za horúca

Číslo SP/Number of TP:

10 21

Merací prístroj/Measuring instrument: Radiálny hutnomer TROXLER

Ev. karta meradla/Registration card of gauge:

BA46

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULTS OF TEST

korekcia / correction : 1.000

Poznámka: - Korelačný vzťah / korekcia - podiel objemovej hmotnosti skutočnej (vývrt) a objemovej hmotnosti nameranej radiačným hutnomerom.

[illegible]

Vyhodnotenie/Evaluation: podľa MDVRR SR TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi

Požadovaná hodnota - Required value

$$D_i (\%) \geq 97$$
$$\phi D (\%) \geq 98$$

Dosiadnutá $\emptyset D$ (%):

98.5

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správného charakteru). Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť len po písomnom súhlase skúšobného lektora.

Results from the test are in accordance with the test and they are not substituted by any documents. Report can be used complete her part can be used only after written consent of the laboratory.

Nastoty meraní su prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Ing. Jozef Hladný

Skušal/Tested by

Rastislav Kováčik - vedúci OL

Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

TECHNICAL ASSISTANCE
LUBOCHINSKY, A. G. & J. H. HARRIS
- 1984 -

Odlačok pečatky OL/Copy stamp RL



grastav a.s., Bratislava, Technický a skusobný servis
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Bratislava
Laboratórium Bratislava
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Protokol o skúške - Protocol about the test

SNAS

Reg. No. 060/S-094

číslo/number: 85/12017/10.27/BA
denník č./number of diary: 12017/10.27/BA

MIERA ZHUTNENIA A HRúbKA ASFALTOVÝCH VRSTVIE/MEASURE CONCRETION AND THICKNESS ASPHALTIC LAYER

Objednávateľ/Cient: Stavba/Building:	Doprastav a.s., závod Bratislava Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt/Object: Korštrukcia/Construction:	SO 123 ložná vrstva						
Stančenie/Stationing:	km 0,000 - 0,303	Odborný list/Markings of sample:	44/2017/AZ/BA						
Názov výrobku/Product name:	AC 22 L PMB 45/80-75; I; PST- 04/14	Hrúbka vrstvy/Thickness layer:	70 mm						
Výrobca/Manufacturer:	Slovenské Asfalty s.r.o	Dátum odberu/ Date of taking:	22.11.2017						
Miesto odberu/Excavation site:	stavba	Dátum skúšky/ Test date:	23.11.2017						
Odberač/ Sampler ¹⁾	Babic	Dátum vystavenia/Date of issuance:	23.11.2017						
Ev. karta meradla/Registration card of gauge: BA 14, BA 102									
Číslo SP/Number of TP: SP-10.12									
VÝSLEDKY SKUSOK/RESULT OF TESTS									
Číslo merania/ Measuring number	Miesto merania/ Measuring point	Objemová hmotnosť/Bulk density [Mg/m ³]		Miera zhutnenia/Measure concetion [%]		Hrúbka vrstvy/Thickness layer [mm]			
		Metóda merania/Test method STN EN 12697-6	Merací prístroj/Measuring instrument Hydrostatické váhy SARTORIUS	Nameraná hodnota/ Measured value	Hodnota z protokolu/Value of protocol Za dňa /from day	Nameraná hodnota/ Measured value	Merací prístroj/Measuring instrument Posuvné meradlo		
1.	km 0,050	Nameraná hodnota/ Measured value	2,430	2,462	20.11.2017	98,7	Metóda merania/Test method STN EN 12697-36	Nameraná hodnota/Measured value [mm] lokálna/local	Požadované kritérium/Asked criterion Norma/Standard
2.		2,425	2,462	20.11.2017	98,5	68,0	ø	ø h min. 0,90 h h min = 0,80 h	69,9
3.		2,436	2,462	20.11.2017	98,9	70,0	Di ≥ 97 ø ≥ 98	69,0	69,5
4.		2,421	2,462	20.11.2017	98,3	70,0	69,0	69,5	
5.	km 0,190	2,422	2,462	20.11.2017	98,4	71,0	69,0	71,0	70,0
6.		2,435	2,462	20.11.2017	98,9	69,0	69,5	71,0	71,5
7.		2,420	2,462	20.11.2017	98,3	70,0	69,0	71,0	70,0
8.		2,429	2,462	20.11.2017	98,7	69,0	69,5	71,0	70,0
9.	km 0,260	2,438	2,462	20.11.2017	99,0	STN 73 6121	69,0	69,5	70,0
10.		2,431	2,462	20.11.2017	98,7	69,0	69,5	71,0	71,5
11.		2,442	2,462	20.11.2017	99,2	71,0	69,0	71,0	70,0
12.		2,436	2,462	20.11.2017	98,9	70,0	69,0	71,0	70,0
								98,7	

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skusok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúsobného laboratória.
Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Nástroj meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu

Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť

Mária Senková

Skušal/Tested by

Rastislav Kovačik

Kontroloval/checked/Controlled by and approved by

Odberateľ/Collector

Odberateľ/Collector

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZEROUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRY NITRA Technická správa										
Dopravný ústav										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
22.11.2017	9/2/2017/10.19/NR	123		obrusná vrstva	rozbor	SMA 11 PmB 45/80-75; 05/14	1	ST	v súlade	v súlade
24.11.2017	75/1/2017/10.25/BA	123	km 0,000-0,303	obrusná vrstva	rovinatosť	SMA 11 PmB 45/80-75; 05/14	1	4	vyhovuje	vyhovuje
24.11.2017	129/1/2017/10.39/BA	123	km 0,000-0,303	obrusná vrstva	rovinatosť	SMA 11 PmB 45/80-75; 05/14		4	vyhovuje	vyhovuje
24.11.2017	93/1/2017/10.21/BA	123	km 0,030 - 0,300	obrusná vrstva	troxler	SMA 11 PmB 45/80-75; 05/14	5	min. 97%	98,5 - 99,1%	vyhovuje
22.11.2017	130/1/2017/10.36/ZA	123		obrusná vrstva	Odolnosť asf. zmesi proti trvalým def.	SMA 11 PmB 45/80-75; 05/14	1	ST	v súlade	v súlade
22.11.2017	155/1/2017/10.37/ZA	123		obrusná vrstva	citlivosť na vodu	SMA 11 PmB 45/80-75; 05/14	1	ST	v súlade	v súlade

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo/number: 9/2/2017/10.19/NR
 denník č./number of diary: 2/2017/10.19/BA


ROZBOR ASFALTOVEJ ZMESI/ASPHALTIC MIXTURE ANALYSIS

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberateľ/Customer: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba/Buiding: Jaguár Land Rover - Nitra	Objekt/Object: SO 123
Staničenie/Stationing: neudané	Konštrukcia/Construction: obrusná vrstva
Názov výrobku/Product name: SMA 11 PMB 45/80-75; PST-05/14	Označenie vzorky/Markings of sample: 9/2017/AZ/NR
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu/ Date of taking: 22.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum skúšky/ Test date: 22.11.2017
Odobral/ Sampler ¹⁾ : objednávateľ	Dátum vystavenia/Date of issuance: 22.11.2017
	Teplota zmesi/Mixture temperature: 174°C
Číslo SP/Number of TP: SP-10.19, SP- 10.11, SP- 10.12, SP-10.40	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: BA15, BA70A-70K,BA109, BA103 BA105, BA19, BAZ101, BAS2, BAZ100, BA128, sada sit BA70/K, DHM 79280

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion	Norma/Stand
Obsah asfaltu po extrakcii/Bitumen content of soluble bind:	%	STN EN 12697-1	Automat. analyzátor	6,5	6,7 (±0,3)	PST-05.1
Objemová hmotnosť/Bulk density:	Mg/m ³	STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy	2,408		
Max. objemová hmotnosť/Max. bulk density:	Mg/m ³	STN EN 12697-5	Pyknometer	2,490		
Medzerovitost' vo vode/Air voids in water:	%	STN EN 12697-8	Vypočet	3,3	2,5 - 4,5	
Percento medzier v zmesi kameniva vyplnených spojivom VFB Rate of gap in aggregate mix with agglutinan	%	STN EN 12697-8	Vypočet	82,5		
Stekavosť/Flowidity ¹⁾ :	%	STN EN 12697-18	hydrostatické váhy	0,2	0,3	
Teplota asfaltovej zmesi/Bitument temperature:	°C	STN EN 12697-13	Teplomér	155	-	
Zrinitosť asfaltovej zmesi/Grading asphalt mixture:	%	STN EN 933-1	Sada sit/Sieve pack	Nameraná hodnota/ Measured value	Požadované kritérium/Asked criterion	

Sito/Sieve (mm)	Measured value	Hodnota/Value	Norma/Stand
11	96	90	100
4	41	33	47
2	25	23	35
0,5	12	11	18
0,063	7,7	6,3	10,3

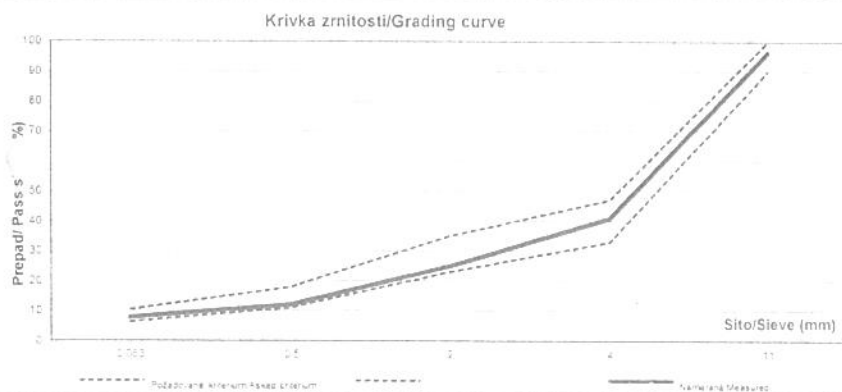

Prehlásenie :

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu

Poznámka:

1) - neakreditovaná činnosť

Edita Antalová
 Skúšal/Tester by

Rastislav Kováčik - vedúci OL
 Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ SERVIS
 Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
 Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp PL

číslo/number 75/1/2017/10.25/BA

deník č./number of diary: 1/2017/10.25:BA

Protokol o skúške - Certificate of test:

POZDĚŽNA NEROVNOST POVRCHU VOZOVKY / IRREGULARITY SURFACE OF BASIS LAYERS

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Odberateľ/Customer:	
Stavba/Buiding:	Priprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt/Object:	SO 123-00
Staničenie/Stationing:	km 0,000-0,303	Konštrukcia/Construction:	obrusná vrstva
Názov výrobku/Product name:		Povet. podm./Atm. Conditions:	7°C
Výrobca/Manufacturer:	Slovenské asfalty s.r.o.	Dátum skúšky/ Test date:	24.11.2017
		Dátum vystavenia/Date of issuance	30.11.2017
Metóda merania/Test method:	STN 73 6176	Číslo SP/Number of TP:	10.25
Merací prístroj/Measuring instrument:	PLANOGRAF 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	BA48

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Nerovnost/Irregularity [mm]

[illegible]

STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy

max.
4 mm

Vyhodnotenie/Evaluation : podľa STN 736121 Stavba vozoviek, Hutnené asfaltové vrstvy

Prehlásenie/Resolution

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase vedúceho OČ.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete. Her part can be used only after written consent of the head of O.

Marek Babic
Skušal/ Tested by

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY / IRREGULARITY SURFACE STRUCTURAL LAYER

Objednávateľ/Client:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Odberateľ/Customer:	
Stavba/Buiding:	Nitra Jaguar - Land Rover	Objekt/Object:	SO 123-00
Staničenie/Stationing:	km 0,000-0,303	Konštrukcia/Construction:	obrusná vrstva
Názov výrobku/Product name:	SMA 11 PMB 45/80-75; PST-05/14	Povet. podm./Atm. Conditions:	6°C
Výrobca/Manufacturer:	Slov. asfalty - Senec	Datum skúšky/ Test date:	24.11.2017
		Datum vystavenia/Date of issuance:	30.11.2017
Metóda merania/Test method:	STN EN 13036-7	Číslo SP/Number of TP:	SP-10.39
Merací prístroj/Measuring instrument:	Lata dĺžky 3 m	Ev. karta meradla/Registration card of gauge:	BA 43

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULT OF TESTS

Priečna nerovnosť/Cross irregularity [mm]

Číslo merania/ Measuring number	Miesto merania/ Measuring point	Priečny smer - strana/Cross line - side			Číslo merania/ Measuring number	Miesto merania/ Measuring point	Priečny smer - strana/Cross line - side			Požadované kritérium/Asked criterion	
		prava/right	stred/centre	ľava/left			prava/right	stred/centre	ľava/left	Hodnota/Value	Norma/Standard
SO 123 pravá strana					SO 123 ľavá strana					max 4 mm STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy	
1	km 0,040	0	1	1	1	km 0,040	2	1	2		
2	km 0,080	2	1	2	2	km 0,080	2	1	0		
3	km 0,120	1	1	1	3	km 0,120	3	3	0		
4	km 0,160	2	0	1	4	km 0,160	1	2	1		
5	km 0,200	0	2	2	5	km 0,200	2	3	2		
6	km 0,240	3	1	0	6	km 0,240	2	2	3		
7	km 0,280	2	2	2	7	km 0,280	3	0	1		
8	km 0,300	2	2	1	8	km 0,300	2	2	0		

Vyhodnotenie/Evaluation: podľa STN 736121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy

Prehlásenie/Resolution:

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. TESS
 Výsledky meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Marek Babic Skúšal/Tested by	Rastislav Kováčik - vedúci OL Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by	Odťahok pečiatky OL/Copy stamp RL
---------------------------------	---	-----------------------------------



SNAS

Req. No. 060/S-094

Dennik č. / Number of dairy: 1/2017/10.21/BA

Protokol o skúške / Protocol about the test

MIERA ZHUTNENIA ASFALTOVÝCH VRSTIEV / MEASURE CONCRETION ASPHALTIC LAYER

40 mm

Dátum vystavenia / Date of issuance: 30.11.2017

Ev. karta meradla/Registration card of gauge: BA46

VÝSLEDKY SKÚŠOK/RESULTS OF TEST

korekcia / correction : 1.000

Poznámka: - Korelačný vzťah / korekcia - podiel objemovej hmotnosti skutočnej (vývrt) a objemovej hmotnosti nameranej radiačným hutnomerom.

[illegible]

Dosiahnutá ϕD (%): 98,8

Nastotni merani su pristupne u vodećem laboratoriju a su vypočítané na základe interného prepisu

Skušal/Tested by *lv*

Kontroloval a schválil/Controlled by and approved by

Odtlačok pečiatky OL/Copy stamp RL



Doprastav a.s., Bratislava, Technický a skúšobný servis

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Oblasť laboratórií Žilina, Laboratórium Žilina

Štrková 17, 010 01 Žilina



SNAS

Reg. No. 060/S-094

Protokol o skúške - Protocol about the test

číslo/number 1301/2017/10.36/ZA

denník č./number of diary 1/2017/10.36/ZA

CITLIVOSŤ ASFALTOVEJ ZMESI NA VODU / DETERMINATION OF THE WATER SENSITIVITY OF BITUMINOUS SPECIMENS

Objednávateľ/Cliet: Doprastav a.s. závod Bratislava	Odberteľ/Customer: Doprastav a.s. závod Bratislava
Stavba/Site/Project: Jaguar Land Rover	Objekt/Object: SO: 123-00
Staničenie/Chainage: km 0,000 - 0,303	Konštrukcia/Construction: obrusná vrstva
Názov výrobku/Product name: SMA 11 PMB 45/80-75; I; PST- 05/14	Použitie/Application: obrusná vrstva
Výrobca/Manufacturer: OS Senec	Dátum odberu/ Date of taking: 22.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum výroby vzoriek/Date of manufacture samples: 26.11.2017
Odobrat'j/ Sampler'j: objednávatel'	Dátum skúšky/ Date tested: 27.11. - 30.11.2017
Odborný listok/Markings of sample: 330/2017/AZ/ZA (9/2017/AZ/NR)	Dátum vyslavenia/Date reported: 30.11.2017
Číslo SP/Number of TP: SP-10.36	Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZA 4, ZA 6, ZA 21, ZA 29, ZA 32, ZA 101

VÝSLEDKY SKUSOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia	Jednotka/ Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Test equipment	Nameraná hodnota/Measured value		Požadované kritérium/Asked criterion	
				Ø		Hodnota/Value	Norma/Standard
Pevnosť v priečnom ťahu suchých telies ITSd: Strenght in transverse pull of dry samples	kPa	STN EN 12697-23	Marshallov lis InfraTest	1 279,9	1307,0		
Pevnosť v priečnom ťahu mokrych telies ITSr: Strenght in transverse pull of wet samples	kPa	STN EN 12697-23	Marshallov lis InfraTest	1 167,8	1194,5		
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr: Ratio of strenghts in transverse pull	%	STN EN 12697-12/O1		91,4	min.80,0		KLAZ III/1

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Tested in accordance with the above test method. Test report could be reproduced only completely. reproduction in parts is subjected to a permit of the laboratory.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť

Ing. Lukáš Jachym
Skúšan/ Tested by

Ing. Juraj Bútora

Kontroloval/ a schválil/ Controlled by and approved by



Doprastav a.s.

TECHNICKÝ A SKUSOBNÝ SERVIS
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
- 0911 -

Odtlačok pečiatky O/Copy stamp RL

F-SP-10.36

ODOLNOSŤ ASFALTOVEJ ZMESI PROTI TRVALÝM DEFORMÁCIÁM ASPHALT MIXTURE RESISTANCE TO PERMANENT DEFORMATION

Objednávateľ/Client: Doprastav a.s., závod Bratislava	Objekt/Object: 123-00
Stavba/Building: Jaguar Land Rover Nitra	Konštrukcia/Construction: obrusná vrstva
Staničenie/Stationing: km: 0,000 - 0,303	Použitie/Application: obrusná vrstva
Názov výrobku/Product name: SMA 11 PMB 45/80-75; I; PST-04/15	Dátum odberu/ Date of taking: 22.11.2017
Výrobca/Manufacturer: Slovenské Asfalty, OS Senec	Dátum výroby vzoriek/ Date of marking sample: 30.11.2017
Miesto odberu/Excavation site: stavba	Dátum skúšky/ Test date: 7.12.2017
Odborný listok/Markings of sample: 330/2017/AZIZA (9/2017/AZINR)	Dátum vystavenia/Date of issuance: 8.12.2017
Ev. karta meradla/Registration card of gauge: ZA74	

Číslo SP/Number of TP: SP-10.37

VÝSLEDKY SKÚSOK/RESULT OF TESTS

Technická špecifikácia/Technical specification	Jednotka/Unit	Metóda merania/ Test method	Merací prístroj/ Measuring instrument	Nameraná hodnota/Measured value		Požadované kritérium/Asked criterion	
				vz. č. 1./sample nr. 1	vz. č. 2./sample nr. 2	Hodnota/Value	Norma/Standard
Hĺbka vyjadzenej koľaje RD _{AIR} :	mm	STN EN 12697-22 +A1 2008	Spurtest	2,0	2,0	-	KLAZ III/1
Pomerná hĺbka vyjadzenej koľaje PRD _{AIR} :	%	skúšané na zariadení malých rozmerov, postup B na vzduchu		4,9	4,8	PRD _{AIR} 5,0	
Sklon vyjadzenej koľaje WTS _{AIR} :	mm/10 ³ zat. cyklov			0,05	0,04	WTS _{AIR} 0,10	

Doplňujúce údaje/Subsidiary data:

Objemová hmotnosť/Bulk density	2,408 Mg/m ³	Obsah asfaltu/Bitumen content/	-
Miera zhutnenia vzorky/Measure concretion of sample	98 [%]	Hrúbka vzorky/Thickness layer	41 [mm]
Teplota pri skúške/Temperature at test	50 [°C]	Teplota pri výrobe vzorky/Temperature at production sample	160 [°C]

Prehlásenie/Resolution:

Výsledky skúšok sa týkajú presnosti skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len vtedy, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents. Report can be used only after written consent of the laboratory.

Neustály merania sú prístupné a vedúceho laboratória a sú vypracované na základe interného postupu.

Poznámka: 1) - neakreditovaná činnosť

Dušan Mendel

Ing. Juraj Bútora - vedúci OL

Kontroloval a schválil/controlled by and approved by

Doprastav


Doprastav a.s. - SKÚŠOBNÝ SERVIS
TECHNICKÝ LABORÁTORIUM ŽILINA
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
F-SP 10.37

Wheel tracking

EN 12697-22 (Procedure B)

Name of test 155/1/2017/10.37/ZA
 line 2 SMA 11 PMB 45/80-75; PST 04/15
 line 3 Jaguar Land Rover Nitra
 line 4 SO: 123-00
 line 5 Slovenske Asfalty s.r.o., OS Senec
 line 6 OH: 2,408 Mg/m³
 line 7 odber: 22.11.2017
 line 8 vzorka: 30.11.2017
 line 9 skuska: 7.12.2017
 line 10 l=41 mm; p=41 mm

Sample	Wheel-tracking slope [mm/1000 cycles]	Wheel-tracking slope (linear part) [mm/1000 cycles]	Rut depth [mm]	prop. rut depth [%]
Left	0.05 (d10000-d5000)	0.05 (d8250-d6250)	2.0 (d10000)	4.9 (d10000)
Right	0.04 (d10000-d5000)	0.03 (d9850-d7850)	2.0 (d10000)	4.8 (d10000)
Average value	0.04	0.04	2.0	4.8

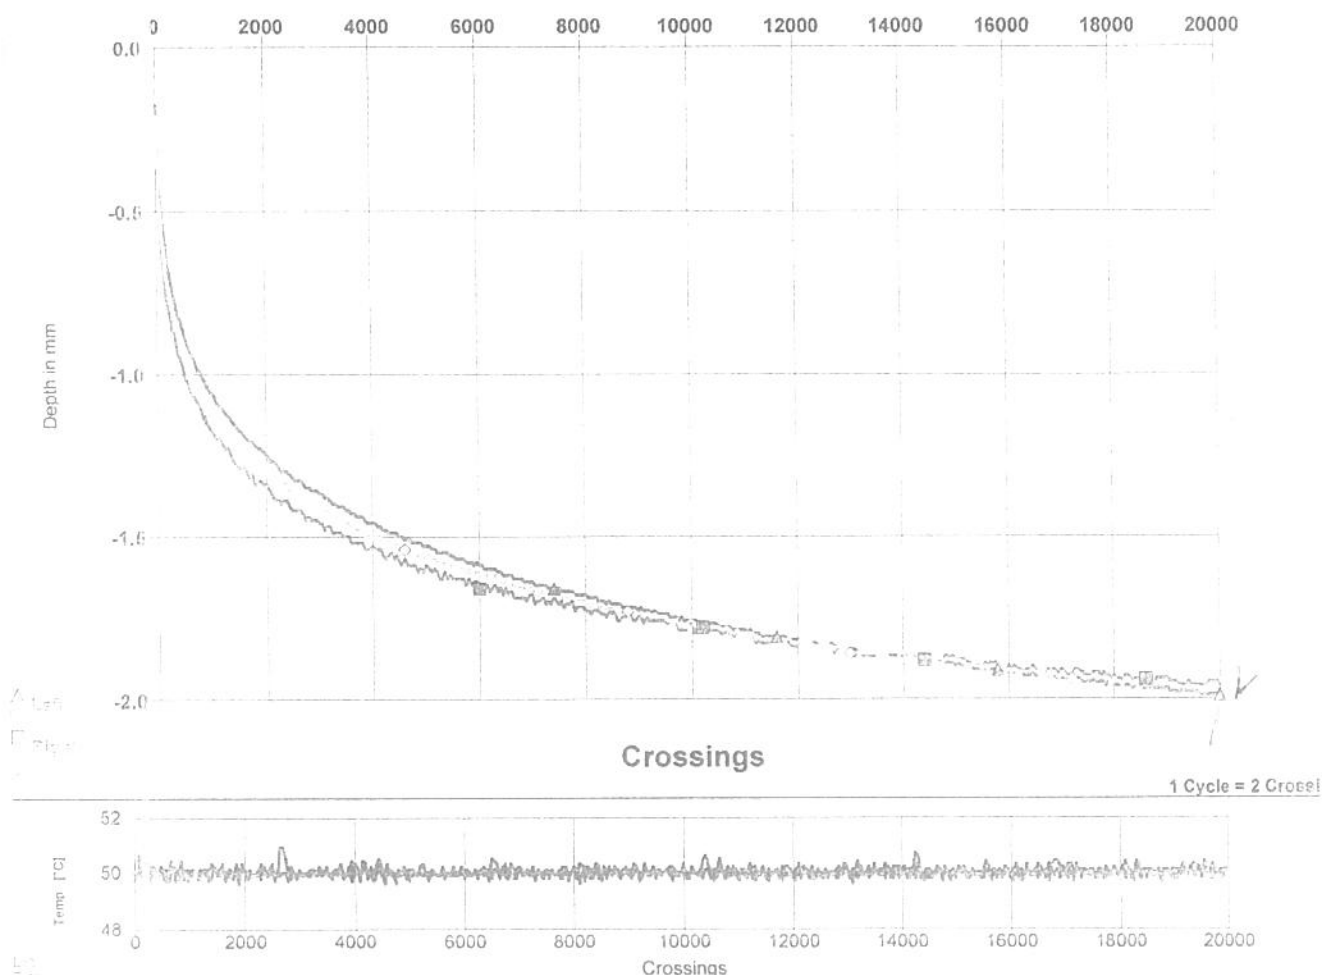

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

ZODIJE NIE INFRAŠTRUKTURA NITRA DOPRAVNÝ INŽENIERING										
Dopravoskúter										
STRABAG										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
2.6.2018	15a2/1/2018/10.21/BA	123	chodník	obrusná vrstva	troxler	AC 8 O 50/70,II	3	min. 97%	98,3 - 98,9%	vyhovuje
1.6.2018	22/1/2018/10.25/BA	123	chodník	obrusná vrstva	rovinatosť	AC 8 O 50/70,II	úsek	4	0 - 4mm	vyhovuje
1.6.2018	39/1/2018/10.25/BA	123	chodník	obrusná vrstva	rovinatosť	AC 8 O 50/70,II	úsek	4	0 - 4mm	vyhovuje
22.5.2018	134/2/2018/10.19/NR	123		obrusná vrstva	rozbor	AC 8 O 50/70,II	1	ST	v súlade	v súlade

Protokol o skúške
MIERA ZHUTNENIA ASFALTOVÝCH VRSTIEV

Dodávateľ:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Objekt:	SO 123 chodník pre peších
Objednávateľ:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Konštrukcia:	obrusná vrstva
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	hrúbka úpravy:	40 mm
Staničenie:	km 0,000-0,300	Dátum skúšky:	26.2.2018
Názov výrobku:	AC 8 O 50/70, II, 01/2017	Dátum vystavenia:	26.2.2018
Výrobca:	Slovenské Asfalty s.r.o. OS Senec		
Normy: STN EN 12697-7 Asfaltové zmesi Skúšobné metódy pre asf. zmesi skúšané za horúca Časť 7: Stanovenie obj. hmotnosti asfaltovej zmesi pomocou lúčov gama			
Merací prístroj:	Radiačný hutnomer TROXLER	Číslo SP:	SP-1024
		Evidenčná karta meradla:	BA 32

VÝSLEDKY SKÚŠOK

korekcia										1 000
číslo m.	Miesto	staničenie	Objemová hmotnosť[kg/m³]							D [%]
			Nameraná hodnota					po korekcii	Marshall sk.	Nameraná hodnota
			1.	2.	3.	4	Φ			
1	miesto č.1	km 0,035 v ľavo	2422	2419	2427	2422	2423	2430	2456	98,6
2	miesto č.2	km 0,205 v pravo	2418	2409	2411	2418	2414	2421	2456	98,6
3	miesto č.3	km 0,210 v ľavo	2405	2410	2412	2406	2408	2415	2456	98,6

Vyhodnotenie: STN73 6121 Stavba vozoviek - Hutnené asfaltové vrstvy
Požadovaná hodnota D (%) : min. 97
Dosažená Ø D [%] 98,6
Ø D (%): min. 98

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru). Protokol môže byť reprodukovany len celkovo a s týmto súhlasom skúšobného laboratória.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.



TESScontrol, s. r. o.

Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Marek Babic
Skúšal

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontroloval a schválil

Odtlačok pečiatky OL



TESScontrol, s.r.o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Bratislava, Laboratórium Bratislava
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava

Protokol o skúške

číslo: 22/1/2018/10.25/BA
denník číslo: 1/2018/10.25 BA

NEROVNOSŤ POVRCHU PODKLADNÝCH VRSTIEV

Objednávateľ:	Doprastav a.s.Bratislava, závod Bratislava	Odberateľ:	
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt:	SO 123 chodník pre peších
Staničenie:	km 0,000-0,300 Ľ + P strana	Konštrukcia:	obrusná vrstva
Názov výrobku:	AC 8 O PMB 50/70 ;II-01/2017	Poveternostné podmienky:	24 °C
Výrobca:	Slovenské asfalty s.r.o.	Dátum skúšky:	1.6.2018
		Dátum vystavenia:	5.6.2018
Metóda merania:	STN 736176	Číslo SP:	SP-10.25
Merací prístroj:	Planograf 3 m	Evidenčná karta meradla:	BA 48

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Nerovnosť [mm]

Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Číslo nerovnosti	Miesto nerovnosti	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
									Hodnota	Norma
SO 123 km 0,000-0,300 ľavá strana			SO 123 km 0,000-0,300 ľavá strana						max 4 mm	STN 736121 Stavba vozoviek. Hrubé asfaltové vrstvy
1	km 0,014	4	1	km 0,095	4	30	km 0,222	4		
2	km 0,017	4	2	km 0,099	4	31	km 0,226	4		
3	km 0,020	4	3	km 0,103	4	32	km 0,230	4		
4	km 0,023	4	4	km 0,107	4	33	km 0,234	4		
5	km 0,026	4	5	km 0,111	4	34	km 0,238	4		
6	km 0,029	4	6	km 0,115	4	35	km 0,242	4		
7	km 0,032	4	7	km 0,119	4	36	km 0,246	4		
8	km 0,035	4	8	km 0,123	4	37	km 0,250	4		
9	km 0,038	4	9	km 0,127	4					
10	km 0,041	4	10	km 0,131	4					
11	km 0,044	4	11	km 0,135	4					
12	km 0,047	4	12	km 0,139	4					
13	km 0,050	4	13	km 0,143	4					
14	km 0,113	4	14	km 0,147	4					
15	km 0,116	4	15	km 0,151	4					
16	km 0,119	4	16	km 0,155	4					
17	km 0,122	4	17	km 0,159	4					
18	km 0,125	4	18	km 0,163	4					
19	km 0,128	4	19	km 0,167	4					
20	km 0,131	4	20	km 0,171	4					
21	km 0,134	4	21	km 0,175	4					
22	km 0,137	4	22	km 0,179	4					
23	km 0,140	4	23	km 0,183	4					
24	km 0,143	4	24	km 0,187	4					
25	km 0,146	4	25	km 0,191	4					
26	km 0,149	4	26	km 0,195	4					
27	km 0,152	4	27	km 0,199	4					
			28	km 0,203	4					
			29	km 0,207	4					

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).

Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Nesúhlas meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka: V protokole sú zaznamenané najvyššie namerané hodnoty na celom úseku. Ostatné namerané hodnoty neprekročili hodnotu 4 mm.



Marek Babio
Skušal

Rastislav Kováčik - vedúci OL
Kontrolovať a schvaľiť

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava
Odtlačok 22/1/2018/10.25/BA

Protokol o skúške

číslo: 39/1/2018/10.39/BA
 denník číslo: 1/2018/10.39/BA

NEROVNOSŤ POVRCHU KONŠTRUKČNEJ VRSTVY

Objednávateľ:	Doprastav a.s. závod Bratislava	Odberateľ:	
Stavba:	Priprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra	Objekt:	SO 123 chodník pre peších
Staničenie:	km 0,000-0,300 Ľ + P strana	Konštrukcia:	obrusná vrstva
Názov výrobku:	AC 8 0 PMB 50/70, II PST-01/2017	Poveternostné podmienky:	24°C
Výrobca:	Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum skúšky:	1.6.2018
		Dátum vystavenia:	5.6.2018
Metóda merania:	STN EN 13036-7	Číslo SP:	SP-10.39
Merací prístroj:	3 m lata klin	Evidenčná karta meradla:	BA 43, BA 126

VÝSLEDKY SKUŠOK

Priečna nerovnosť [mm]

Číslo merania	Miesto merania	Priečny smer - strana			Číslo merania	Miesto merania	Priečny smer - strana			Požadované kritérium	
		pravá	stred	ľavá			pravá	stred	ľavá	Hodnota	Norma
km 0,000-0,300 pravá strana					km 0,000-0,300 ľavá strana					max. 4,0 mm	STN 736121 Stavba vozoviek. Hrubé asfaltové vrstvy
1	km 0,000		1		1	km 0,000		4			
2	km 0,040		3		2	km 0,040		1			
3	km 0,080		3		3	km 0,080		1			
4	km 0,120		1		4	km 0,120		0			
5	km 0,160		0		5	km 0,160		0			
6	km 0,200		0		6	km 0,200		0			
7	km 0,240		2		7	km 0,240		1			
8	km 0,280		2		8	km 0,280		-1			

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. právneho charakteru).
 Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
 Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Protokol o skúške

Číslo: 134/2/2018/10.19/BA
denník č: 2/2018/10.19/BA

ROZBOR ASFALTOVEJ ZMESI

Objednávateľ: Doprastav a.s., závod Bratislava	Odberateľ: Doprastav a.s., závod Bratislava
Stavba: Jaguar Land Rover	Objekt: SO 122/123
Staničenie: neudané	Konštrukcia: obrusná vrstva
Názov výrobku: AC 8 O 50/70; II; 01/2017	Označenie vzorky: 134/2018/AZ/SC
Výrobca: Slovenské Asfalty s.r.o.	Dátum odberu: 22.5.2018
Miesto odberu: stavba	Dátum skúšky: 23.5.2018
Odobral: objednávateľ	Dátum vystavenia: 24.5.2018
	Teplota zmesi: 170°C
Číslo SP: SP-10.19, SP-10.11, SP-10.12, SP-10.40	Ev. karta meradla: BA15, BA70A-70K, BA109, BA103 BA105, BA19, BAZ101, BAS2, BAZ100, BA128, sada sit BA70/K, DHM 79280

VÝSLEDKY SKÚŠOK


VÝSLEDKY SKUSOK

Technická špecifikácia:	Jednotka	Metóda merania	Merací prístroj	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
					Hodnota	Norma
Obsah asfaltu po extrakcii:	%	STN EN 12697-1	Automat. analyzátor	5,7	5.9 (± 0,3)	Vyhlásenie parametrov 01/2017
Objemová hmotnosť:	Mg/m ³	STN EN 12697-6	Hydrostatické váhy	2,456		
Max. objemová hmotnosť:	Mg/m ³	STN EN 12697-6	Pyknometer	2,547		
Medzerovitost' vo vode:	%	STN EN 12697-8	Vypočet	3,6	2,5 - 4,5	
Percento medzier v zmesi kameniva vyplnených spojivom VFB	%	STN EN 12697-8	Vypočet	79,4	72-83	
Stekavosť ¹⁾ :	%	STN EN 12697-16	Hydrostatické váhy	-	-	Vyhlásenie parametrov 01/2017
Teplota asfaltovej zmesi:	°C	STN EN 12697-13	Termomer	150	-	
Zrornosť asfaltovej zmesi:	%	STN EN 933-1	Sada sit	Nameraná hodnota	Požadované kritérium	
				Sito (mm)	Hodnota	Norma
				8	96	90 100
				4	61	60 74
				2	40	35 46
				1	27	21 29
				0,063	8,3	5,6 9,6

Krivka zrornosti

Prepät (%)

Site (mm)

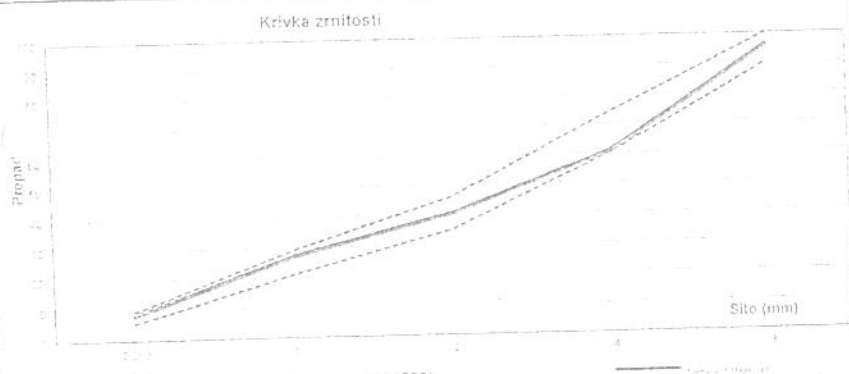

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).
Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.
Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Poznámka:

1) - neakreditovaná činnosť

Priprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Dátum odberu	ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA OPRAVY A VÝBUDOVY Dopravný ústav STRABAG							Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	
30.7.2018	113/5/2018/2.8/ZV	123	0,00-0,200	zemná krajnica	LDD	ŠD	6	70MPa	130,1 - 153,6 Mpa
30.7.2018	114/5/2018/2.8/ZV	123	0,00-0,200	nespevnená krajnica	LDD	ŠD	6	90MPa	107,4-142,3MPa



TESScontrol, s.r.o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronska 1, 960 93 Zvolen



Protokol o skúške

číslo: 113/5//2018/2.8/ZV
denník číslo: 5/2018/2.8/ZV

ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA DYNAMICKOU DOSKOU

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00
Staničenie:	km: 0,000 - 0,200 PS LS	Konštrukcia:	zemná krajnica
Skúšaný materiál:	ŠD	Poveternostné podmienky:	polojasno 30°C
Z lokality:	Pohranice	Dátum skúšky:	30.7.2018
Frakcia:	0/63	Dátum vystavenia:	31.7.2018
Metóda merania:	STN 73 6192	Číslo SP:	SP-2.8
Merací prístroj:	ľahká dynamická doska	Evidenčná karta meradla:	ZV 1010

Technické údaje - metóda merania :

kalibrácia dynamickej dosky podľa statickej zaťažovacej skúšky na základe STN 73 6133

korelácia pre daný typ sypaniny - prepočítavci vzťah $E_{def} = E_{vd} \cdot 2,4$

Prepočítavací koeficient bol stanovený na základe statickej zaťažovacej skúšky zo dňa 30.1.2018 č. 34-37/5/2018/2.2/ZV

VÝSLEDKY SKÚŠOK

číslo skúšky-dátum	miesto merania	dynamický modul deformácie E_{vd} (MPa)	modul deformácie E_{def} (MPa)	vyhodnotenie
30.7.2018	km: 0,035 LS	63,9	153,4	vyhovuje
	km: 0,035 PS	58,8	141,1	vyhovuje
	km: 0,115 LS	60,4	145,0	vyhovuje
	km: 0,115 PS	54,2	130,1	vyhovuje
	km: 0,175 PS	57,6	138,2	vyhovuje
	km: 0,175 LS	61,1	146,6	vyhovuje

Vyhodnotenie:

Požadované hodnoty :

$$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 70,0$$

$$E_{vd} \text{ (Mpa)} \geq 29,2$$

Kontrolovaná vrstva vyhovuje požiadavkám PD.

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahradzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).

Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak Skúšal	Jozek Kontroloval a schválil	 TESScontrol, s. r. o. Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava Podlažok pečiatky
----------------------	-------------------------------------	--



TESScontrol, s.r.o.
Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Oblasťné laboratórium Zvolen, Laboratórium Zvolen
Hronska 1, 960 93 Zvolen



Protokol o skúške

číslo: 114/5/2018/2.8/ZV
denník číslo: 5/2018/2.8/ZV

ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA DYNAMICKOU DOSKOU

Objednávateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	Odberateľ:	ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Stavba:	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Objekt:	123-00
Staničenie:	km: 0,000 - 0,200 LS PS	Konštrukcia:	nespevnená krajnica
Skúšaný materiál:	ŠD	Poveternostné podmienky:	polojasno 30°C
Z lokality:	Pohranice	Dátum skúšky:	30.7.2018
Frakcia:	0/22	Dátum vystavenia:	31.7.2018
Metóda merania:	STN 73 6192	Číslo SP:	SP-2.8
Merací prístroj:	ľahká dynamická doska	Evidenčná karta meradla:	ZV 1010

Technické údaje - metóda merania :

kalibrácia dynamickej dosky podľa statickej zaťažovacej skúšky na základe STN 73 6133

korelácia pre daný typ sypaniny - prepočítavci vzťah $E_{def} = E_{vd} \cdot 2,2$

Prepočítavci koeficient bol stanovený na základe statickej zaťažovacej skúšky zo dňa 7.3.2018 č. 151/5/2018/2.2/ZV

VÝSLEDKY SKÚŠOK

číslo skúšky-dátum	miesto merania	dynamický modul deformácie E_{vd} (MPa)	modul deformácie E_{def} (MPa)	vyhodnotenie
30.7.2018	km: 0,025 PS	48,8	107,4	vyhovuje
	km: 0,050 LS	50,2	110,4	vyhovuje
	km: 0,075 LS	52,6	115,7	vyhovuje
	km: 0,100 PS	49,1	108,0	vyhovuje
	km: 0,175 PS	64,7	142,3	vyhovuje
	km: 0,190 LS	55,8	122,8	vyhovuje

Vyhodnotenie:

Požadované hodnoty :

$$E_{def2} \text{ (Mpa)} \geq 90,0$$

$$E_{vd} \text{ (Mpa)} \geq 40,9$$

Kontrolovaná vrstva **vyhovuje** požiadavkám PD

Prehlásenie:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru).

Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase skúšobného laboratória.

Neistoty meraní sú prístupné u vedúceho laboratória a sú vypočítané na základe interného predpisu.

Zošiak		Jozek		
	Skúšal		Kontroloval a schválil	TESScontrol, s.r.o. Lubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Centrálny laboratórny denník

Dátum odberu	Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra						Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál				
20.9.2017	NR-271/17	123		kanalizácia - obetónovanie	pevnosť po 28 dňoch	C 16/20 XC1	1	min 20 Mpa	22,9 Mpa	Vyhovuje
18.10.2017	NR-279/17	123		kanalizácia - obetónovanie	pevnosť po 28 dňoch	C 16/20 XC1	1	min 20 Mpa	23,4 Mpa	Vyhovuje

PROTOKOL č.: NR-271/17

o skúške pevnosti v tlaku a objemovej hmotnosti zatvrdnutého betónu na kockách

Údaje o odobratých vzorkách:

Objednávateľ sk.: ALAS SLOVAKIA

Miesto odberu : betónáreň Nitra

Odberateľ betónu : Doprastav a.s.

Vzorky zhotovil: Marek M.

Účel skúšky: plánovaná

Stav povrchu vzoriek v čase skúšky: vlhký

Kód betónu: 2030162301

Stavba: Strategický park Nitra

Konštrukcia: SO 123 - kanalizácia

Dátum výroby: 20.09.2017

Dátum dodania do laboratória: 24.09.2017

Dátum skúšky: 11.10.2017

Vek skúšobného telesa: 28 dní

Označenie betónu: **betón STN EN 206 – C16/20 XC1 (SK), Dmax 16-S3**

Konzistencia: 150 mm

Teplota betónu: 15,2 °C

Obsah vzduchu:

Použité normy: STN EN 12390-3 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies
STN EN 12390-7 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu

Odchýlky od normového postupu: bez

odchýlok Použité zariadenia:

názov	rozsah
Silomerný stroj Ratio TEC	(200-3000) kN
Elektronická váha	do 30 kg
Posuvné meradlo digitálne	(0-200) mm

Poznámka: Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných predmetov. Tento protokol nie je schválením skúšaného výrobku skúšobným laboratóriom ani iným orgánom. Bez písomného súhlasu laboratória sa nesmie protokol reprodukovat' inak ako celý.

Výsledky skúšky:

Číslo vzorky	Rozmery			Hmotnosť	Obj. hmotnosť	Tlačná sila	Pevnosť v tlaku	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg.m ⁻³]	[kN]	[N.mm ⁻²]	
	Tlačná plocha							
	d ₁	d ₂	d ₃	m _s	D _s	F	f _c , cube	
271-1	150,1	150,1	150,0	7,856	2300	535	23,8	22,9
271-2	150,0	150,2	150,0	7,838	2312	505	22,4	
271-3	150,1	150,1	150,0	7,800	2310	505	22,4	

Vyhodnotenie:

Priemerná kocková pevnosť v tlaku po zaokrúhlení výsledku je

22,9 N.mm⁻²

Skúšku vykonal: Slavomír Fico

Dňa: 30.10.2017

Kontroloval a schválil:

Monika Jančígová
manažér kvality výroby

PROTOKOL č.: NR-279/17

o skúške pevnosti v tlaku a objemovej hmotnosti zatvrdnutého betónu na kockách

Údaje o odobratých vzorkách:

Objednávateľ sk.: ALAS SLOVAKIA

Miesto odberu : betonáreň Nitra

Odberateľ betónu : Doprastav a.s.

Vzorky zhotovil: Marek M.

Účel skúšky: plánovaná

Stav povrchu vzoriek v čase skúšky: vlhký

Kód betónu: 2030162301

Stavba: Strategický park Nitra

Konštrukcia: Kanalizácia SO 123

Dátum výroby:

18.10.2017

Dátum dodania do laboratória:

28.10.2017

Dátum skúšky:

30.11.2017

Vek skúšobného telesa:

28 dní

Označenie betónu: **betón STN EN 206 – C16/20 XC1 (SK), Dmax 16-S3**

Konzistencia: 140 mm

Teplota betónu:

12,8 °C

Obsah vzduchu:

7 Použité normy: STN EN 12390-3 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies

STN EN 12390-7 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu

Odchýlky od normového postupu: bez

odchýlok Použité zariadenia:

názov	rozsah
Silomerný stroj Ratio TEC	(200-3000) kN
Elektronická váha	do 30 kg
Posuvné meradlo digitálne	(0-200) mm

Poznámka: Výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných predmetov. Tento protokol nie je schválením skúšaného výrobku skúšobným laboratóriom ani iným orgánom. Bez písomného súhlasu laboratória sa nesmie protokol reprodukovat' inak ako celý.

Výsledky skúšky:

Číslo vzorky	Rozmery			Hmotnosť	Obj. hmotnosť	Tlačná sila	Pevnosť v tlaku	
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg.m ⁻³]	[kN]	[N.mm ⁻²]	
	Tlačná plocha							
	d ₁	d ₂	d ₃	m _s	D _s	F	f _{c, cube}	
279-1	150,0	150,1	150,0	7,806	2308	545	24,2	23,4
279-2	150,0	150,1	150,0	7,842	2300	510	22,7	
279-3	150,1	150,1	150,0	7,815	2299	525	23,3	

Vyhodnotenie:

Priemerná kocková pevnosť v tlaku po zaokrúhlení výsledku je

23,4 N.mm⁻²

Skúšku vykonal: Slavomír Fico

Dňa: 30.11.2017

Kontroloval a schválil:

Monika Jančígová
manažér kvality výroby

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



3. VYHODNOTENÉ KSP, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/014

Stavba: Príprava strategického parku Nitra
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-02
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu odstránenia humusovej vrstvy zeminy

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putírka, PhD.	Podpis: 	Dátum : 20.4.2017
Prijal za dozora : Ing. Miroslav Spišák	Podpis: 	Dátum : 20.4.17

3. Schvaľovanie dozrom	
Materiál / dokument	schválený */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Ing. Miroslav Spišák	Podpis: 	Dátum : 20.4.17

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-02

Pre realizáciu odstránenia humusovej vrstvy zeminy (odhumusovanie)

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“

Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav.

objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Dozor:

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	20.4.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Schválil:	MH Invest, s.r.o.	Ing. Miloslav Spišák	Stavebný dozor	20.4.17	

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/027

Stavba: Príprava strategického parku Nitra
Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-05
Výrobca / spracovateľ	Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	X
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu násypového telesa pozemných komunikácií

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	X
Technická špecifikácia	X
Certifikát	X
Počiatočná skúška typu	X
Technické podmienky výrobcu	X
Kontrolno-skúšobný plán	X

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 15.5.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 1.6.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ <u>neschválený</u> * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 1.6.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/015

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-03
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu zlepšenia zemín v podloží s použitím hydraulického spojiva

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis : 	Dátum : 20.4.2017
Prijal za dozora : Ing. Miroslav Spišák	Podpis : 	Dátum : 20.4.17

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	schválený */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Ing. Miroslav Spišák	Podpis : 	Dátum : 20.4.17

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-03 Úprava zemín v podloží hydraulickým spojivom

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Zrduženie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: MH invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	20.4.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	20.4.2017	
Schválil:	MH Invest, s.r.o.	Ing. Miloslav Spišák	Stavebný dozor	20.4.17	


Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/019

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-04
Výrobca / spracovateľ	Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Objekt	Všetky objekty stavby
Konštrukcia	x
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu sanačnej vrstvy podložia s použitím geosyntetických materiálov

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počítačová skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 04.05.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 5.5.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> / <u>neschválený</u> * pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 5.5.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-04

Realizácia sanačnej vrstvy podložia s použitím geosyntetických materiálov

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Zrduženie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	27.4.2017	
Kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Bc. Andrej Macko	Špecialista BOZP	27.4.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	27.4.2017	
Schválil:	MH Invest, s.r.o. SGC INVEŠTA	Ing. Milošlav Spíšák Doprastav	Stavebný dozor Kvalitár SG	17.5.2017	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA
DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-05
Realizácia násypov a aktívnej zóny (po konštrukčnú plán)

Objekt: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	6.5.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	6.5.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darína Šimková	Stavebný dozor		



Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/058

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
 Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-07
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy
Konštrukcia	Nestmelená podkladová vrstva UM ŠD
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu nestmelennej podkladovej vrstvy UMŠD

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :	Dátum : 11.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :	Dátum : 31.8.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> */ neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :	Dátum : 31.8.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-07 Pre realizáciu nestmelenej podkladovej vrstvy UMŠD

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-techn. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	11.7.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	11.7.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor	31.8.2017	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Tento technologický postup (TP) opisuje postup a zodpovednosti pri prácach pri realizácii nestmelenej podkladovej vrstvy vozovky UMŠD na všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy – stavby **Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra**. Tento TP zahŕňa okrem pracovných postupov aj bezpečnostné predpisy a ochranu ŽP.

1. Zodpovednosť a právomoc

Za oboznámenie sa s týmto TP a za realizáciu prác podľa tohto TP sú zodpovední vedúci organizačných miest, ktorých pracovníci uskutočňujú práce pri realizácii konštrukcie. Zodpovedný stavbyvedúci je povinný s týmto TP preukázateľne oboznámiť všetkých svojich podriadených, ktorí sa podieľajú na realizácii technologického procesu. Týmto TP sú povinní riadiť sa všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizácii stavby.

Zodpovední zástupcovia

Mená a kontakty zodpovedných zástupcov budú vždy uvedené v doplnku k tomuto TP pre konkrétneho zhotoviteľa, ktorí bude vykonávať realizáciu násypového telesa.

Pracovníci: 2x THP – stavbyvedúci, majster; 5 - 10x robotník(strojník)

3. Použité mechanizmy

Strojné vybavenie


- Greder s automatickým zariadením na dodržiavanie nivelety
- Cisternové polievacie auto (kropička)
- Nákladný automobil typu T815, Nákladný automobil s návesom – dovoz materiálu
- 1 x Ťažký vibračný valec

4. Účel

V zmysle projektovej dokumentácie bola na chemicky upravenom podloží zrealizovaná vystužená zemná konštrukcia – sanačná vrstva. Následne na túto vrstvu má byť zrealizované násypové teleso za dodržania podmienok príslušných STN, TKP a požiadaviek projektovej dokumentácie. Zemná konštrukcia – násyp bude zrealizovaný spolu s aktívnou zónou až po úroveň konštrukčnej pláne. Výška násypového telesa je presne definovaná v jednotlivých stavebných objektoch. Na zhotovenej konštrukčnej pláni sa bude následne realizovať nestmelená podkladová vrstva UM ŠD STN EN 13285 – 0/31,5 – GC – OC85 – UF5 – LF2 od odsúhlasených výrobcov tejto zmesi.

Pre vypracovanie technologického postupu prác bola použitá projektová dokumentácia v stupni DRS, TKP časť 5 a STN 73 6126. Na návrh a na výrobu nestmelených zmesí do konštrukcií vozoviek PK a uplatňovania systému riadenia výroby platia STN EN 13285 Nestmelené zmesi – Požiadavky. Na zhotovenie a preberanie vrstiev platí STN 73 6133 a TKP časť 5.

V prvej fáze zemných prác bolo zrealizované odstránenie ornice (odhumusovanie) podľa pedologického prieskumu, sanácia podložia s použitím hydraulického spojiva, vystužená sanačná vrstva (zlepšenie podložia geodréni) a násypové teleso po úroveň konštrukčnej pláne. Tieto práce boli realizované v zmysle odsúhlasených TP-02, TP-03, TP-04, TP-05 a TP-06.



Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/059

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
 Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
 Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie

1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-08
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy
Konštrukcia	Stmelená podkladová vrstva CBGM
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu stmelenej podkladovej vrstvy CBGM

2. Predkladaná dokumentácia

Vyhlasenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis : _____	Dátum : 11.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis : <i>Darina Šimková</i>	Dátum : 30.8.2017

3. Schvaľovanie dozorom

Materiál / dokument	<u>schválený</u> / neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis : <i>Darina Šimková</i>	Dátum : 6.9.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava		

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-08 Pre realizáciu stmelenej podkladovej vrstvy CBGM

Návrh: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	11.7.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	11.7.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor	6.9.2017	

Schvaľovací protokol číslo : 2017/IN/TP/060

Stavba: **Príprava strategického parku Nitra**
Zhotoviteľ: **ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“**
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Predkladá na schválenie


1. Základné údaje	
Materiál / dokument (technické parametre)	Technologický postup č. TP-09
Výrobca / spracovateľ	Združenie Infraštruktúra Nitra
Objekt	Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy
Konštrukcia	AC vrstvy vozovky
Účel použitia	Technologický postup pre realizáciu AC vrstiev vozovky

2. Predkladaná dokumentácia	
Vyhlásenie o parametroch	x
Technická špecifikácia	x
Certifikát	x
Počiatočná skúška typu	x
Technické podmienky výrobcu	x
Kontrolno-skúšobný plán	x

Predkladá za zhotoviteľa : Ing. Dušan Putirka, PhD.	Podpis :  Dátum : 11.7.2017
Prijal za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 30.8.2017

3. Schvaľovanie dozorom	
Materiál / dokument	<u>schválený</u> * / neschválený* pre použitie na stavbe
Schválený pre účel	
Pripomienky dozora	PRIPOMIENKA : • OBYRUBNÁ A KROŠŇA VRSTVA VOZOVEK TOL. I a II - SA KADU NABAZ NA CELÚ ŠIRKU • ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ PRI POKUŠENÍ KONTROLNÉ MERANIA ZHUTNENIA TADXLEROŇ

*nehodiace sa škrtnite

Schvaľuje za dozora : Darina Šimková	Podpis :  Dátum : 6.9.2017
Slovenská správa ciest IVSC, Bratislava	

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

Technologický postup č. TP-09

Pre realizáciu asfaltových vrstiev vozovky

Stavba: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavebný objekt: Všetky stavebné objekty – cesty, pozemné komunikácie spevnené plochy

Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“
Vedúci člen združenia: Doprastav a.s., Drieňová 25, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zhotoviteľ stav. objektu: Združenie Infraštruktúra Nitra

Stavebník: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Stavebno-tech. dozor: Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

	FIRMA	MENO	FUNKCIA	DÁTUM	PODPIS
Vypracoval a kontroloval:	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“	Ing. Roman Dojčinovič	Špecialista BOZP	11.7.2017	
		Ing. Dušan Putirka, PhD.	Kvalitár	11.7.2017	
Schválil:	SSC IVSC	Darina Šimková	Stavebný dozor	6.9.2017	

**DOKLADY, CERTIFIKÁTY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH K POUŽITÝM MATERIÁLOM SÚ PRILOŽENÉ V ZÁVEREČNEJ DOKUMENTÁCII KVALITY SO 110****Zeminy a sypaniny**

- 2017/IN/MAT/003 – zemina zlepšená hydraul.spojivom PST č. SPB/2017/770 + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/063 – zemina zlepšená hydraul.spojivom PST č. SPB/2017/2378
- 2017/IN/MAT/021 – štrkodrvina fr. 0-63mm - PST č. 15/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/101 – štrkodrvina fr. 0-125mm - PST č. 10/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/095 – štrkodrvina fr. 0-32mm - PST č. 38/2017/PS/Z/ZV
- 2017/IN/MAT/022 a 060 – štrkodrvina fr. 0-63mm - PST č. SPB/2017/1473 a č. 21/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2018/IN/MAT/019 – štrkodrvina fr. 0-22, 32-63, 8-32mm – krajnice; drenážne vrstvy; lôžko

Geosyntetické materiály

- 2017/IN/MAT/002 – geosyntetické materiály výrobcu Low and Bonar Geosynthetics
- 2017/IN/MAT/094 – geosyntetické materiály výrobcu Maccaferri

Konštrukčné vrstvy vozovky

- 2017/IN/MAT/051 – nestmelená vrstva UMŠD 0-31,5 Gc – lom Pohranice + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/112 – nestmelená vrstva UMŠD 0-31,5 Gc – lom Horné Vestenice + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/052 – stmelená vrstva CBGM C5/6-0/20- výrobca Alas Slovakia s.r.o. + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/77 – asfaltový penetračný a infiltračný postrek - výrobca Doprava
- 2017/IN/MAT/89 – asfaltová vrstva AC 22 P 35/50; I; - výrobca Slovenské Asfalty+ zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/89a – asfaltová vrstva AC 22 L PmB 45/80-75; I;
asfaltová vrstva SMA 11 PmB 45/80-75; I; výrobca Slovenské Asfalty.
- 2017/IN/M/105 – asfaltová vrstva AC 22 P 35/50; I; - výrobca Cesty Nitra
- 2017/IN/M/113 – asfaltová vrstva AC 22 L PmB 45/80-75; I;
asfaltová vrstva SMA 11 PmB 45/80-75; I;
- Asfaltová vrstva AC 8 O 50/70; II – Doprastavasfalt
- Asfaltová vrstva AC 16 P 50/70; II – Doprastavasfalt

Betón

- 2017/IN/MAT/015a – betón C16/20 a C 25/30 XC3, XA1 – výrobca ALAS Slovakia
- 2017/IN/M/110 – betón CB III – výrobca ALAS Slovakia

Vybavenie a ostatné konštrukcie

- 2017/IN/MAT/073 – liatinové poklopy a mreže – výrobca Kasi s.r.o.
- 2018/IN/MAT/049 – vodorovné a zvislé dopravné značenie – výrobca Hatrick s.r.o.; SATES a.s. Doprastav a.s.; Helvet s.r.o.
- 2017/IN/MAT/121 – zálievková hmota Biguma – výrobca Dortmunder Gubasfalt – asfaltov; pružná zálievka
- 2017/IN/MAT/135 – skruže a šachty – výrobca Zábojník
- 2017/IN/MAT/137 – hydroosev – výrobca ARBOR
- Cestný, rovný a nájazdový obrubník – výrobca Semmelrock
- 2018/IN/MAT/040 – vodorovné a zvislé dopravné značenie
- 2018/IN/MAT/093 - prístrešky
