



Protokol / Protocol: SPB/2018/3135

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti vrstiev / Radiometric testing of density of layers

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO:131
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 731375:1971
 Norm, regulation, ...: SP-V02
 Rozšírená neistota U(k=2): 3,0%
 Odchyľky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75; ZH4

Druh materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75
 Material type:

Miesto merania: stavba
 Measuring site: Staničenie: vid' nižšie
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/3135
 Records note nr.:

Teplota: [°C]
 Temperature:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 05.09.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 05.09.2018
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie stationing	OH ₁ / BD ₁ [kg/m ³]	OH ₂ / BD ₂ [kg/m ³]	OH ₃ / BD ₃ [kg/m ³]	OH ₄ / BD ₄ [kg/m ³]	OH / BD priemer / average [kg/m ³]	Korelačný koeficient / Correlation factor	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	pás č.2	2378	2377	2374	2378	2377	1,0000	2377	98,8
2	pás č.3	2352	2354	2357	2361	2356	1,0000	2356	97,9
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Porovnávacia objemová hmotnosť určená v protokole:						SPB/2018/3109		2407	[kg/m ³]
Comaprison buld density specified in protocol:									

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

priemerná hrúbka 98 [%]
97,0

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 06.09.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2018/3687****Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti vrstiev / Radiometric testing of density of layers****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA

Zákazka č. / Order nr.

Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 131

Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:

Skúšobný postup:

Rozšírená neistota $U(k=2)$:

Odchylky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...:

Test procedure:

Expand. uncertainty $U(k=2)$:

Deviation from test procedure:

STN 731375:1971

SP-V02

3,0%

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4

Material name:

Druh materiálu: AC 11 obrus PMB 45/80-75

Material type:

Miesto merania: stavba

Staničenie:

Stationing:

vid'. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

09.10.2018

Test beginning (date-time):

Koniec skúšky (dátum-čas):

09.10.2018

Test ending (date-time):

Záznamový lis č.:

SPB/2018/3687

Teplota:

Temperature: [°C] -

P.č. No.	staničenie stationing	OH ₁ / BD ₁ [kg/m ³]	OH ₂ / BD ₂ [kg/m ³]	OH ₃ / BD ₃ [kg/m ³]	OH ₄ / BD ₄ [kg/m ³]	OH / BD priemer / average [kg/m ³]	Korelačný koeficient / Correlation factor	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	park.P3; pás č.1	2350	2365	2334	2361	2352	1,0000	2352	97,7
2	park.P3; pás č.2	2382	2360	2387	2406	2384	1,0000	2384	99,0
3	park.P3; pás č.3	2371	2385	2365	2359	2370	1,0000	2370	98,5
4	park.P3; pás č.4	2361	2380	2374	2349	2366	1,0000	2366	98,3
5	park.P3; pás č.5	2345	2362	2351	2340	2350	1,0000	2350	97,6
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
Porovnávacia objemová hmotnosť určená v protokole:						SPB/2018/3109		2407	[kg/m ³]
Comaprison buld density specified in protocol:									

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

[%]

97,0

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 11.10.2018

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/3109

Rozbor asphaltovej zmesi / Analysis of asphalt mixture

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 131
 Konštrukcia / Construction: Obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 rada - STN EN 12697, STN EN 933-1 SP-AZ02,3,4,5,7 vid' výsledky žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4 Odbрал: SMATANA Zoltán
 Material name: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4 Sampler:
 Druh materiálu: AC 11 obrus PMB 45/80-75 Označenie vzorky: 65/2018/CI Nitra Odber (dátum-čas): 30.08.2018
 Material type: AC 11 obrus PMB 45/80-75 Markings of sample: Stationing: Parkovisko P3 Sampling (date-time):
 Miesto odboru: stavba Prevzatie (dátum-čas): 31.08.2018
 Sampling site: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/3109
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 03.09.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 04.09.2018
 Test ending (date-time):

Sito / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [g]	Zvyšky / Residue [%]	Prepad / pass s. [%]	Hm.vzorky / Sample weight [g]	Patrola / Filler cup [g]	Patr. + filer / Filler cup + filler [g]
				1104,50	667,90	741,00
125			100	Čiara zmitosti / Grading curve 		
90			100			
63			100			
56			100			
45			100			
31,5			100			
22,4			100			
16	0,0		100			
11,2	5,5	0,53	99			
8	211,3	20,20	79			
5,6	157,9	15,09	64			
4	149,2	14,26	50			
2,8			42			
2	168,5	16,11	34			
1	149,7	14,31	20			
0,5	68,5	6,55	13			
0,25	33,9	3,24	10			
0,125	18,0	1,72	8			
0,063	8,9	0,85	7,1			
dno	74,7	7,14	0,0			
Σ	1046,1	100,0	-			

OCL (STN EN 13108-21)

PST - AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4

Test	Value	Unit	Namerané	Neistota	Deklarované
AZ02-Obsah rozpustného spojiva / Soluble bitumen content:	S	[%]	5,3	0,2 %	5,1 + 5,7
AZ03-Objemová hmotnosť / Bulk density - metóda / method B	ρ_{bsd}	[Mg/m ³]	2,407		-
AZ03-Maximálna hmotnosť / Maximal density	ρ_{mv}	[Mg/m ³]	2,522	0,8%	-
AZ03-Medzerovitost' (vo vode) / Air voids content (in water)	V_m	[%]	4,5		2,5 + 4,5
AZ05-Pomer hĺbka a sklon vyj.kofaje / Proportional depth and strain of tracking	PRDAIR / WTSAIR	[% , mm]		0,2 mm	-
AZ04-Pomer pevnosti v priečnom ťahu / Indirect tensile strength ratio	ITSR	[%]		1,5 %	-
AZ07-Stekavosť asfaltového spojiva / Binder drainage	BD	[%]			-
AZ03-Perc. medzier v kamenive vypl. asfaltom / Voids filled with binder	VFB	[%]		-	-

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

NITKOYÁ Elena

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 04.09.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/3306

Rozbor asphaltovej zmesi / Analysis of asphalt mixture

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o., (TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra

Objekt / Building object: SO: 131

Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:

Skúšobný postup:

Odchýlky od skúšobného postupu:

Norm, regulation, ...:

Test procedure:

Deviation from test procedure:

rada - STN EN 12697, STN EN 933-1

SP-AZ02,3,4,5,7 vid. výsledky

žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4

Odbor:

KUCHÁR Jaroslav

Material name:

Sampler:

Druh materiálu: AC 11 obrus PMB 45/80-75

Označenie vzorky:

Odbor (dátum-čas):

13.09.2018

Material type:

Markings of sample:

Sampling (date-time):

Miesto odberu: stavba

Staničenie:

Prevzatie (dátum-čas):

13.09.2018

Sampling site:

Stationing:

Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

14.09.2018

Záznamový lis č.:

SPB/2018/3306


Test beginning (date-time):

Records note nr.:

Koniec skúšky (dátum-čas):

17.09.2018

Test ending (date-time):

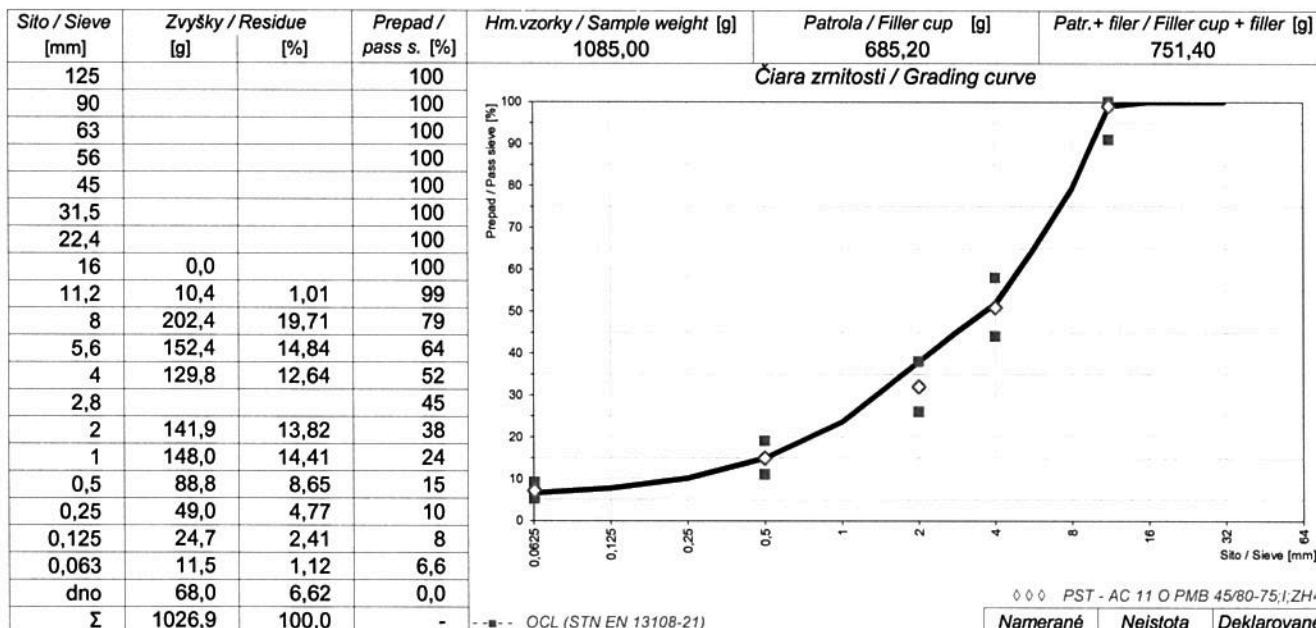

AZ02-Obsah rozpustného spojiva / Soluble bitumen content:	S [%]	5,4	0,2 %	5,1 + 5,7
AZ03-Objemová hmotnosť / Bulk density - metóda / method B	ρ_{bead} [Mg/m ³]	2,430		-
AZ03-Maximálna hmotnosť / Maximal density	ρ_{mv} [Mg/m ³]	2,505	0,8%	-
AZ03-Medzerovitost' (vo vode) / Air voids content (in water)	V_m [%]	3,0		2,5 + 4,5
AZ05-Pomer hĺbka a sklon vyj.kofaje / Proportional depth and strain of tracking	PRDAIR / WTSAIR [% , mm]		0,2 mm	-
AZ04-Pomer pevnosti v priečnom ťahu / Indirect tensile strength ratio	ITSR [%]		1,5 %	-
AZ07-Stekavosť asfaltového spojiva / Binder drainage	BD [%]			-
AZ03-Perc. medzier v kamenive vypl. asfaltom / Voids filled with binder	VFB [%]		-	-

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skušal - Tested by:**

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVÁ Elena

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 17.09.2018

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-AZ00-01/18

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1



SNAS

Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/3320

Rozbor asphaltovej zmesi / Analysis of asphalt mixture

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: STRABAG s.r.o.,(TI), Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA, OS Dolné Obdokovce

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - Strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 131
 Konštrukcia / Construction: Obrusná vrstva

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchylky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 rada - STN EN 12697, STN EN 933-1 SP-AZ02,3,4,5,7 viď. výsledky žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4 Odbor : KUCHÁR Jaroslav
 Material name: AC 11 obrus PMB 45/80-75 Označenie vzorky: 72/2018/CI Nitra
 Druh materiálu: AC 11 obrus PMB 45/80-75 Markings of sample: 72/2018/CI Nitra
 Material type: AC 11 obrus PMB 45/80-75 Stationing: Parkovisko P3
 Miesto odberu: stavba
 Sampling site: stavba

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/3320
 Records note nr.: SPB/2018/3320

Začiatok skúšky (dátum-čas): 13.09.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 14.09.2018
 Test ending (date-time):

Síto / Sieve [mm]	Zvyšky / Residue [g]	Zvyšky / Residue [%]	Prepad / pass s. [%]	Hm.vzorky / Sample weight [g]	Patrola / Filler cup [g]	Patr. + filer / Filler cup + filler [g]
				1094,20	667,50	732,40
125			100	Čiara zmitostí / Grading curve 		
90			100			
63			100			
56			100			
45			100			
31,5			100			
22,4			100			
16	0,0		100			
11,2	12,5	1,21	99			
8	238,6	23,04	76			
5,6	180,2	17,40	58			
4	130,4	12,59	46			
2,8			39			
2	133,7	12,91	33			
1	131,2	12,67	20			
0,5	75,1	7,25	13			
0,25	37,0	3,57	9			
0,125	20,9	2,02	7			
0,063	8,5	0,82	6,5			
dno	67,6	6,53	0,0			
Σ	1035,7	100,0	-			

AZ02-Obsah rozpustného spojiva / Soluble bitumen content:

AZ03-Objemová hmotnosť / Bulk density - metóda / method B

AZ03-Maximálna hmotnosť / Maximal density

AZ03-Medzerovitost' (vo vode) / Air voids content (in water)

AZ05-Pomer hĺbka a sklon vyj.kofaje / Proportional depth and strain of tracking

AZ04-Pomer pevnosti v priečnom ťahu / Indirect tensile strength ratio

AZ07-Stekavosť asfaltového spojiva / Binder drainage

AZ03-Perc. medzier v kamenive vypl. asfaltom / Voids filled with binder

	Namerané	Neistota	Deklarované
S [%]	5,3	0,2 %	5,1 + 5,7
p _{bsd} [Mg/m³]	2,434		-
p _{mv} [Mg/m³]	2,514	0,8%	-
V _m [%]	3,2		2,5 + 4,5
PRDAIR / WTS _{air} [% , mm]		0,2 mm	-
ITSR [%]		1,5 %	-
BD [%]			-
VFB [%]		-	-

Požiadavka - Requirement:**Poznámky - Comments:****Skúšal - Tested by:**

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

NITKOVA Elena

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCOS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 17.09.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina STRED - pracovisko Zvolen
 Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
 tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993


Protokol / Protocol: SZV/2018/3552a
Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

FBAV

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:129 parkovisko a komunikácie pre osobné autá (parking Strategický park) II.Fáza
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva krytu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota U(k=2): Odchyľky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty U(k=2): Deviation from test procedure:
 STN EN 13036-7:2005 SP-V03 11,9% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4

Material name:

Druh materiálu:

Material type:

Miesto merania:

Measuring site:

AC 11 obrus. PMB 45/80-75

stavba

Staničenie:

Stationing:

vid'. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

Test beginning (date-time):

15.10.2018

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

15.10.2018

Záznamový lis č.:

Records note nr.:

SZV/2018/3552

Metóda:

Method:

3m lata, planograf

Meraná rovinatosť:

Measured evenness:

Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral

P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Ľavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	-	SO 129 vetva B			
2	km 0,322	číslo skúšky 8	číslo skúšky 9		
3	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
4	km 0,556	hodnôt : 0	hodnôt : 0		
5	km 0,332			4	2
6	km 0,372			3	3
7	km 0,412			4	3
8	km 0,452			4	3
9	km 0,492			4	4
10	km 0,532			5	3
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Pre meranie planografom zoznam všetkých nameraných údajov len na vyžiadanie.

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm]

≤ 5

priečna [mm]

≤ 5

Poznámky - Comments:

Namerané hodnoty obsahujú aj nerovnosť cestného profilu a projektovaných sklonov

Skúšan - Tested by:

SABACKÝ Peter

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert

vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Date of issuance:


Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nezhodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom


Strana: 1

Číslo skúšky: 8

Dátum : 15.10.2018



Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

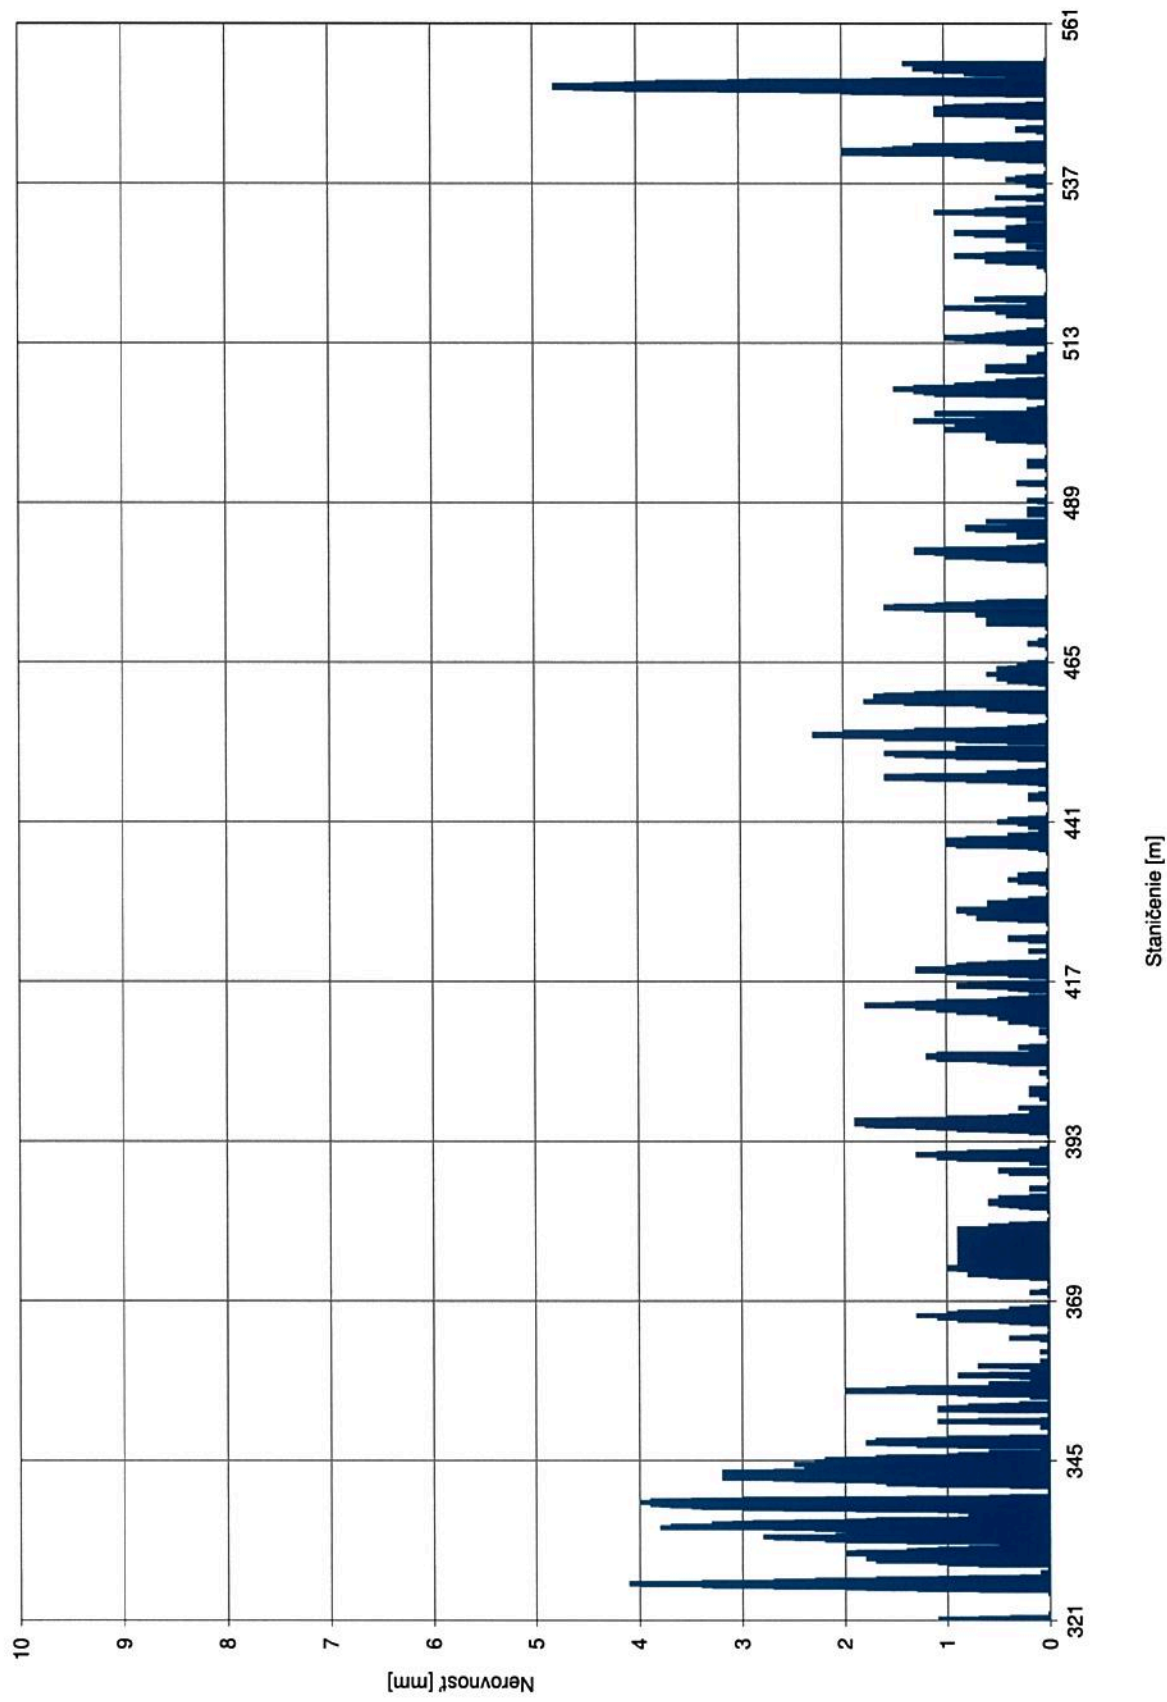

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
 skupina STRED - pracovisko Zvolen
 Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
 tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993


Protokol / Protocol: SZV/2018/3553a-1
Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

 objednávka
 FBAV

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:131 parkovisko a komunikácie pre osobné autá (parking Strategický park) II.Fáza
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva krytu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
 Skúšobný postup: SP-V03
 Rozšírená neistota U(k=2): 11,9%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4
 Material name:

Druh materiálu: AC 11 obrus. PMB 45/80-75
 Material type:

Miesto merania: stavba
 Stationing: vid. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SZV/2018/3553
 Metóda: 3m lata, planograf

Začiatok skúšky (dátum-čas): 15.10.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 15.10.2018
 Test ending (date-time):

Meraná rovinatosť:
 Measured evenness:

Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral

P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	-	parkovisko 3 - C1			
2	km 0,000	číslo skúšky 13	číslo skúšky 12		
3	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
4	km 0,192	hodnôt : 23 z 1800	hodnôt : 22 z 1800		
5	km 0,008			2	2
6	km 0,048			2	2
7	km 0,088			3	2
8	km 0,128			2	2
9	km 0,168			2	3
10					
11	-	parkovisko 3 - C2			
12	km 0,000	číslo skúšky 15	číslo skúšky 14		
13	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
14	km 0,192	hodnôt : 10 z 1800	hodnôt : 15 z 1830		
15	km 0,008			3	2
16	km 0,048			2	3
17	km 0,088			2	2
18	km 0,128			3	2
19	km 0,168			2	2
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Pre meranie planografom zoznam všetkých nameraných údajov len na vyžiadanie.

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdlžna [mm] priečna [mm]
 ≤ 5 ≤ 5

Poznámky - Comments:

Namerané hodnoty obsahujú aj nerovnosť cestného profilu a projektovaných sklonov

Skúšal - Tested by:

SABACKÝ Peter
 Dátum vystavenia: 25.10.2018
 Date of issuance:

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nezhodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Protokol / Protocol: SZV/2018/3553a-1

Meraná rovinatosť / Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
26	-	parkovisko 3 - C3			
27	km 0,000	číslo skúšky 17	číslo skúšky 16		
28	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
29	km 0,192	hodnôt : 19 z 1830	hodnôt : 24 z 1830		
30	km 0,008			2	3
31	km 0,048			3	2
32	km 0,088			2	2
33	km 0,128			2	2
34	km 0,168			2	3
35					
36	-	parkovisko 3 - C4			
37	km 0,000	číslo skúšky 19	číslo skúšky 18		
38	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
39	km 0,192	hodnôt : 5 z 1830	hodnôt : 27 z 1830		
40	km 0,008			3	2
41	km 0,048			2	3
42	km 0,088			2	2
43	km 0,128			2	3
44	km 0,168			2	2
45					
46	-	parkovisko 3 - C5			
47	km 0,000	číslo skúšky 21	číslo skúšky 20		
48	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
49	km 0,192	hodnôt : 21 z 1830	hodnôt : 21 z 1830		
50	km 0,008			2	2
51	km 0,048			3	2
52	km 0,088			2	3
53	km 0,128			2	2
54	km 0,168			2	2
55					
56	-	parkovisko 3 - C6			
57	km 0,000	číslo skúšky 23	číslo skúšky 22		
58	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
59	km 0,192	hodnôt : 13 z 1800	hodnôt : 23 z 1830		
60	km 0,008			2	2
61	km 0,048			2	3
62	km 0,088			2	2
63	km 0,128			2	2
64	km 0,168			2	2
65					
66	-	parkovisko 3 - C7			
67	km 0,000	číslo skúšky 11	číslo skúšky 10		
68	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
69	km 0,192	hodnôt : 35 z 1830	hodnôt : 25 z 1830		
70	km 0,008			2	2
71	km 0,048			2	3
72	km 0,088			3	2
73	km 0,128			2	3
74	km 0,168			2	2
75					
76					
77					
78					
79					
80					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozďĺžna [mm]

≤ 5

priečna [mm]

≤ 5

Poznámky - Comments:

(N)

Skušal - Tested by:

SABACKÝ Peter

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUŠKA Ján

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCŠ Norbert
vedúci laboratória a skupiny


Dátum vystavenia:
Date of issuance: 25.10.2018

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Meranie pozdĺžnych nerovností planografov

Strana: 1


Číslo skúšky: 10
Dátum : 15.10.2018




Meranie pozdĺžnych nerovností planografov

Strana: 1

Číslo skúšky: 11
Dátum : 15.10.2018




Meranie pozdĺžnych nerovností planografov

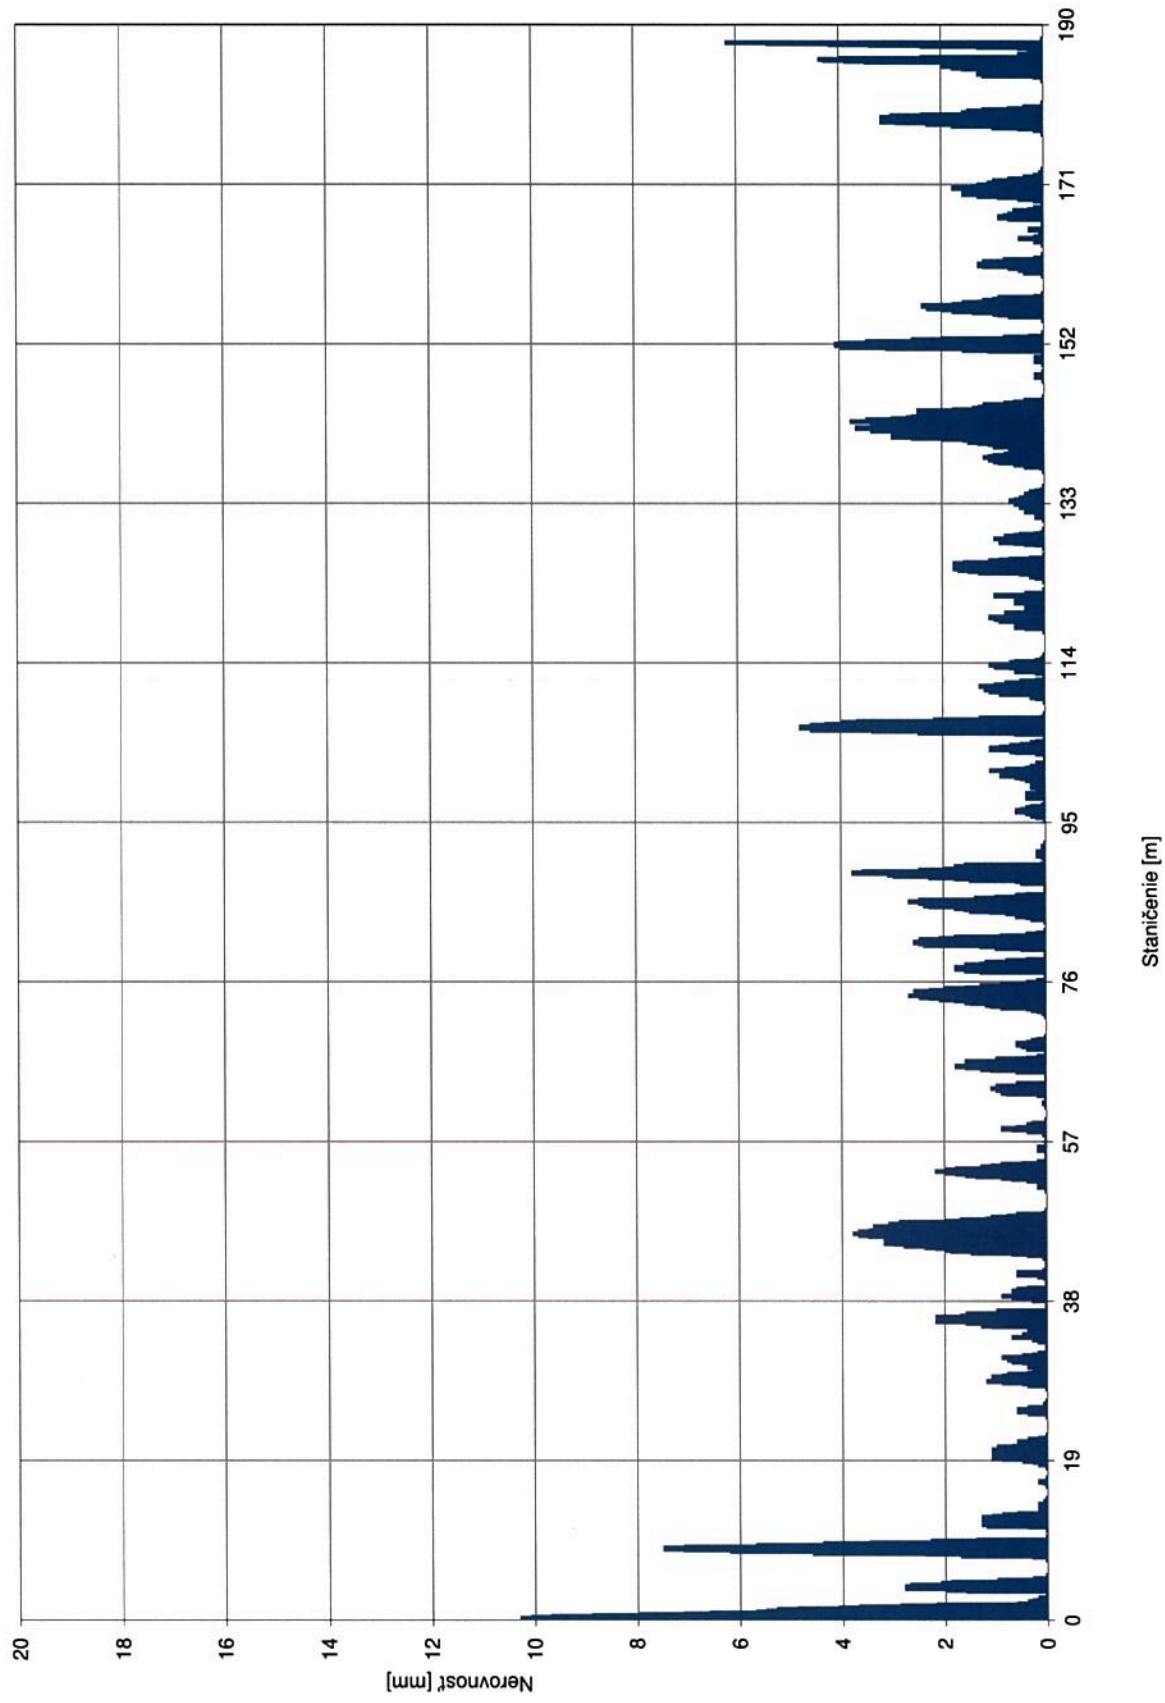


Meranie pozdĺžnych nerovností planograom

Strana: 1

Číslo skúšky: 13
Dátum : 15.10.2018




Meranie pozdĺžnych nerovností planograфом

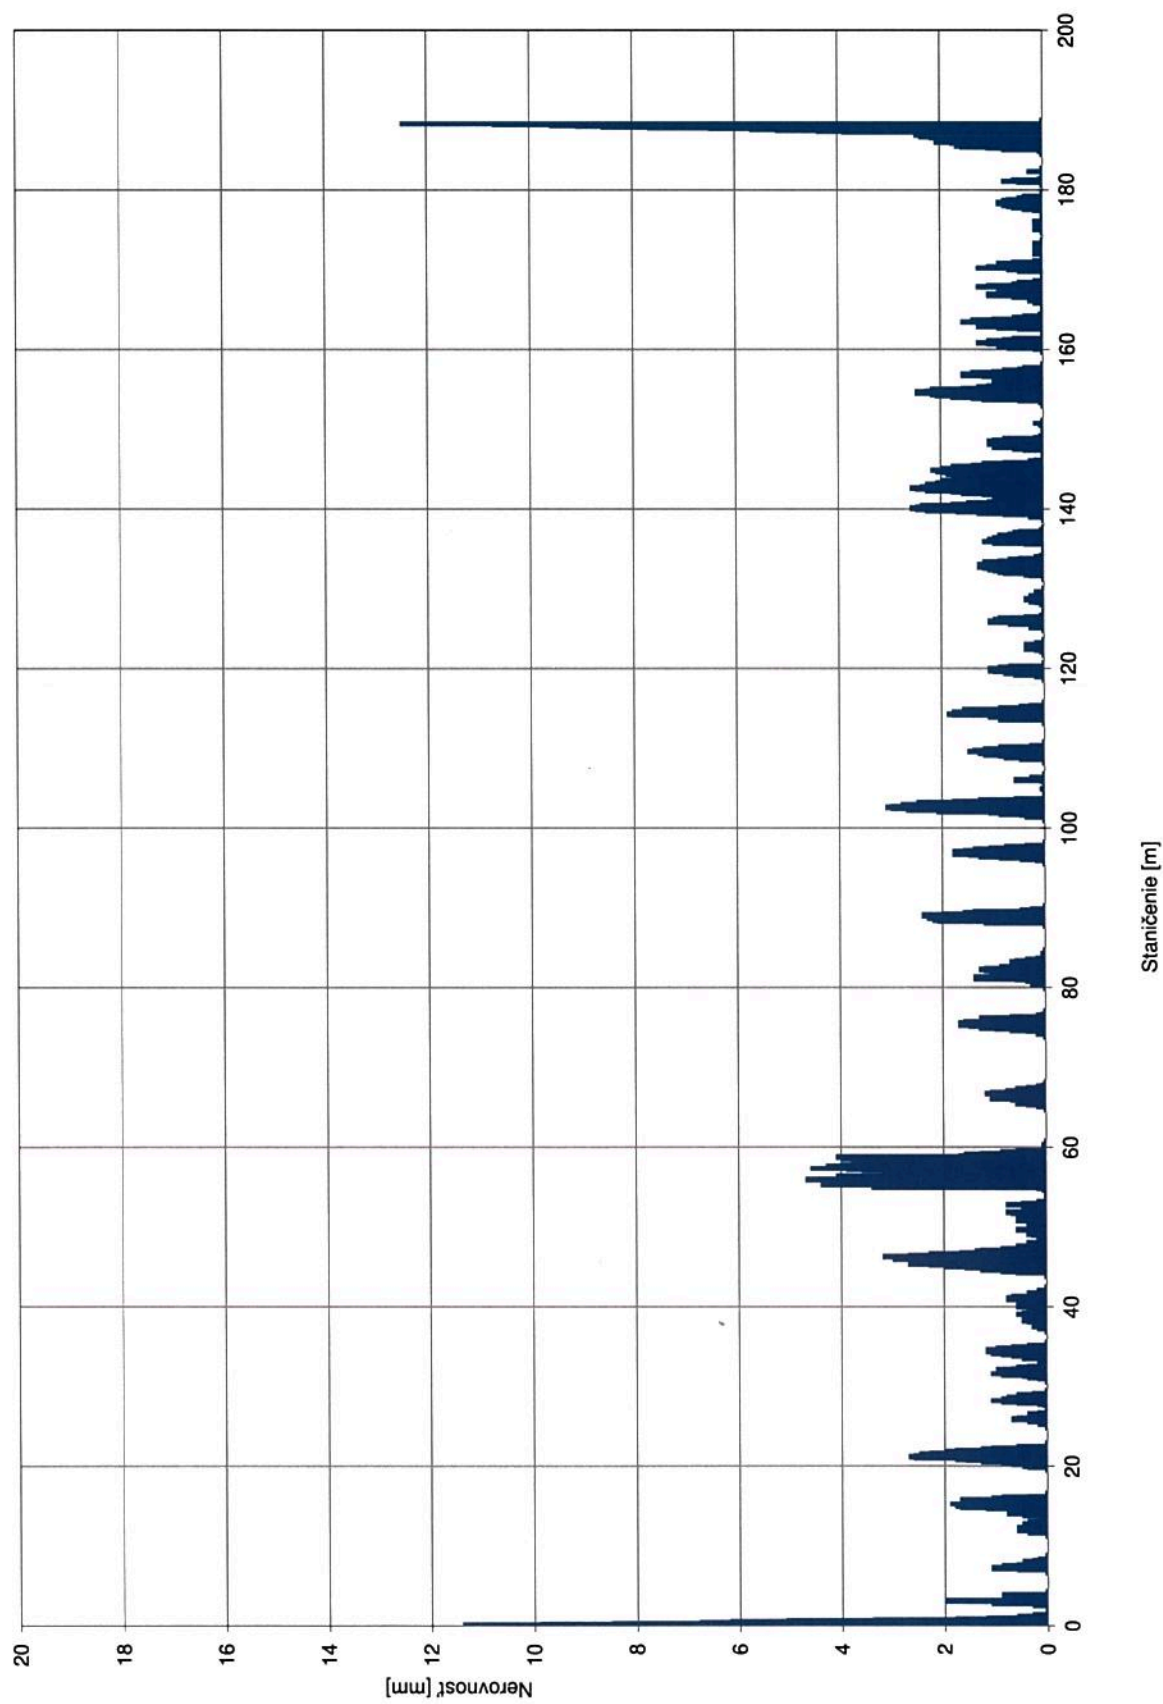


Meranie pozdĺžnych nerovností planografov

Strana: 1


Číslo skúšky: 15
Dátum : 15.10.2018




Meranie pozdĺžnych nerovností planograom

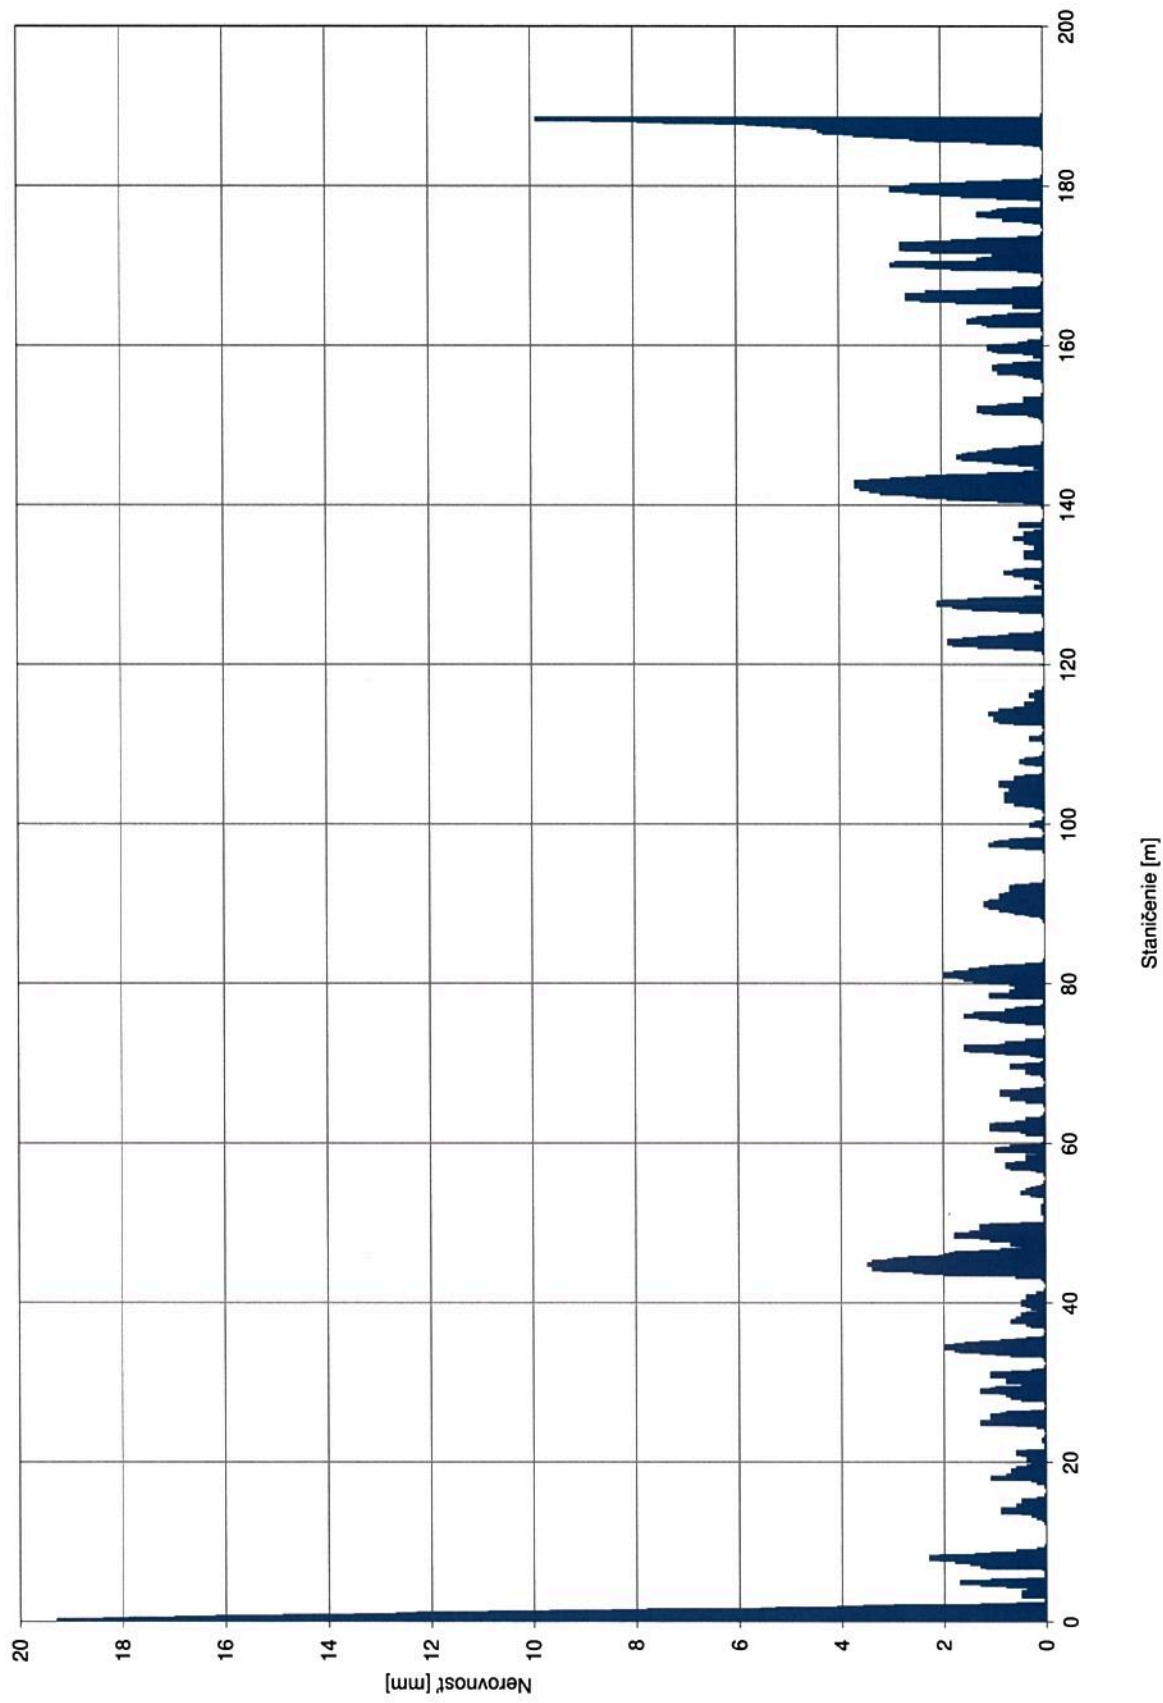

Meranie pozdĺžnych nerovností planograфом

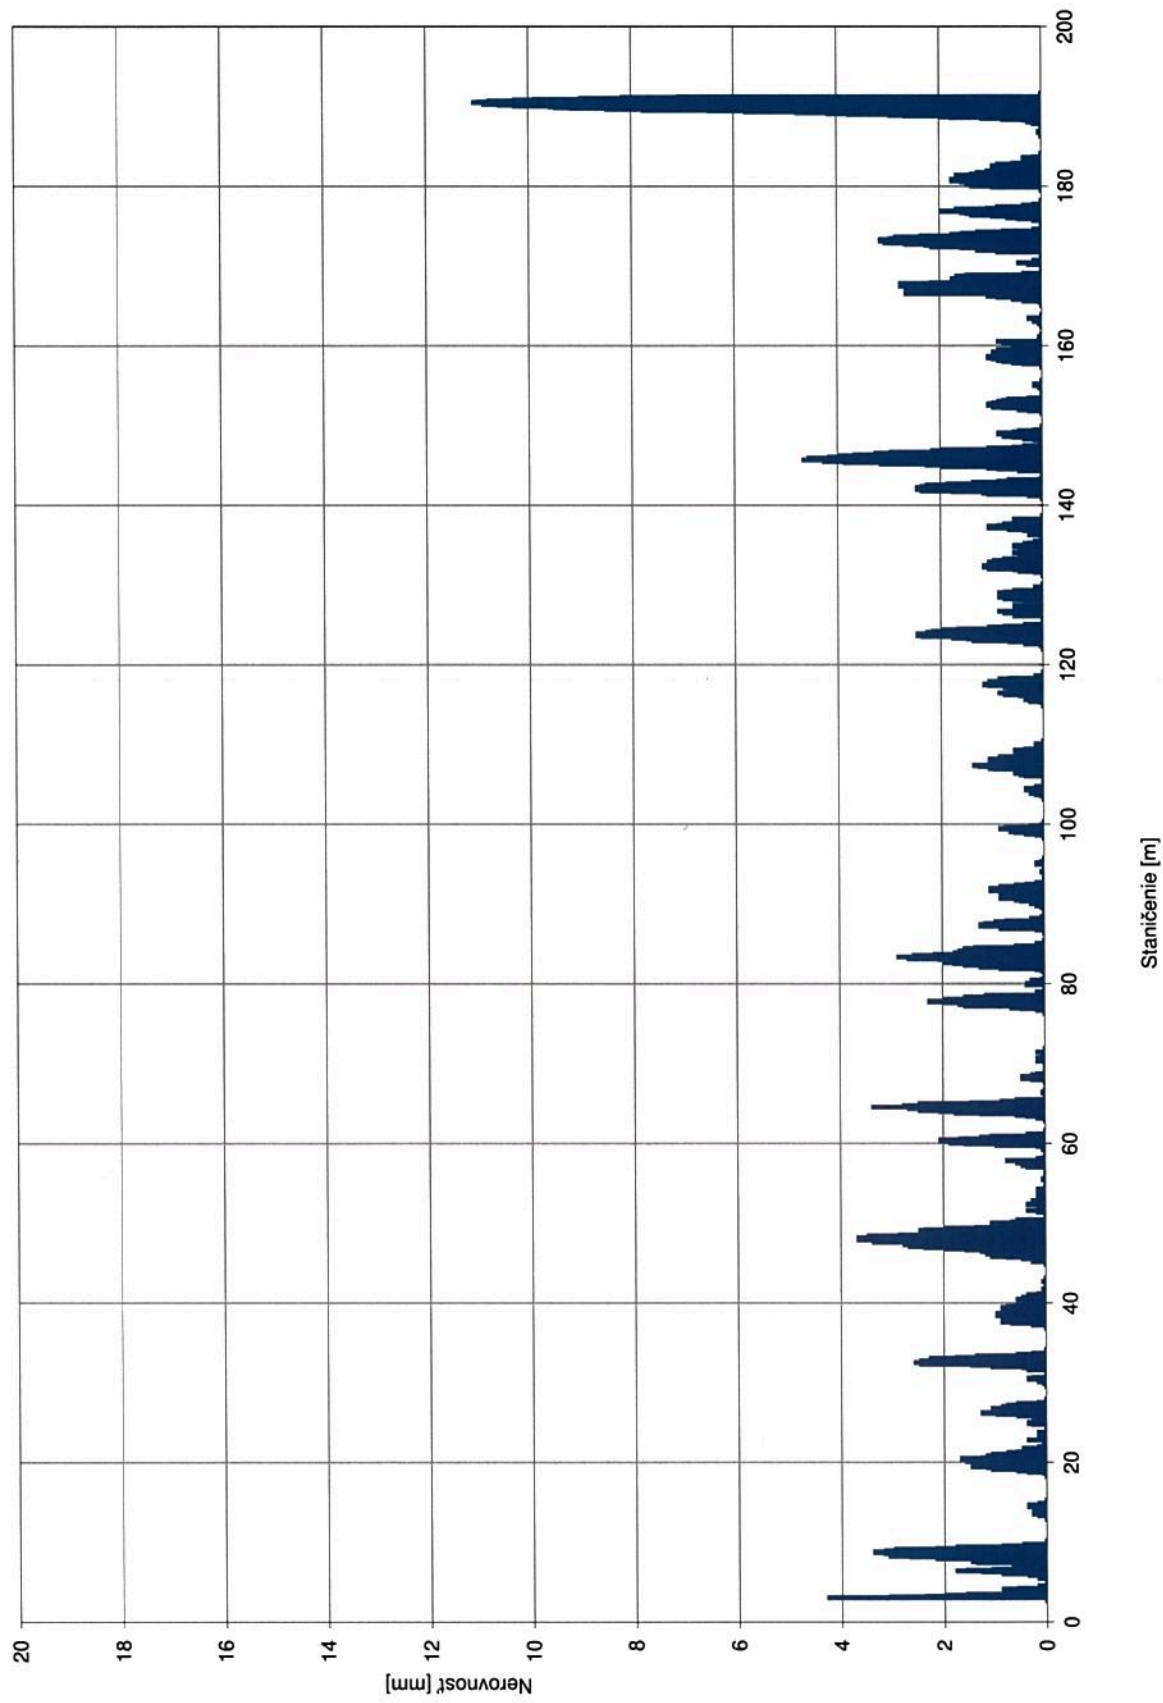


Meranie pozdĺžnych nerovností planografam

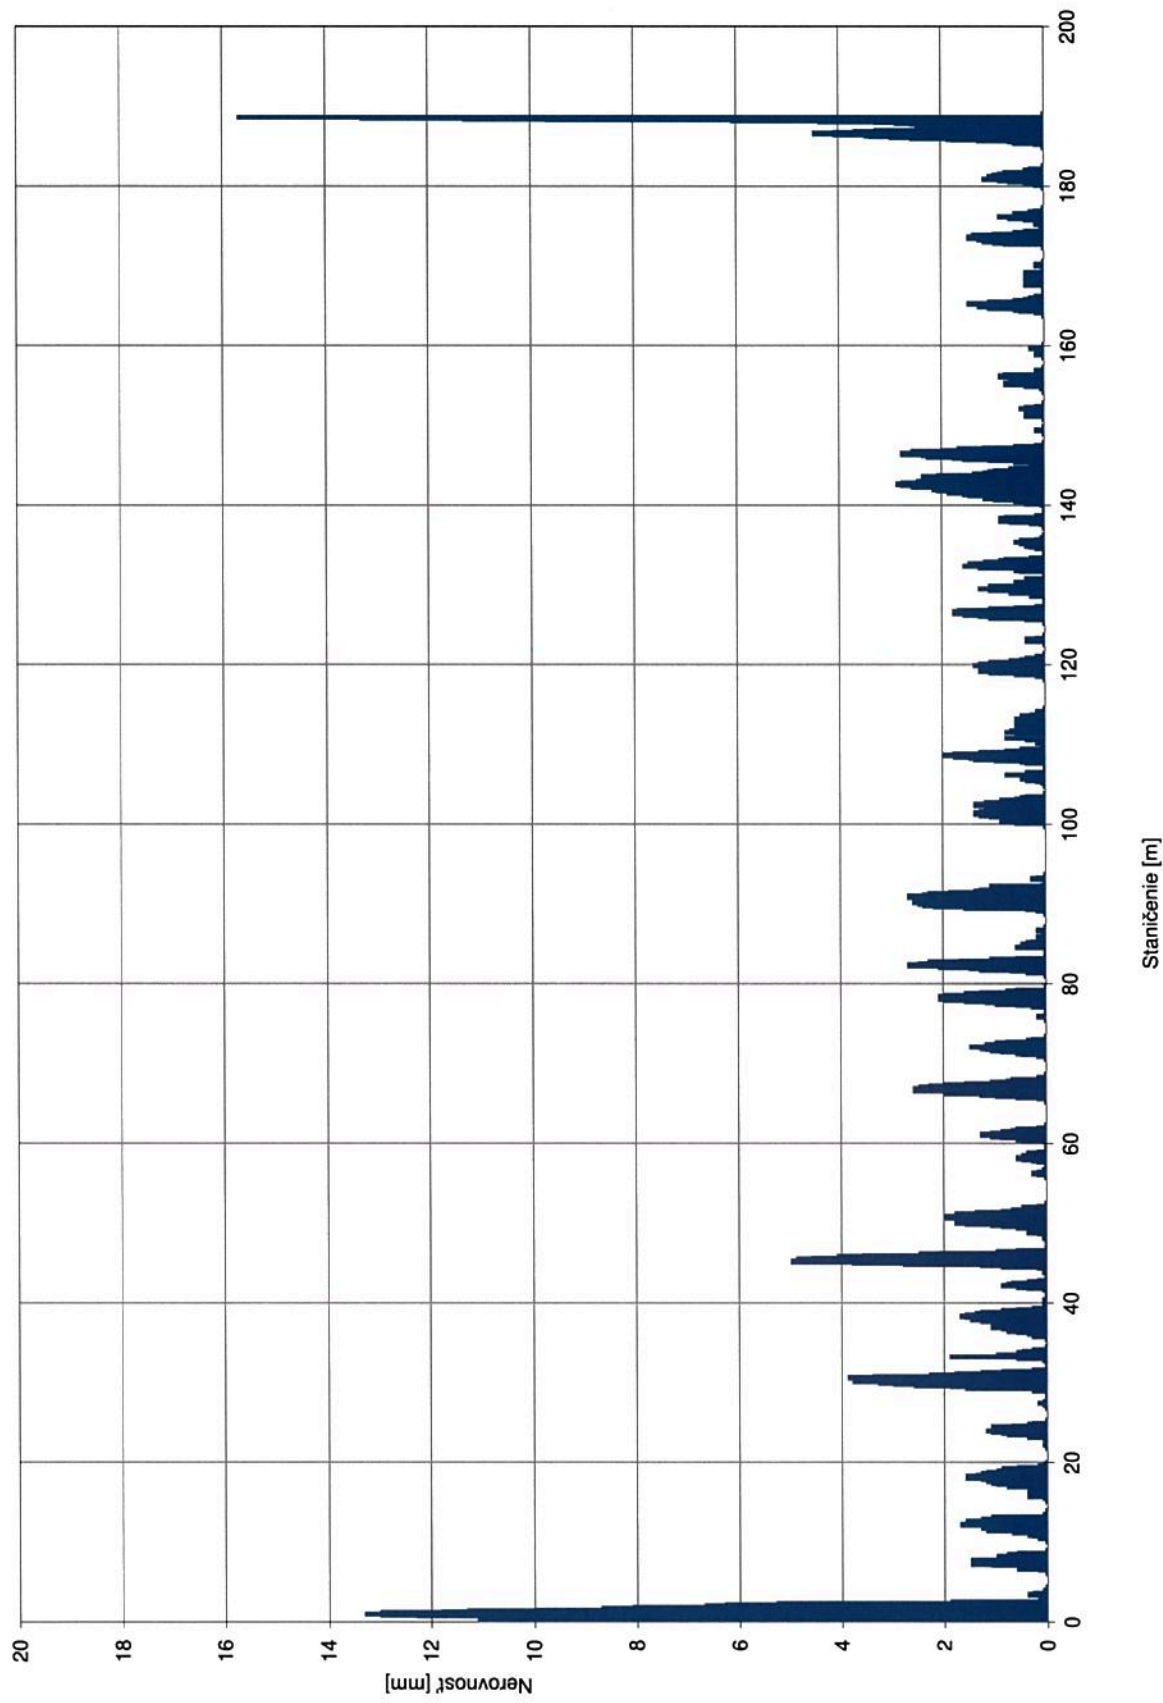

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1


Číslo skúšky: 19
Dátum : 15.10.2018



Meranie pozdĺžnych nerovností planografov

Strana: 1


Číslo skúšky: 20
Dátum : 15.10.2018




Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1


Číslo skúšky: 21
Dátum : 15.10.2018



Meranie pozdĺžnych nerovností planograфом

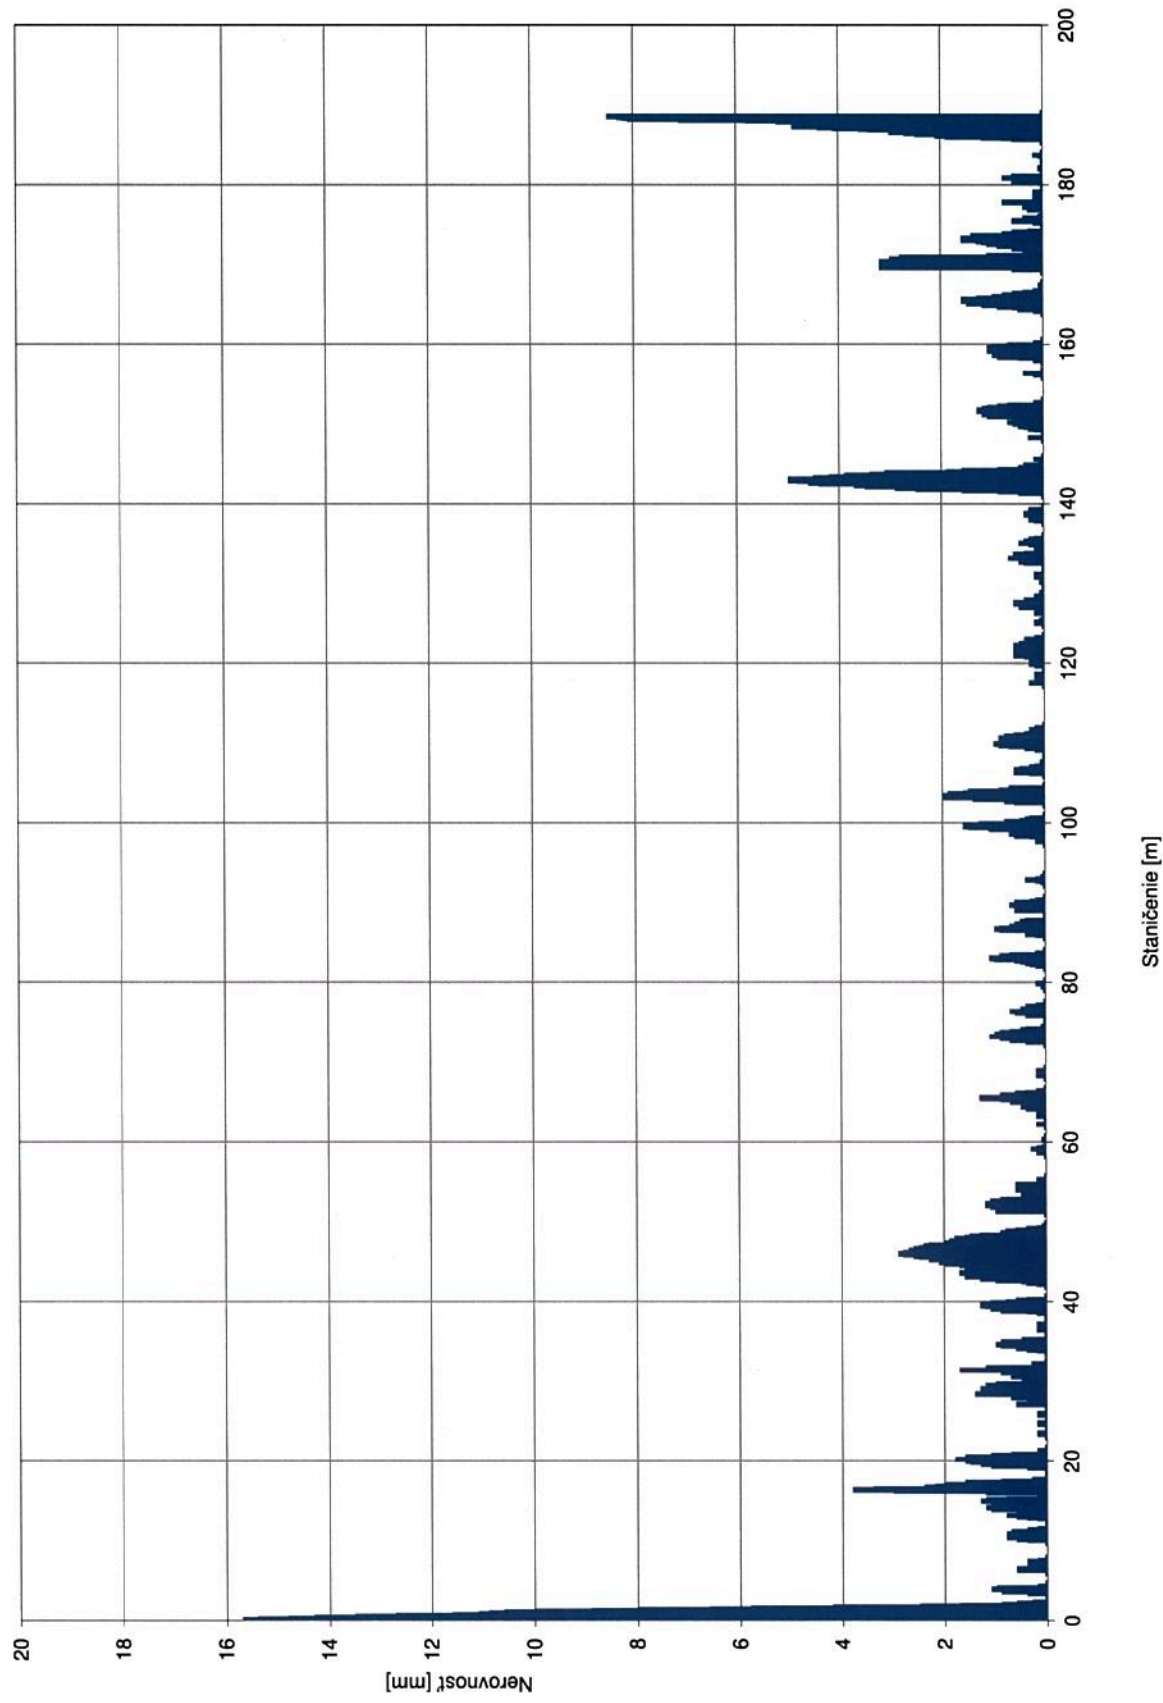

Meranie pozdĺžnych nerovností planograфом

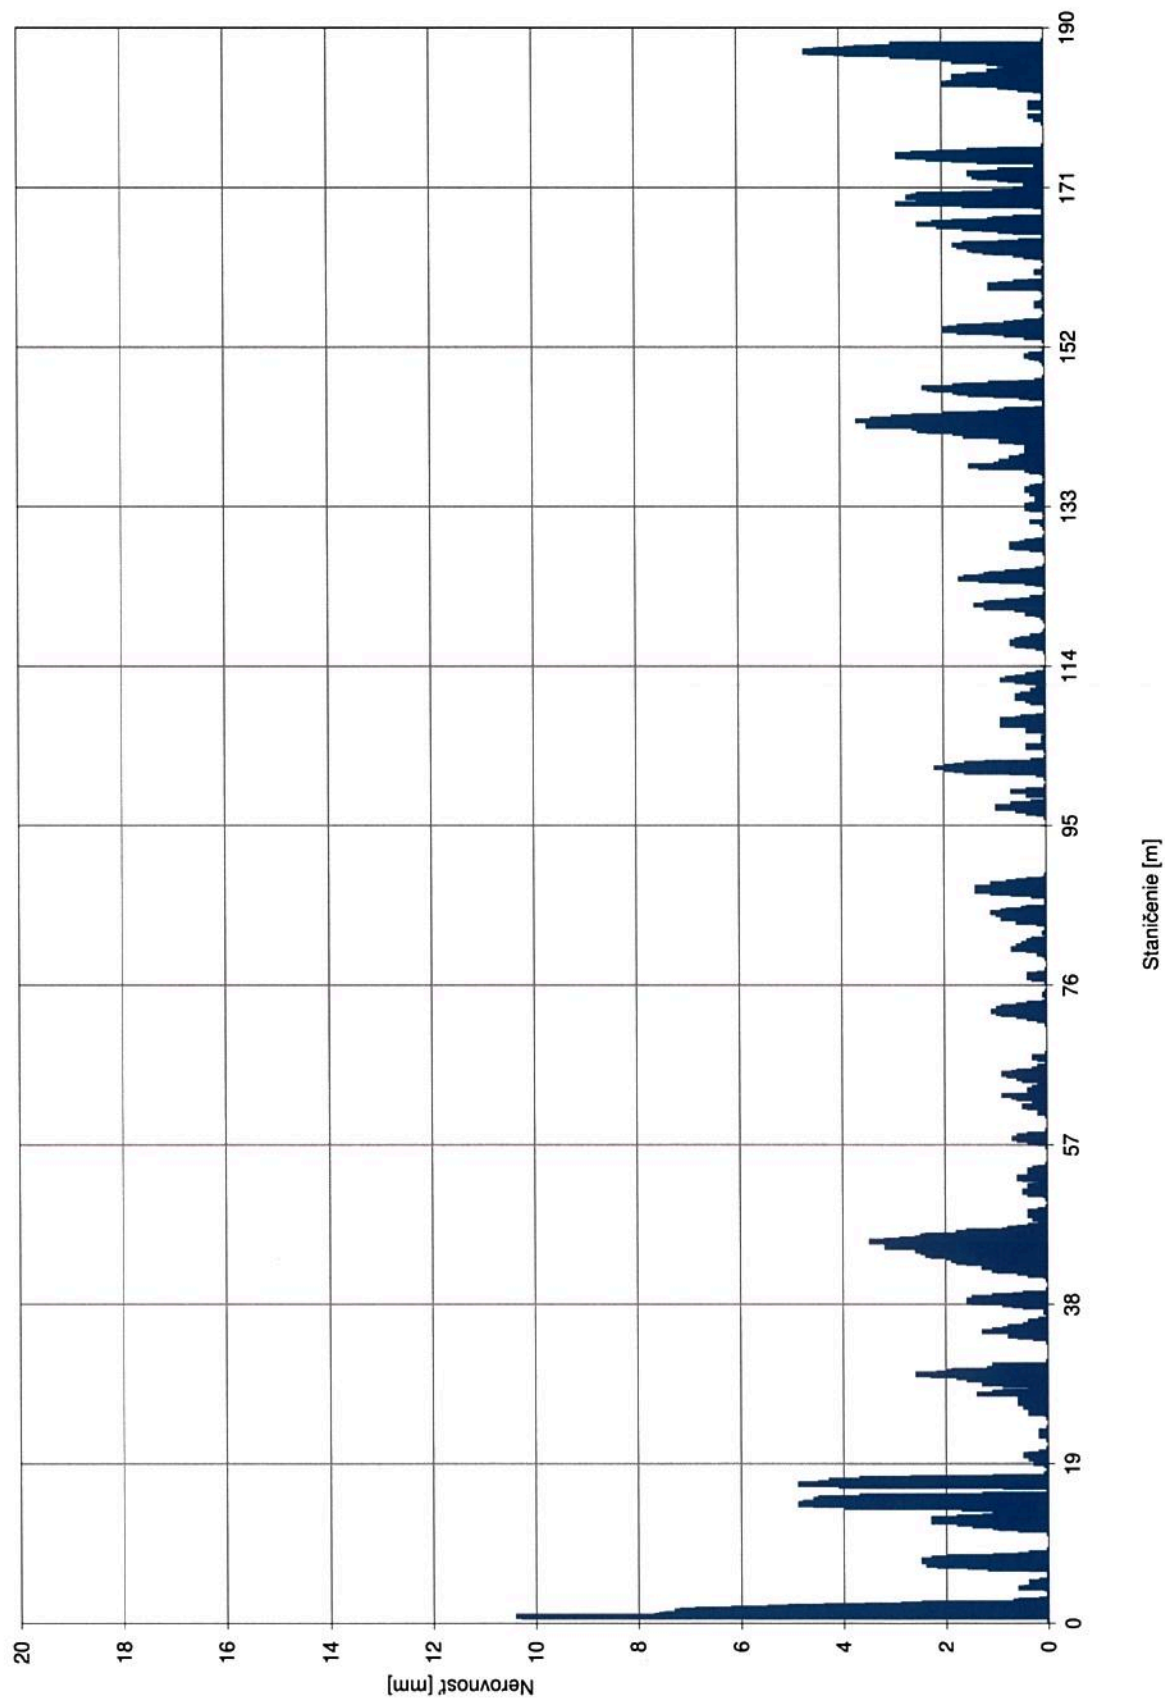

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina STRED - pracovisko Zvolen
 Neresnícka cesta 3, SK-96001 ZVOLEN
 tel: +421 45 5479993, fax: +421 45 5479993


Protokol / Protocol: SZV/2018/3553a-2
Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA
 Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.

 objednávka
 FBAV

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava strategického parku Nitra - Cestná infraštruktúra
 Objekt / Building object: SO:131 parkovisko a komunikácie pre osobné autá (parking Strategický park) II.Fáza
 Konštrukcia / Construction: obrusná vrstva krytu

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN EN 13036-7:2005
 Skúšobný postup: SP-V03
 Rozšírená neistota U(k=2): 11,9%
 Odchytky od skúšobného postupu: žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: AC 11 O PMB 45/80-75;I;ZH4

Material name:

Druh materiálu:

Material type: AC 11 obrus. PMB 45/80-75

Miesto merania:

Measuring site: stavba

Stančenie:

Stationing:

vid. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

 Záznamový lis č.: SZV/2018/3553
 Records note nr.:

Metóda:

Method:

3m lata, planograf

Začiatok skúšky (dátum-čas):

Test begining (date-time):

15.10.2018

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

15.10.2018

 Meraná rovinatosť:
 Measured evenness:

Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral

P.č. No.	stančenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	Lavá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	-	parkovisko 3 - C8			
2	km 0,000	číslo skúšky 25	číslo skúšky 24		
3	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
4	km 0,192	hodnôt : 42 z 1830	hodnôt : 16 z 1830		
5	km 0,008			2	2
6	km 0,048			2	2
7	km 0,088			2	2
8	km 0,128			3	2
9	km 0,168			2	2
10					
11	-	parkovisko 3 - C9			
12	km 0,000	číslo skúšky 27	číslo skúšky 26		
13	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
14	km 0,192	hodnôt : 25 z 1830	hodnôt : 16 z 1830		
15	km 0,008			2	2
16	km 0,048			2	3
17	km 0,088			2	2
18	km 0,128			2	2
19	km 0,168			3	2
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Pre meranie planografom zoznam všetkých nameraných údajov len na vyžiadanie.

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm]

≤ 5

priečna [mm]

≤ 5

Poznámky - Comments:

Namerané hodnoty obsahujú aj nerovnosť cestného profilu a projektovaných sklonov

Skúšan - Tested by:

SABACKÝ Peter

Kontroloval - Controlled by:

PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:

 Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

 Dátum vystavenia: 25.10.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nezhodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Protokol / Protocol: SZV/2018/3553a-2

Meraná rovinatosť / Measured evenness:		Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral			
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
26	-	parkovisko 3 - C10			
27	km 0,000	číslo skúšky 29	číslo skúšky 28		
28	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
29	km 0,192	hodnôt : 37 z 1800	hodnôt : 34 z 1830		
30	km 0,008			2	3
31	km 0,048			2	2
32	km 0,088			3	2
33	km 0,128			3	3
34	km 0,168			2	2
35					
36	-	parkovisko 3 - C11			
37	km 0,000	číslo skúšky 31	číslo skúšky 30		
38	až	počet presahujúcich	počet presahujúcich		
39	km 0,150	hodnôt : 11 z 1440	hodnôt : 0		
40	km 0,008			3	2
41	km 0,048			2	2
42	km 0,088			2	2
43	km 0,128			2	3
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm]

≤ 5

priečna [mm]

≤ 5

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

SABACKÝ Peter

Dátum vystavenia:

Date of issuance: 25.10.2018

Kontroloval - Controlled by:


PIVOLUSKA Ján

Schválil - Confirmed by:


Ing. DANCŠ Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

Meranie pozdĺžnych nerovností planograфом

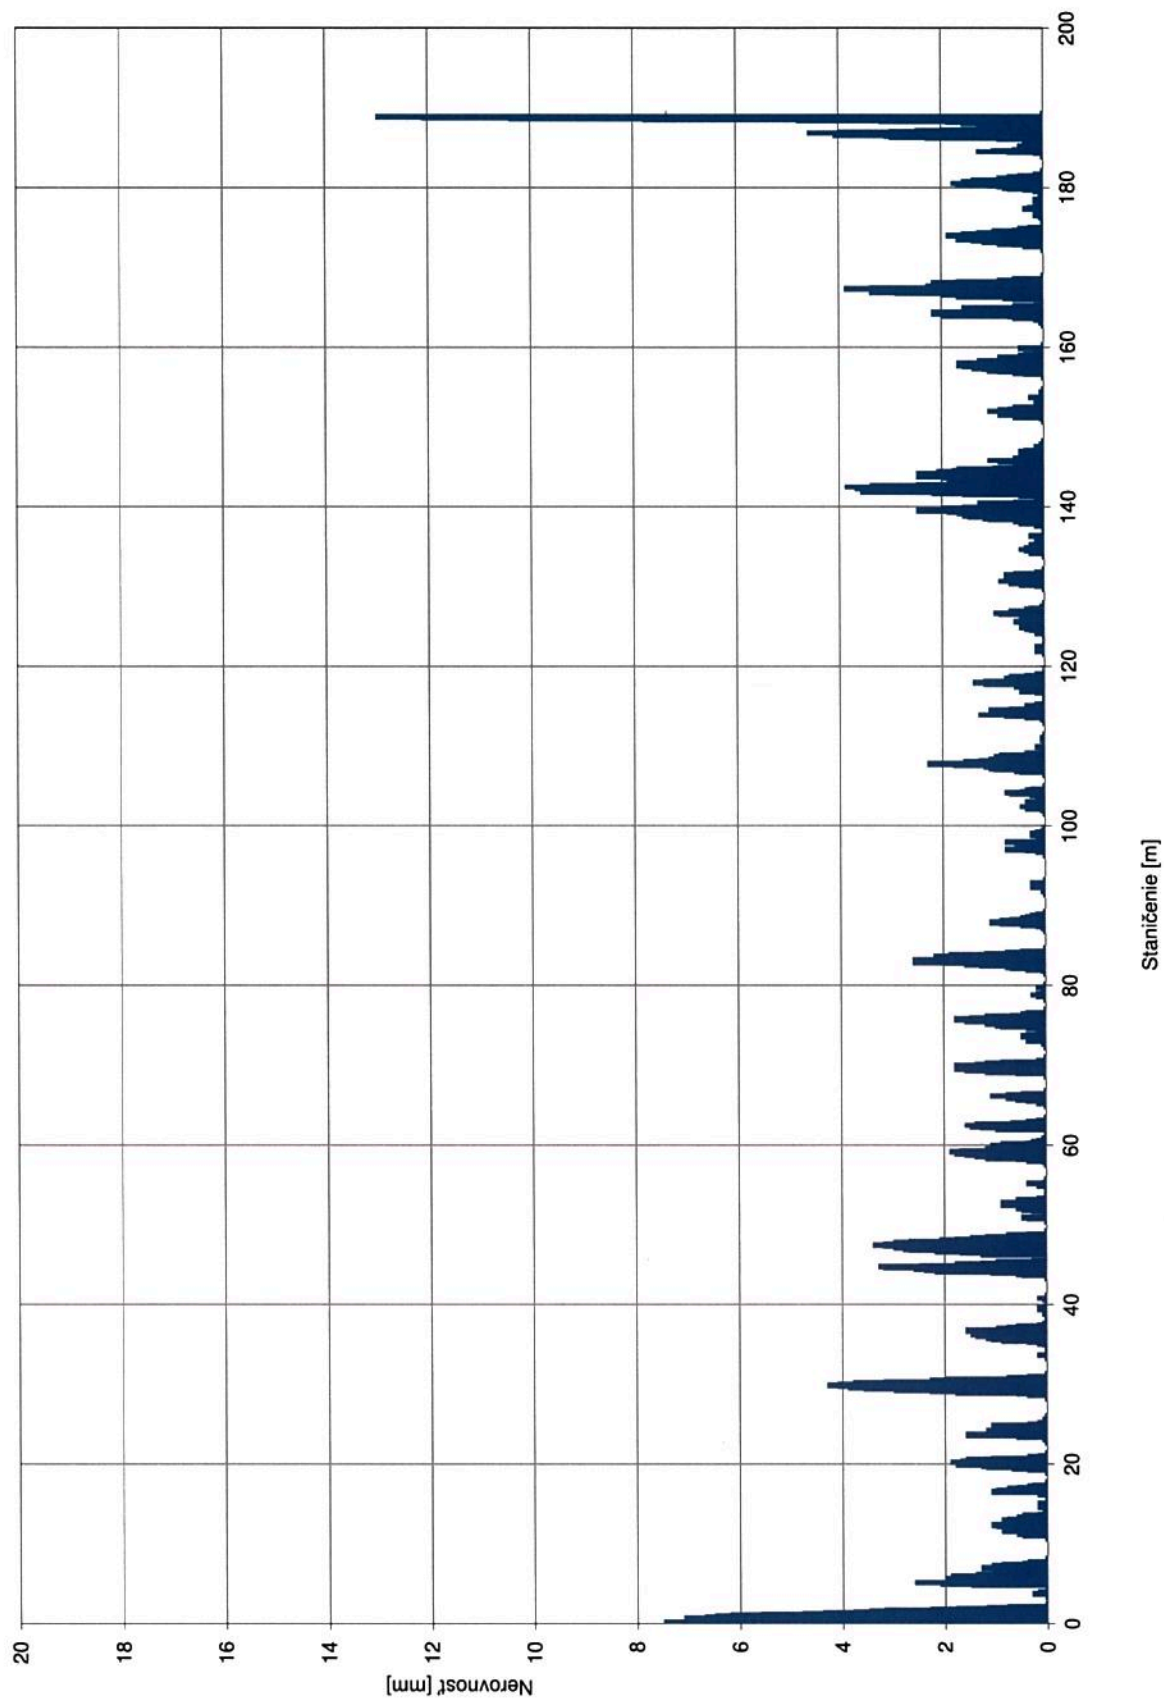


Meranie pozdĺžnych nerovností planograom

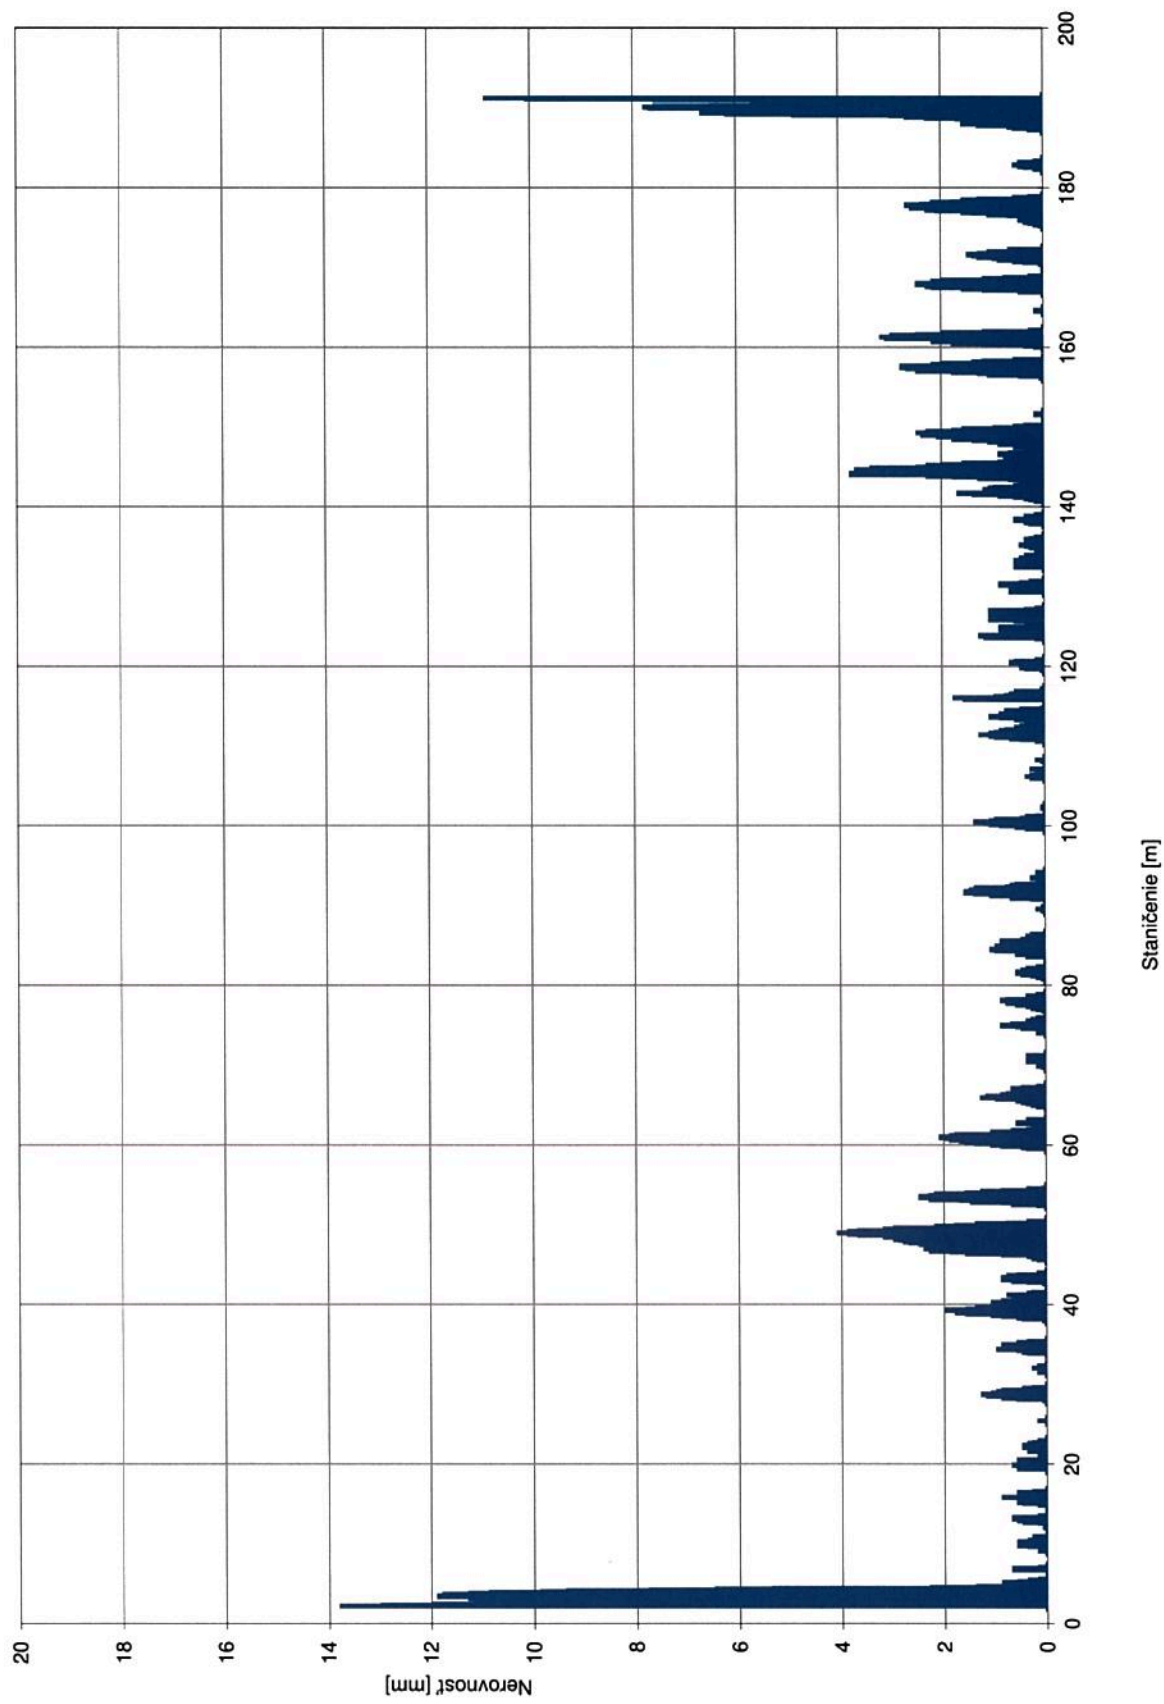


Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1


Číslo skúšky: 26
Dátum : 15.10.2018




Meranie pozdĺžnych nerovností planograom

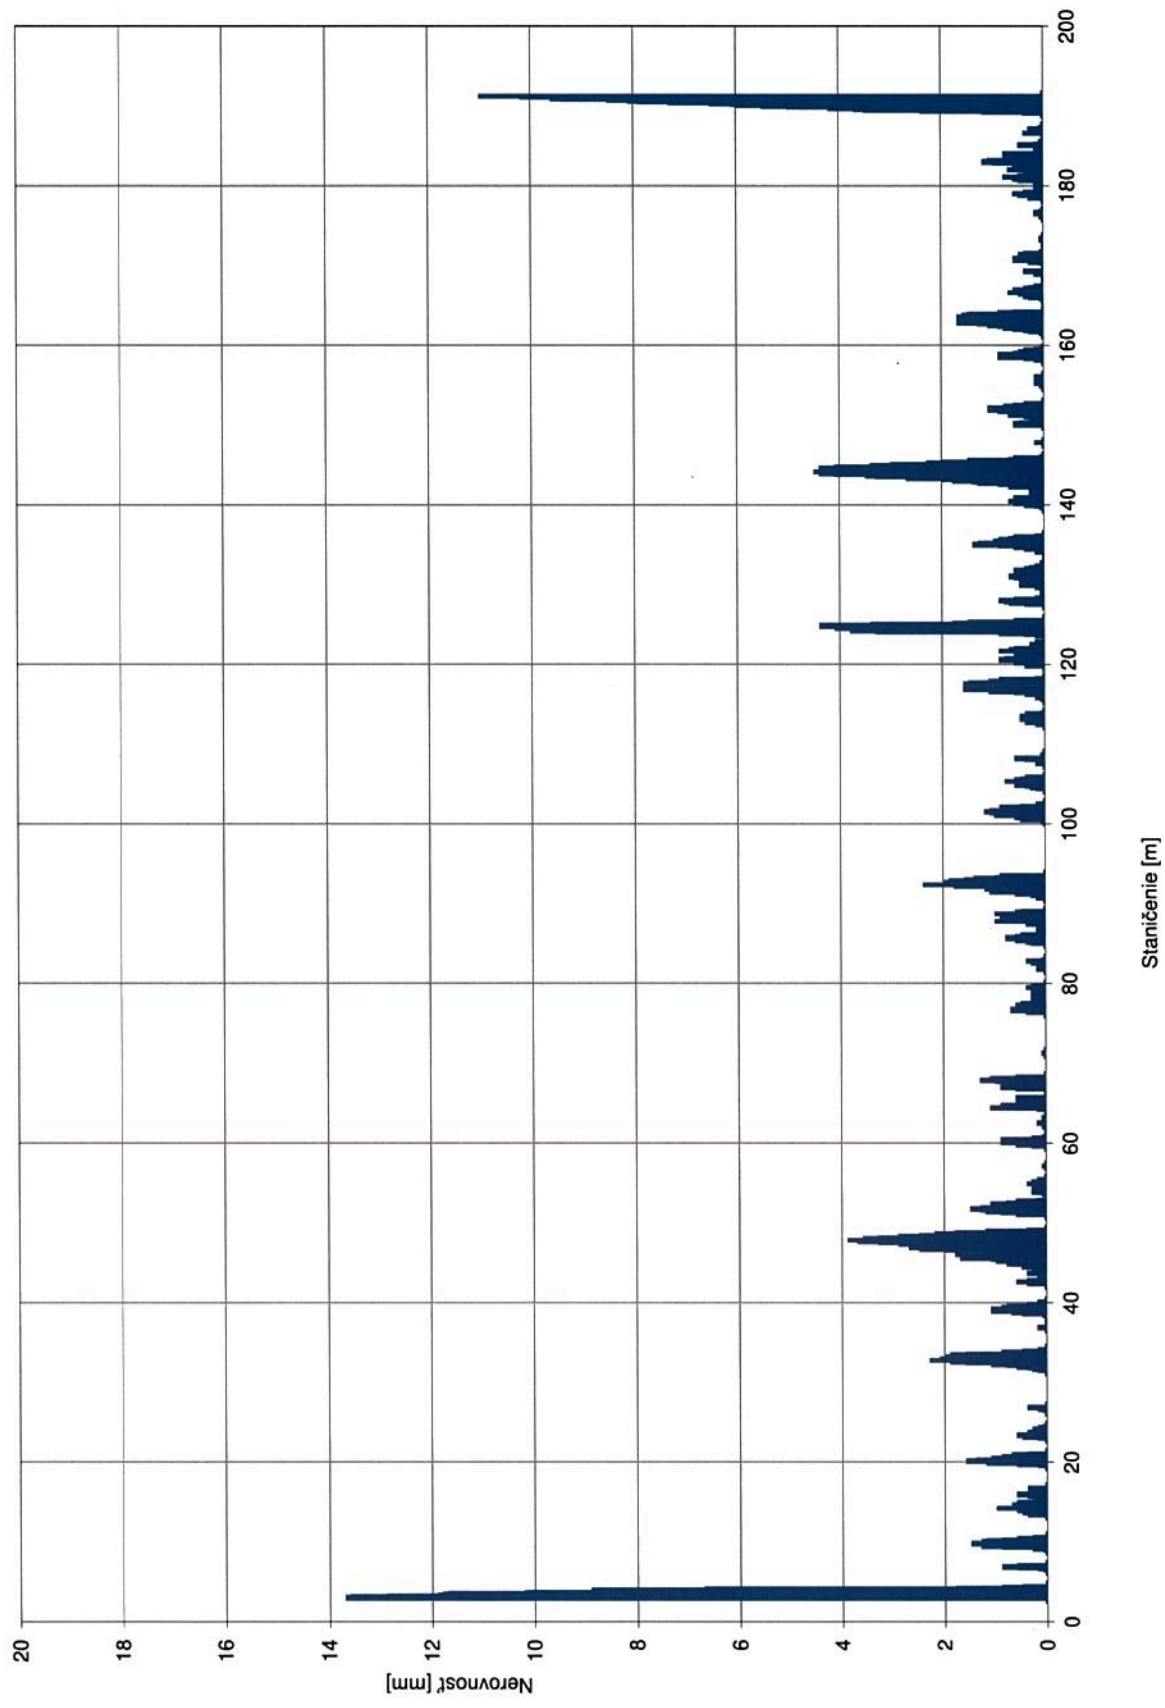

Meranie pozdĺžnych nerovností planograom

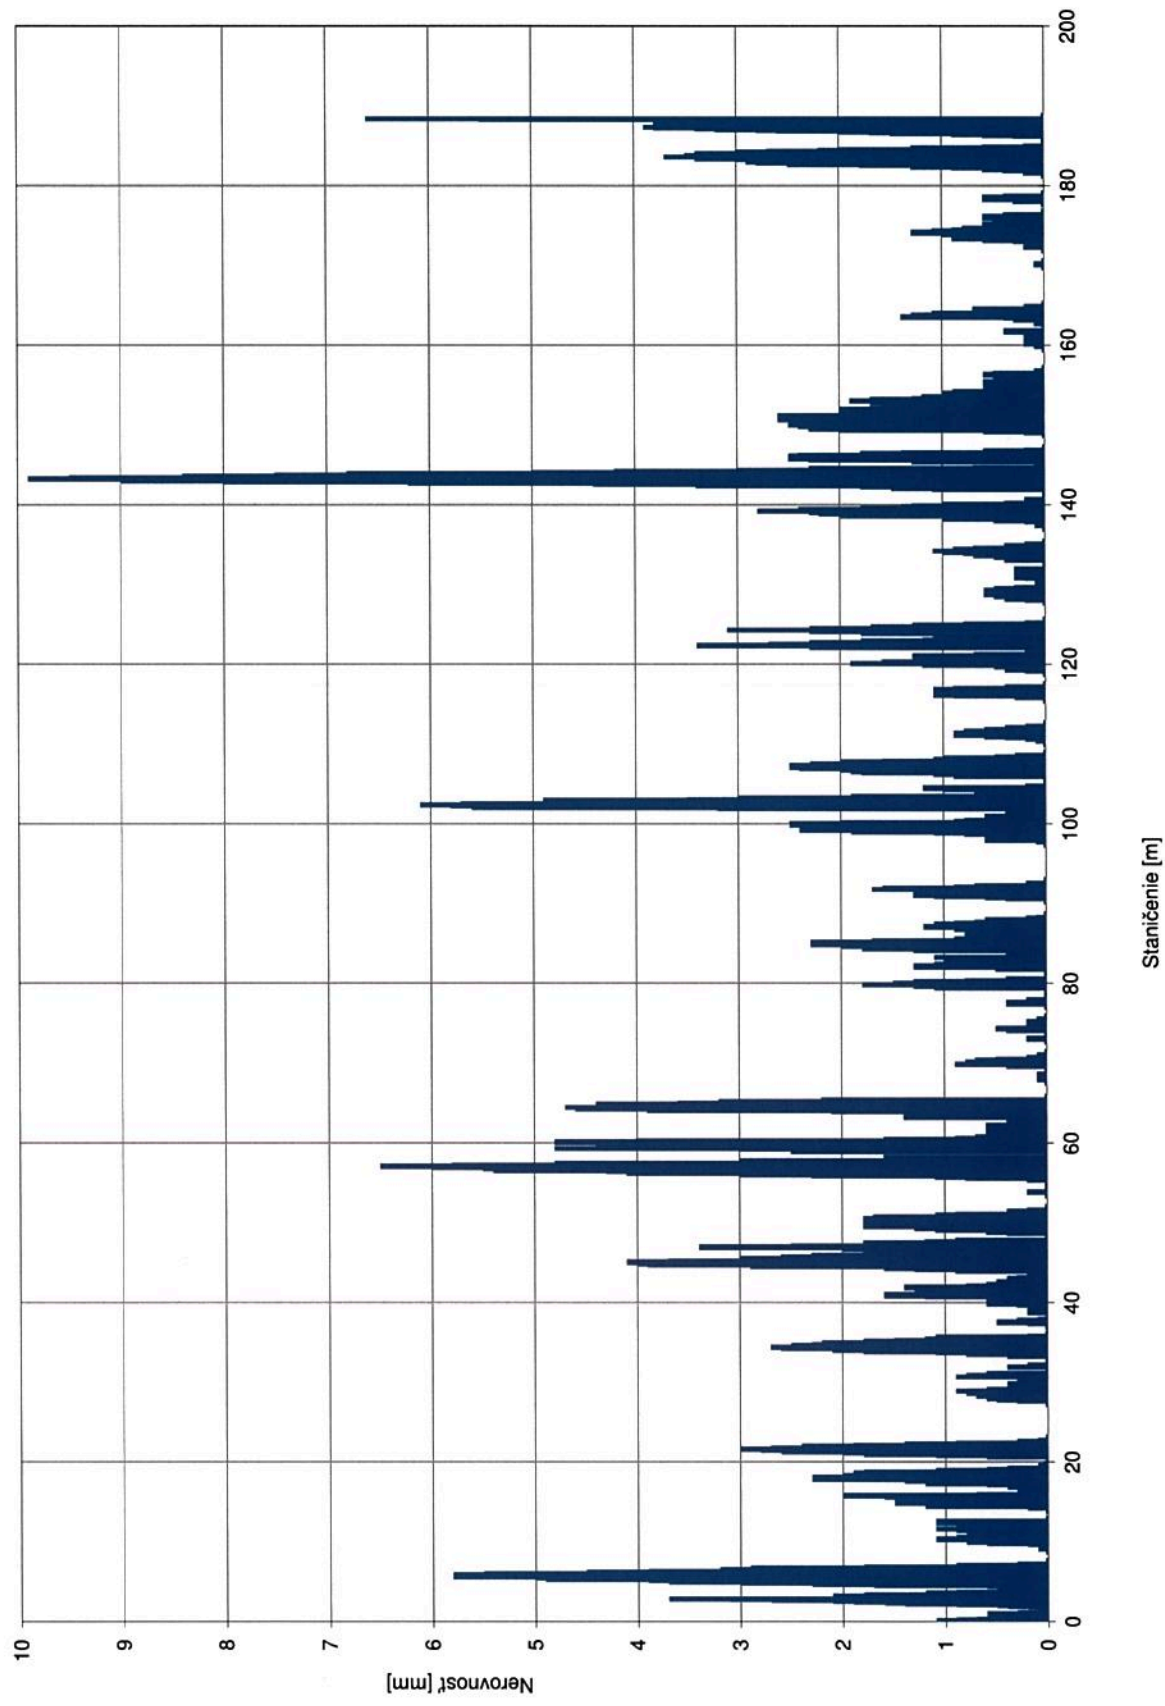


Meranie pozdĺžnych nerovností planograom

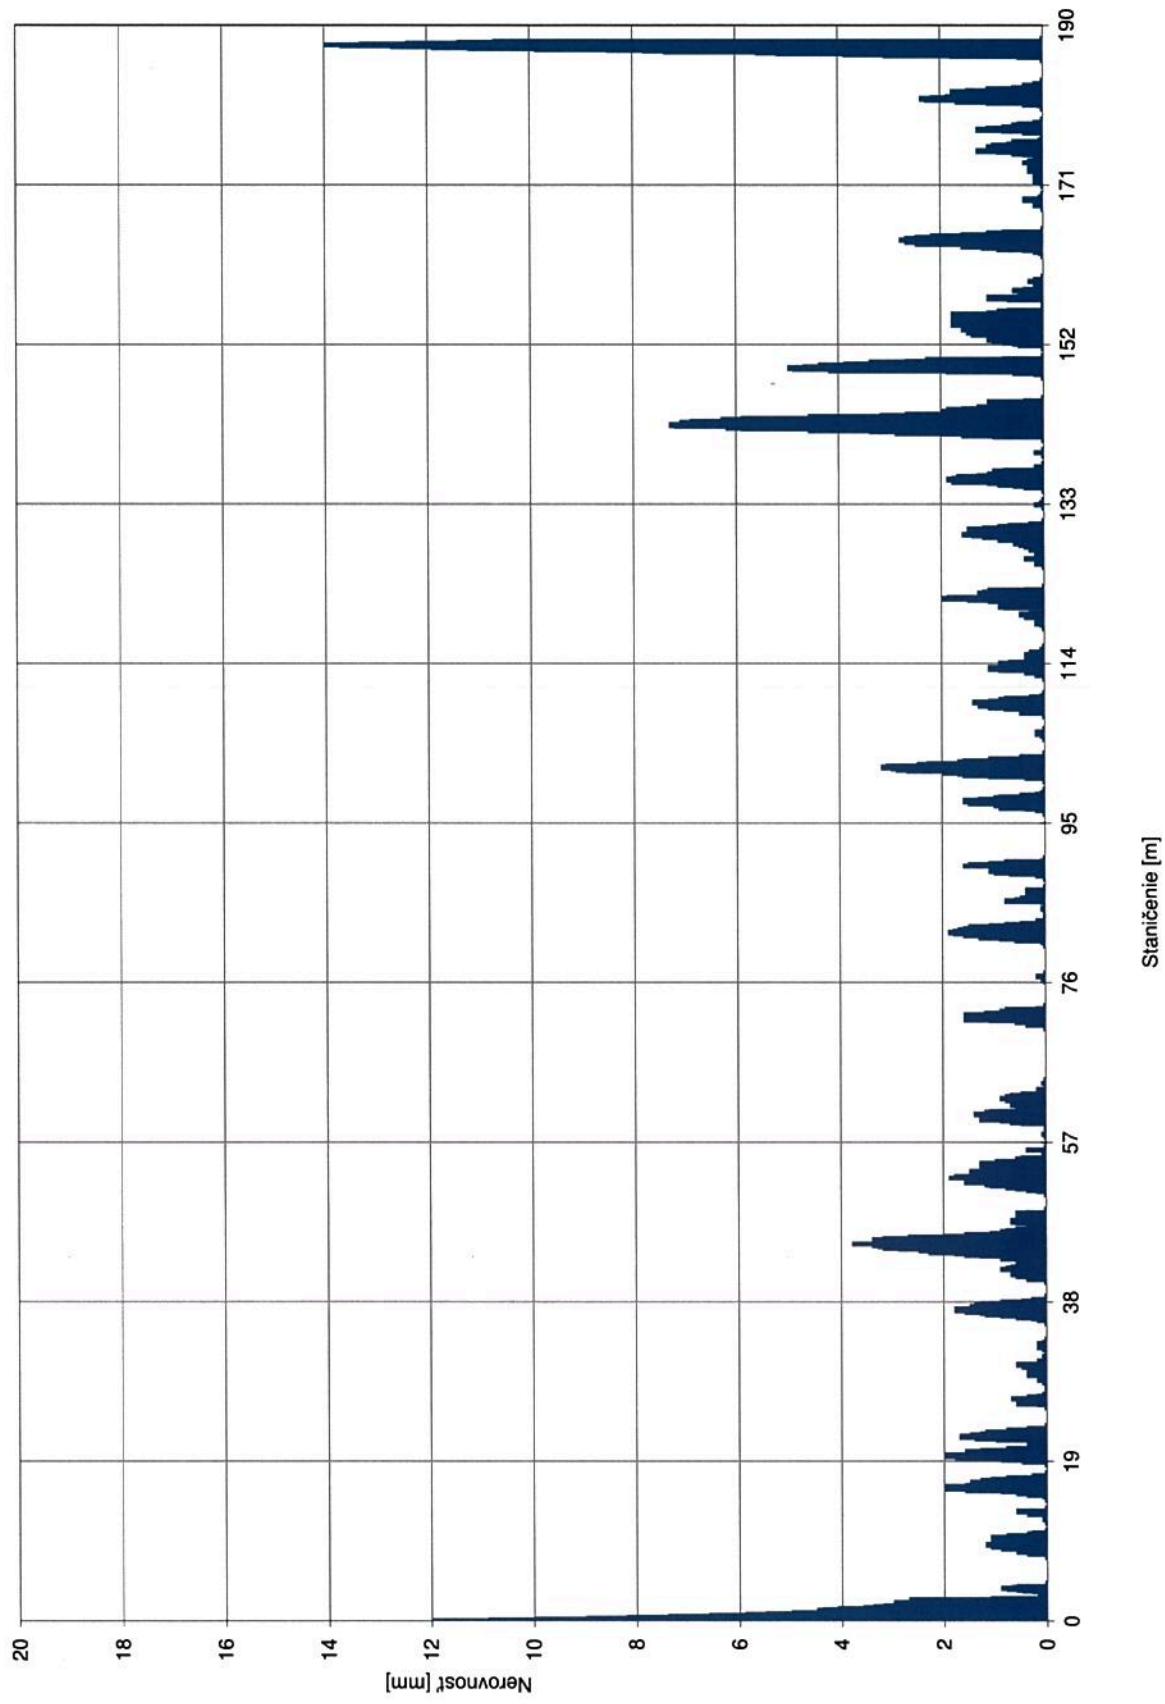

Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1


Číslo skúšky: 30
Dátum : 15.10.2018



Meranie pozdĺžnych nerovností planografom

Strana: 1

Číslo skúšky: 31
Dátum : 15.10.2018

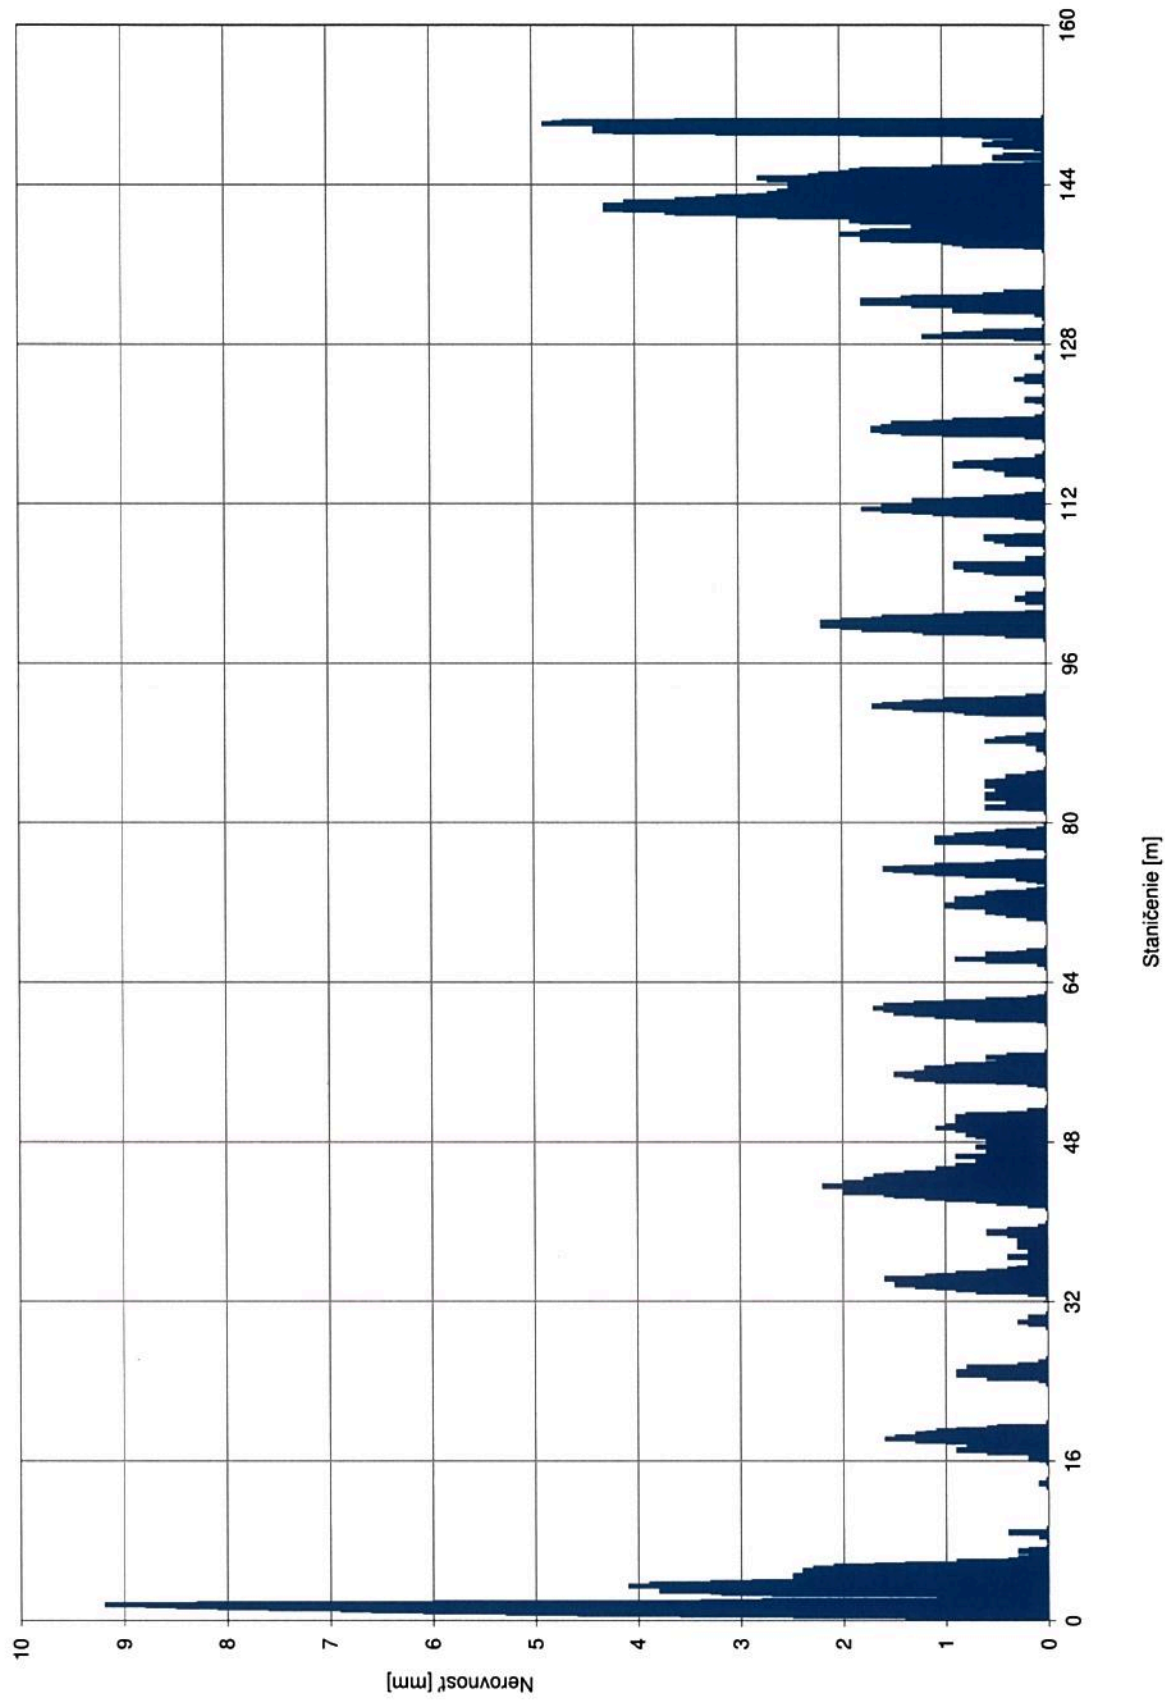

ZORUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA										
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra										
Dopravová STRABAG										
Dátum odberu	Protokol č.	Objekt	Staničenie (profil)	Typ konštrukcie	Typ skúšky	Materiál	Počet skúšok (dĺžka)	Požiadavka podľa TKP/STN/PD	Výsledok	Vyhovuje/ Nevyhovuje
23.4.2018	SPB/2018/1318h	131		ŠD 0/63	Rázová skúška	ŠD 0/63	1	-	v súlade	Vyhovuje
23.5.2018	SPB/2018/1471h	131		ŠD 0/63	Rázová skúška	ŠD 0/63	1	-	v súlade	Vyhovuje
4.5.2018	SPB/2018/1272c	SO 131	-	-	pevnosť v tlaku	C20/25 -XC2(SK)-S4	1	min 20 Mpa	50,8 Mpa	vyhovuje
29.10.2018	SPB/2018/4017a	131		zámková dlažba	Meranie	zámková dlažba	25	≤5	v súlade	Vyhovuje



Protokol / Protocol: SPB/2018/1318h
Rázová zaťažovacia skúška - Shock load test

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 131
Konštrukcia / Construction: spätný zásyp

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odchyly od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736133:2010 príloha G; STN 736192:2011	SP-Z09	3,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu: štrkodrvina
Material name:
Druh materiálu: 0/63 Pohranice
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:

Staničenie: vid'. nižšie
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: **SPB/2018/1318h**
Records note nr.:

Korelačný súčiniteľ: 2
Correlation factor:

Začiatok skúšky (dátum-čas):	23.04.2018
Test beginning (date-time):	
Koniec skúšky (dátum-čas):	23.04.2018
Test ending (date-time):	

[illegible]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Edef₂ [MPa]

Poznámky - Comments:

Hodnoty E_{vd} boli prepočítané pomocou súčiniteľa 2.0 (pre daný materiál) na hodnotu E_{def2} na základe zápisu v stavebnom denníku.

(N)

Skúšal - Tested by:
SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:
KUCHÁŘ Jaroslav

Schválil - Confirmed by:
Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 15.05.2018
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.

Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncompliance applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735



Reg. No. 211/S-176



Protokol / Protocol: SPB/2018/1272c

Pevnosť v tlaku - betónu / Strenght in pressure - concrete

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
 Výrobca / Producer: LADCE Betón, s.r.o., J. Kráľa 601, 018 63 Ladce, prevádzka Nitra

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 131
 Konštrukcia / Construction: neudaná

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 12390-3/AC:2012	SP-B03/1	4,1%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Označenie betónu:	C20/25 - XC2(SK) - CL 0,2 - Dmax. 16 - S4	Odobral:	SMATANA Zoltán
Concrete identifi.:		Sampler:	
Receptúra č. / CE:	-	Odbor (dátum-čas):	04.05.2018
Prescriptions n. /		Sampling (date-time):	
Miesto odboru:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	6.5.2018
Sampling site:		Entrance (date-time):	
		Začiatok skúšky (dátum-čas):	01.06.2018
		Test beginning (date-time):	
		Koniec skúšky (dátum-čas):	01.06.2018
		Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1272c
 Records note nr.:

Teplota:
 Temperature: [°C] 20,0

Zloženie zmesi / components of concrete mix:

Cement / Cement: CEM II 42,5 N
 Prísady / additions: Superplastifikačná
 Primesy / Admixtures: -

Označenie telesa / Specimen identification:	NRS/112	NRS/113	NRS/114
Dodací list / Dispath note:	56687	56687	56687
ŠPZ / MVRP:	NP 086 FZ	NP 086 FZ	NP 086 FZ
Konzistencia / Consistency: [mm]	-	-	-
Obsah vzduchu / Air content: [%]	-	-	-
Vek telesa / Specimen age: [dni]	28	28	28
Rozmer / Dimension d1 (priemer/diam.) [mm]	150,40	150,30	150,20
Rozmer / Dimension d3 (výška/height) [mm]	120,00	120,20	120,30
Plocha / Area: [cm²]	177,66	177,42	177,19
Objem / Volume: [cm³]	2131,90	2132,61	2131,55
Hmotnosť / Weight: [kg]	5,104	5,124	5,138
Obj.hmotnosť / Bulk density: [kg/m³]	2390	2400	2410
Sila / Power: [kN]	912,6	922,6	867,6
Pevnosť v tlaku: [MPa]	51,4	52,0	49,0
Compression strength:			
Priemerná pevnosť v tlaku: [MPa]	50,8		
Average compression strength:			
Stav povrchu telesa: State of specimen surface:	mokrý wet	mokrý wet	mokrý wet
Vyrovnávanie povrchu telesa: Line-uping of specimen surface:	-	-	-
Zvláštny typ porušenia telesa: Specific breaking type of specimen:	-	-	-

Požiadavka - Requirement:

Požiadavka na pevnosť je podľa požiadaviek STN EN 206 a súvisiacich noriem

[MPa]
≥ 20

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

REPKO Ondrej

Kontroloval - Controlled by:

Ing. CARASECOVA Monika

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 04.06.2018

Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

F17A-B03-2-10/17

(N) - neakreditované / unaccredited

strana / page: 1 z / of 1

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735

**SNAS**

Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2018/4017a****Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou / Irregularity measurement of pavement courses****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o. oblasť ZÁPAD, Mlynské nivy 61/A, SK-82724 BRATISLAVA
Zhotoviteľ / Contractor: HEX - STAV s.r.o., Hronska 1, SK-960 01 ZVOLEN,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
Objekt / Building object: SO: 131
Konštrukcia / Construction: zámková dlažba

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN EN 13036-7:2005	SP-V03	11,9%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:**(N)**

Názov materiálu: zámková dlažba
Material name:
Druh materiálu: zámková dlažba
Material type:
Miesto merania: stavba
Measuring site:
Staničenie: vid'. nižšie
Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/4017a
Records note nr.:

Metóda: 3m lata
Method:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.10.2018
Test beginning (date-time):
Koniec skúšky (dátum-čas): 29.10.2018
Test ending (date-time):

Meraná rovinnosť: Pozdĺžna a priečna / Longitudinal and Lateral					
Measured evenness:					
P.č. No.	staničenie stationing	Pozdĺžna / Longitudinal		Priečna / Lateral	
		L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]	L'avá strana / Left side [mm]	Pravá strana / Right side [mm]
1	P1/1	2;4		2;3	
2	P1/2	4;3		3;4	
3	P1/3	2;4		3;4	
4	P1/4	4;5		3;4	
5	P1/5	2;5		2;3	
6	P1/6	3;4		3;4	
7	P1/7	4;4		4;4	
8	P1/8	3;4		3;4	
9	P1/9	4;4		5;5	
10	P2/1	2;3		4;3	
11	P2/2	4;4		2;3	
12	P2/3	5;3		3;3	
13	P2/4	4;4		3;4	
14	P2/5	5;3		3;4	
15	P2/6	3;4		3;2	
16	P2/7	3;2		3;5	
17	P2/8	5;4		5;4	
18	P2/9	5;3		3;3	
19	P3/1	3;5		3;4	
20	P3/2	3;3		5;5	
21	P3/3	3;4		3;3	
22	P3/4	4;2		5;3	
23	P3/5	5;2		3;3	
24	P3/6	5;2		4;2	
25	P3/7	4;4		3;4	

Požiadavka - Requirement:

Podľa noriem a príslušných TKP je požadovaná hodnota v mm

pozdĺžna [mm] ≤ 5 priečna [mm] ≤ 5

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 07.11.2018
Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukovaný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Doprastav

STRABAG

3. VYHODNOTENÉ KSP, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA
DOPRASTAV - STRABAG
 Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
SO 131 Parkovisko a komunikácie pre osobné autá - vyhodnotenú KSP



A	B	C	D	E	F	H	I	Vyhodnotenie		
								Vyhovujúce	Nevyhovujúce	Opravné
5	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	20 966	m3	kontrolné	mera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m3 (1sk/1000m3)	21	21x SZS + 12xTroxler	x	x
					zrntosť	1sk/5000 m3	5	5		
7	Násyp - aktívna zóna vozovky - konštrukčná pláň	22 704	m3	preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1	1		
				preberacie	mera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1000 m2 /1sk./2000 m2	30	17x SZS + 16xTroxler	x	x
					rovinatosť pričná	po 100 m		3	x	x
					rovinatosť pozdĺžna	po 100 m		3	x	x
					zrntosť	1sk/5000 m3	5	5	x	x
					celistvosť povrchu	priebežne vizuálne		3x LDD	x	x
					celistvosť povrchu	priebežne		1	x	x
9	Spevňovanie hornín a konštrukcii - Geotextilie, geomreže	69 887	m2	preukazná	vyhlásenie o parametroch	každá dodávka	1	1	x	x
								9	x	x
Konštrukcia vozovky										
				preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu; vyhlásenie o parametroch	1/ druh	1	18	x	x
				kontrolné	zrntosť	1 sk./1000m3	14	14	x	x
					vlhkosť zmesi	2 sk/ deň	6	7x troxler	x	x
12	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, nestmelené, UMŠD fr.0-31,5 hr. 170 a 190 mm	13917,98 m3 (72793 m2)	m3 m2		mera zhutnenia/únosnosť	1 sk./1500 m2	49	21x SZS + 21x troxler + 9xLDD	x	x

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRADOPRASTAV - STRABAG
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava**STRABAG****Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra****SO 131 Parkovisko a komunikácie pre osobné autá - vyhodnotené KSP**

	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok požadovaný	Vyhodnotenie		
								Vyhovujúce	Nevyhovujúce	Opravné
A	B	C	D	E	F	H	I			
				preberacie	hrúbka vrstvy, odchýlka od prierehného sklonu max. (%) (niveľáciou)	po 100 m	geodetické zameranie	priebežne	x	x
				preukazná	nerovnosť - priečna	po 100 m	po 100 m	1	x	x
				preukazná	nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	1	x	x
				preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu	každý druh sypaniny	1		x	x
13	Spevnenie krajnic štrkodrinou fr. 0/22 mm, rozprestrenie, zhutnenie, hr.100 mm	43 + 14	m3	preberacie	miera zhutnenia/únosnosť	1 sk./2000 m2 (pre nepriame metódy je potrebný trojnásobný počet skúšok)	min. 3	3xLDD	x	x
				preukazná	posúdenie vhodnosti materiálu, vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	1	x	x
				kontrolné	zrntosť kameniva	1 x za týždeň	výrobca	výrobca	x	x
				kontrolné	pevnosť cementu	1 x mesačne	výrobca	výrobca	x	x
				kontrolné	pevnosť v tlaku fc7	1 x denne	5	39	x	x
				kontrolné	pevnosť v tlaku fc28	1 x denne	5	39	x	x
14	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, CBGM C5/6 hr. 200 mm	13919,25 m3 (72793 m2)	m2	preberacie	miera zhutnenia	1 sk./1 500 m2	49	56	x	x
				preberacie	vlhkosť zmesi	2sk/deň	10	53	x	x
				preberacie	hrúbka vrstvy, odchýlka od prierehného sklonu max. (%) (niveľáciou)	po 100 m	po 100 m	po 100 m	x	x
				preberacie	nerovnosť - priečna	po 100 m	po 100 m	po 100 m	x	x
				preberacie	nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	priebežne	x	x

	Hodnotený prvok	Množstvo	M.j.	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Počet skúšok požadovaný	Vyhodnotenie		
								Vyhovujúce	Nevyhovujúce	Opravné
A	B	C	D	E	F	H	I			
15	Infiltračný postrek 0,8 kg/m2	23 784	m2	preukazná	vyhlásenie o parametroch	1x	1	1	x	x
16	Spojovací postrek 0,5 kg/m2	23 784	m2	preukazná	vyhlásenie o parametroch	1x	1	1	x	x
				preukazná	vlastnosti asfaltovej zmesi + VoP	variant asfaltovej zmesi	1	1	x	x
					zhutňovací pokus	asfaltovej zmesi	1	1	x	x
					vstupné materiály - kamenivo (výrobca AZ-vzorky zo skládky vo výrobní AZ)	1sk/2000t	2	2	x	x
					vstupné materiály - kamenná múčka (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/600t	6	6	x	x
					vstupné materiály - asfalt (výrobca AZ-vzorky z výrobní AZ)	1sk/300t	13	13	x	x
					rozbor asfalt. zmesi	1 sk./ 1000 t	1	9	x	x
17	Podkladové vrstvy z asfaltových zmesí asfaltový betón AC 22 P; 35/50; I hr. 70mm	1664,88 m3; 23784 m2; 3912 t	m3; m2; t	kontrolné, preberacie	objemová hmotnosť, medzerovitost' pomer pevnosti v prietom ťahu (citlivosť na vodku)	1 sk./ 1000 t	4	1	x	x
					miera zhutnenia vrstvy na vývrtoch	1 sk./ 5000 t	1	1	x	x
					meranie teploty zmesi	1 sk./ 2000 m2	12	17	x	x
					hrúbka vrstvy (vývrt)	1sk/auto	priebežne	priebežne	x	x
						1 sk./ 2000 m2	12	17	x	x
					nerovnosť - pozdĺžna	priebežne	priebežne	priebežne	x	x
					nerovnosť - priečna	po 40 m	po 40 m	po 40 m	x	x
					max.pomerná hĺbka vjazdenej koľaje PRD air	1/3000 t	2	3	x	x

**4. DOKLADY, CERTIFIKÁTY A VYHLÁSENIA O PARAMETROCH K POUŽITÝM MATERIÁLOM
– PRÍLOHY SÚ SÚČASŤOU ZÁVAREČNEJ DOKUMENTÁCIE KVALITY SO 128****Zeminy a sypaniny**

- 2017/IN/MAT/003 – zemina zlepšená hydraul.spojivom PST č. SPB/2017/770 + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/063 – zemina zlepšená hydraul.spojivom PST č. SPB/2017/2378
- 2017/IN/MAT/021 – štrkodrvina fr. 0-63mm - PST č. 15/2017/PS/Z/ZV + zhutňovací pokus
- 2018/IN/MAT/019 – štrkodrvina fr. 0-22, 32-63, 8-32mm – krajnice; drenážne vrstvy; lôžko

Geosyntetické materiály

- 2017/IN/MAT/002 – geosyntetické materiály výrobcu Low and Bonar Geosynthetics
- 2017/IN/MAT/094 – geosyntetické materiály výrobcu Maccaferri

Konštrukčné vrstvy vozovky

- 2017/IN/MAT/051 – nestmelená vrstva UMŠD 0-31,5 Gc – lom Pohranice + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/052 – stmelená vrstva CBGM C5/6-0/20- výrobca Alas Slovakia s.r.o. + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/055a – asfaltová vrstva AC 22 P 35/50; I; - výrobca Strabag s.r.o. + zhutňovací pokus
- 2017/IN/MAT/055a – asfaltový penetračný a infiltračný postrek - výrobca Bitunova
- 2017/IN/MAT/106 – asfaltová vrstva AC 22 L PmB 45/80-75; I;
asfaltová vrstva SMA 11 PmB 45/80-75; I;
asfaltová vrstva AC 11 O PmB 45/80-75; I
výrobca Strabag s.r.o. + zhutňovací pokus

Betón a CB kryt

- 2017/IN/MAT/015a – betón C12/15 a C 25/30 XC3, XA1 – výrobca ALAS Slovakia – obetónovanie potrubia (priepustu)
- 2018/IN/MAT/068 – Betón CB III – výrobca ALAS Slovakia
- 2018/IN/MAT/069 – Klzné trne – výrobca LIKAL s.r.o.
- 2018/IN/MAT/070 – malta na opravu povrchov PCI Repafast Fluid – výrobca PCI Augsburg GmbH
- 2018/IN/MAT/071 – oprava povrchov – Sikadur 31 CF Rapid – výrobca Sika Schweiz
- 2018/IN/MAT/072 – zálievky – výrobca Bornit, Cearfco, Biguma, Nomaco, Dortmund Guzasphalt

Vybavenie a ostatné konštrukcie

- 2017/IN/MAT/073 – liatinové poklopy a mreže – výrobca Kasi s.r.o.
- 2018/IN/MAT/049 – vodorovné a zvislé dopravné značenie – výrobca Hatrick s.r.o.; SATES a.s.; Doprastav a.s.; Helvet s.r.o.
- 2017/IN/MAT/121 – zálievková hmota Biguma – výrobca Dortmunder Gubasfalt – asfaltová pružná zálievka
- 2017/IN/MAT/135 – skruže a šachty – výrobca Zábojník
- 2017/IN/MAT/137 – hydroosev – výrobca ARBOR
- Cestný, rovný a nájazdový obrubník – výrobca Semmelrock
