

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



2. ZREALIZOVANÉ SKÚŠKY

	Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet skúšok	Vykonaný počet
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE									
1	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením (0/63)	m3	2 483,98	preukazná	Preukazná skúška / Vyhlásenie o parametroch	TKP časť 2, STN 73 6133; Zákon 133/2013	každý typ sypaniny	1	1
				kontrolné	únosnosť/miera zhutnenia	TKP časť 2, STN 73 6133	1sk/500 m3 (3x LDD, alt1 x TROXLER)	min.5	12
2	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením (0/22)	m3	3 812,98	preukazná	Preukazná skúška / Vyhlásenie o parametroch	TKP časť 2, STN 73 6133; Zákon 133/2013	každý typ sypaniny	1	1
				kontrolné	únosnosť/miera zhutnenia	TKP časť 2, STN 73 6133	1sk/500 m3 (3x LDD, alt1 x TROXLER)	min.8	9

Rázová zaťažovacia skúška - protokol č.:

SPB/2018/1787h- vyhovuje fr.0/63 – 9 skúšok

SPB/2018/3048- vyhovuje fr.0/63 – 3 skúšky

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín - protokol č.:

SPB/2018/1759- vyhovuje fr.0/22 – 5 skúšok (obsyp)

SPB/2018/1683- vyhovuje fr.0/22 – 1 skúška (obsyp)

SPB/2018/1682- vyhovuje fr.0/22 – 3 skúšky (lôžko)

SPB/2018/2627- vyhovuje fr.0/22 – 2 skúšky (obsyp)

SPB/2018/3049- vyhovuje fr.0/22 – 2 skúšky (lôžko+obsyp)

	Hodnotený prvok	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Predpis, norma	Početnosť skúšok	Požadovaný počet skúšok	Vykonaný počet
PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE - VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ									
3	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého	m3	21,61	preukazná	STV betón + VoP	STN EN 206	trieda a typ betónu	trieda a typ betónu	1

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

4	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy debnenie tradičné	m	41,2	kontrolná	porovnanie s PD	PD	pred betonážou	pred betonážou	1
5	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spadoviská kanalizačné	ks	49	preukazná	Vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	1	1
6	Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP	m	2 926,50	preukazná	Vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	1	1
7	Kanalizácie, ostatné konštrukcie - skúška potrubia	m	2926,5	kontrolná	skúška vodotesnosti potrubia	EN 1610	medzi šachtami	medzi šachtami	1
8	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	49,00	preukazná	Vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	každá dodávka	1	1
9	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	725,38	preukazná	Preukazná skúška / Vyhlásenie o parametroch	TKP časť 2, STN 73 6133; Zákon 133/2013	každý typ sypaniny	1	1
				kontrolné	únosnosť/miera zhutnenia	TKP časť 2, STN 73 6133	1sk/500 m3 (3x LDD, alt1 x TROXLER)	min.2	4

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET + PROTOKOLY Z KAMEROVEJ PREHLIADKY POTRUBIA

BM-MONT s.r.o.

č. atestu	Objekt	Denník	Dátum skúšky	Závod. stredisko	Stavba	Konstrukcia	staničenie v km	materiál	lokalita	druh frakcia...	Počet meraní	typ skúšky	požadovaná hodnota	dosiahnutá hodnota	pomer V / N	Dĺžka úseku m
1	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd60 - KŠd59	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,5
2	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd58 - KŠd59	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
3	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd58 - KŠd57	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,5
4	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd19 - KŠd57	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
5	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd23 - KŠd24	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,5
6	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd22 - KŠd23	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
7	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd22 - KŠd21	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
8	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd20 - KŠd21	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
9	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd18 - KŠd19	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
10	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd20 - KŠd19	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
11	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd21 - KŠd57	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
12	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd23 - KŠd59	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
13	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd24 - KŠd60	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
14	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd60 - KŠd56	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
15	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd59 - KŠd55	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
16	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd58 - KŠd54	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
17	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd57 - KŠd53	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
18	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd22 - KŠd54	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
19	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd38 - KŠd37	PP SN 10	NITRA	DN 1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,5
20	517	-	18.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd37 - KŠd14	PP SN 10	NITRA	DN 1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



DELL TRADE

č. atestu	Objekt	Denník	Dátum skúšky	Závod. stredisko	Stavba	Konstruktia	staničenie v km	materiál	lokalita	druh frakcia...	Počet meraní	typ skúšky	požadovaná hodnota	dosiahnutá hodnota	pomer V / N	Dĺžka úseku m
1	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd15 - KŠd41	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
2	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd41 - KŠd42	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,5
3	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd42 - KŠd43	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
4	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd43 - KŠd44	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,5
5	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd16 - KŠd45	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
6	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd45 - KŠd46	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,5
7	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd46 - KŠd47	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
8	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd47 - KŠd48	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,5
9	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd15 - KŠd16	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
10	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd16 - KŠd17	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
11	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd41 - KŠd45	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
12	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd45 - KŠd49	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
13	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd42 - KŠd46	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
14	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd46 - KŠd50	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
15	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd43 - KŠd47	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
16	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd47 - KŠd51	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
17	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd44 - KŠd48	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
18	517	-	12.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd48 - KŠd52	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
19	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd38 - KŠd39	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
20	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd39 - KŠd40	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,50
21	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd15 - KŠd14	PP SN 10	NITRA	DN 1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20
22	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd41 - KŠd37	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20
23	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd42 - KŠd38	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20
24	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd43 - KŠd39	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20
25	517	-	25.9.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd44 - KŠd40	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



NAJDEK s.r.o.

č. atestu	Objekt	Denník	Dátum skúšky	Závod. stredisko	Stavba	Konstrukcia	staničenie v km	materiál	lokalita	druh frakcia...	Počet meraní	typ skúšky	požadovaná hodnota	dosiahnutá hodnota	pomer V / N	Dĺžka úseku m
1	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd 45 - KŠd49	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
2	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd46 - KŠd50	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
3	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd47 - KŠd51	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
4	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd48 - KŠd52	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
5	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd49 - KŠd53	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
6	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd50 - KŠd54	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
7	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd51 - KŠd55	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
8	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd52 - KŠd56	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
9	517	-	11.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd17 - KŠd49	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
10	517	-	11.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd49 - KŠd50	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,5
11	517	-	11.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd50 - KŠd51	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
12	517	-	11.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd51 - KŠd52	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,5
13	517	-	21.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd18 - KŠd53	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
14	517	-	21.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd53 - KŠd54	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,5
15	517	-	21.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd54 - KŠd55	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
16	517	-	21.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd55 - KŠd56	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,5
17	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd4 - KŠd11	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	17,0
18	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd11 - KŠd12	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
19	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd12 - KŠd13	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
20	517	-	22.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd13 - KŠd14	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0
21	517	-	21.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd16 - KŠd17	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20,0
22	517	-	11.6.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	KŠd17 - KŠd18	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10,0

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA
DOPRASTAV - STRABAG
Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava



TERA TECHNIK, s.r.o.

č. atestu	Objekt	Denník	Dátum skúšky	Závod. stredisko	Stavba	Konstruktúra	staničenie v km	materiál	lokalita	druh frakcia...	Počet meraní	typ skúšky	požadovaná hodnota	dosiahnutá hodnota	pomer V / N	Dižka úseku m
1	517	-	29.8.2018 k (30.7.2018t.)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 32 – Kšd31	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,70k (50t)
2	517	-	29.8.2018k (10.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 28 – Kšd27	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,90k (50t)
3	517	-	29.8.2018k (10.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 27 – Kšd26	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,0
4	517	-	29.8.2018k(10.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 26 – Kšd25	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,50k (50t)
5	517	-	10.09.2018 (k+t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 31 – Kšd30	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,10k (50t)
6	517	-	10.09.2018 (k+t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 30 – Kšd29	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,60k (50t)
7	517	-	10.09.2018 (k+t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 29 – Kšd12	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,20k (50t)
8	517	-	10.09.2018k(30.7.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 25 – Kšd11	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,20k (50t)
9	517	-	10.09.2018k (11.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 28 – Kšd32	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10
10	517	-	10.09.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 36 – Kšd32	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20
11	517	-	10.09.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 35 – Kšd31	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20
12	517	-	10.09.2018k (11.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 27 – Kšd31	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10
13	517	-	10.09.2018k (11.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 34 – Kšd30	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20k (18t)
14	517	-	10.09.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 26 – Kšd30	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10
15	517	-	10.09.2018k (11.9.2018t)	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 33 – Kšd29	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	20k (18t)
16	517	-	10.09.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd 25 – Kšd29	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	10
17	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd36–Kšd40	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
18	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd35–Kšd39	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
19	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd34–Kšd38	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
20	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd33–Kšd37	PP SN 10	NITRA	DN500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
21	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd35–Kšd36	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
22	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd34–Kšd35	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
23	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd33–Kšd34	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
24	517	-	30.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd13–Kšd33	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50
Prípojky																
25	517	-	31.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd13	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	48,10
26	517	-	31.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd33	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	54,30
27	517	-	31.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd34	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	50,10

ZDRUŽENIE INFRAŠTRUKTÚRA NITRA

DOPRASTAV - STRABAG

Generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

doprastav

STRABAG

28	517	-	31.7.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd35	PP SN 10	NITRA	DN1000	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	53,50
29	517	-	7.8.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd37	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	9,6
30	517	-	7.8.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd38	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	9,4
31	517	-	7.8.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd39	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	9,8
32	517	-	7.8.2018	INPEK	Park Nitra	Kanalizácia	Kšd40	PP SN 10	NITRA	DN 500	1	LC	100 mbar	0,0 mbar	V	9,8



SNAS

Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2018/3048****Rázová zaťažovacia skúška - Shock load test****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra
 Zhotoviteľ / Contractor: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 517
 Konštrukcia / Construction: spätný zásyp

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 736192:2011	SP-Z09	3,0%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: štrkodrvina
 Material name:
 Druh materiálu: Pohranice 0/63
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: vid'. nižšie
 Stationing:

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/3048	Korelačný súčiniteľ: 1,8	Začiatok skúšky (dátum-čas): 28.08.2018
Records note nr.:	Correlation factor:	Koniec skúšky (dátum-čas): 28.08.2018
		Test ending (date-time):

Miesto merania / place of measurement	Dynamický modul Dynamic module $E_{pr,r}$ [MPa]	Modul deformácie Deformation module $E_{def,z}$ [MPa]
šachta 25-26	36,6	65,9
šachta 28-29	44,2	79,6
šachta 29-30	69,7	125,5

Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

$E_{def,z}$ [MPa]
 ≥ 45

Poznámky - Comments:Hodnoty E_{vd} boli prepočítané pomocou súčiniteľa 1,8 (pre daný materiál) na hodnotu $E_{def,z}$ na základe zápisu v stavebnom denníku.

(N)

Skúšan - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCs Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 30.08.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, 821 06 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735


Protokol / Protocol: SPB/2018/1759
Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra
 Zhotoviteľ / Contractor: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 517 Odvedenie dažďových vôd parkoviska NV
 Konštrukcia / Construction: obsyp zo zhutnením

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota U(k=2):	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty U(k=2):	Deviation from test procedure:
STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Odobral:	(N)
Material name: ťažené kamenivo	Sampler:	SMATANA Zoltán
Druh materiálu:	Odbor (dátum-čas):	07.06.2018
Material type: 0/22 Čierna Voda	Sampling (date-time):	
Miesto merania:	Prevzatie (dátum-čas):	07.06.2018
Measuring site: stavba	Entrance (date-time):	
Staničenie:	Začiatok skúšky (dátum-čas):	07.06.2018
Stationing: vid'. nižšie	Test beginning (date-time):	
	Koniec skúšky (dátum-čas):	07.06.2018
	Test ending (date-time):	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: **SPB/2018/1759**
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH ₁ / BD ₁	OH ₂ / BD ₂	OH ₃ / BD ₃	OH _{pr} / BD _{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD	Miera zhut. Comp.degree
		vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m ³] / [%]	vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m ³] / [%]	vlhk. pr / moist. avr [kg/m ³] / [%]			
1	medzi šachtami KŠD 54 - KŠD	2109 2,20	2098 2,50	2099 2,60	2102 2,43	1,00	2102	106,0
2	medzi šachtami KŠD 21 - KŠD	1886 4,20	1892 4,70	1896 4,40	1891 4,43	1,00	1891	95,4
3	medzi šachtami KŠD 59 - KŠD	2220 3,90	2214 4,40	2260 4,30	2231 4,20	1,00	2231	112,5
4	medzi šachtami KŠD 15 - KŠD	2063 3,10	2089 2,80	2049 2,70	2067 2,87	1,00	2067	104,2
5	medzi šachtami KŠD 46 - KŠD	2118 3,00	2079 2,60	2122 2,80	2106 2,80	1,00	2106	106,2
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:							25/2017/PS/Z/VZV	1983 [kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHÁR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 12.06.2018

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2018/1683****Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil****Všeobecné údaje - General information**

Objednávateľ / Client: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra
 Zhotoviteľ / Contractor: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra

Zákazka č. / Order nr.

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 517 Odvedenie dažďových vôd parkoviska NV
 Konštrukcia / Construction: obsyp zo zhutnením

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: STN 731375:1971
 Skúšobný postup: SP-Z07
 Rozšírená neistota $U(k=2)$: 7,4%
 Odchylky od skúšobného postupu: žiadne
 Norm, regulation, ...:
 Test procedure:
 Expand. uncertainty $U(k=2)$:
 Deviation from test procedure:

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: ťažené kamenivo
 Material name:
 Druh materiálu: 0/22 Čierna Voda
 Material type:
 Miesto merania: stavba
 Measuring site:
 Staničenie: vid'. nižšie
 Stationing:
 Odber (dátum-čas): 29.05.2018
 Sampler:
 Sampling (date-time):
 Prevzatie (dátum-čas): 29.05.2018
 Entrance (date-time):
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test ending (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1683
 Records note nr.:

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH_1 / BD_1 vlhk. ₁ / moist. ₁ [kg/m ³] / [%]	OH_2 / BD_2 vlhk. ₂ / moist. ₂ [kg/m ³] / [%]	OH_3 / BD_3 vlhk. ₃ / moist. ₃ [kg/m ³] / [%]	OH_{pr} / BD_{avr} vlhk. _{pr} / moist. _{avr} [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	medzi šachtami KŠD17-KŠD49	1968 1,80	1982 2,20	1952 1,90	1967 1,97	1,00	1967	99,2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:							25/2017/PS/Z/ZV 1983	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 06.06.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



SNAS

Reg. No. 211/S-176

**Protokol / Protocol: SPB/2018/1682****Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil****Všeobecné údaje - General information**

Zákazka č. / Order nr.

Objednávateľ / Client: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra
 Zhotoviteľ / Contractor: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra,

objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 517 Odvedenie dažďových vôd parkoviska NV
 Konštrukcia / Construction: lôžko pod potrubie

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...: Skúšobný postup: Rozšírená neistota $U(k=2)$: Odchyľky od skúšobného postupu:
 Norm, regulation, ...: Test procedure: Expand. uncertainty $U(k=2)$: Deviation from test procedure:
 STN 731375:1971 SP-Z07 7,4% žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu: ťažené kamenivo Odobral: SMATANA Zoltán
 Material name: Sampler:
 Druh materiálu: 0/22 Čierna Voda Odber (dátum-čas): 29.05.2018
 Material type: Sampling (date-time):
 Miesto merania: stavba Staničenie: vid'. nižšie Prevzatie (dátum-čas): 29.05.2018
 Measuring site: Stationing: Entrance (date-time):

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/1682
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 29.05.2018
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH_1 / BD_1 vlhk. ₁ / moist. ₁ [kg/m ³] / [%]	OH_2 / BD_2 vlhk. ₂ / moist. ₂ [kg/m ³] / [%]	OH_3 / BD_3 vlhk. ₃ / moist. ₃ [kg/m ³] / [%]	OH_{pr} / BD_{avr} vlhk. _{pr} / moist. _{avr} [kg/m ³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m ³]	Miera zhut. Comp. degree [%] (N)
1	medzi šachtami KŠD58-KŠD57	1932 1,80	1909 2,10	1953 2,20	1931 2,03	1,00	1931	97,4
2	medzi šachtami KŠD53-KŠD18	1966 2,10	1952 2,40	1943 1,90	1954 2,13	1,00	1954	98,5
3	medzi šachtami KŠD47-KŠD46	1992 1,70	2008 2,00	2005 1,90	2002 1,87	1,00	2002	101,0
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:						25/2017/PS/Z/ZV	1983	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:**Skúšal - Tested by:**

SMATANA Zoltán

Kontroloval - Controlled by:

KUCHAR Jaroslav

Schválil - Confirmed by:Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia: 06.06.2018
 Date of issuance:

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice
 Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice
 tel: +421 2 40206777, fax: +421 2 40206735


Protokol / Protocol: SPB/2018/2627
Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil
Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: INPEK HOLDING, a.s., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
 Zhotoviteľ / Contractor: INPEK HOLDING, a.s., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra,

Zákazka č. / Order nr.
 objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 517 Odvedenie dažďových vôd parkoviska NV
 Konštrukcia / Construction: Obsyp

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odchylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	Ťažené kamenivo	Odobral:	Mgr. TOKOŠ Marek
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Čierna voda 0/22	Odbor (dátum-čas):	30.07.2018
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	30.07.2018
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:	medzi šachtami	
	Stationing:	KŠD33 - KŠD13	

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/2627
 Records note nr.:
 Začiatok skúšky (dátum-čas): 30.07.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 30.07.2018
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH_1 / BD_1 vlhk. 1 / moist. 1 [kg/m³] / [%]	OH_2 / BD_2 vlhk. 2 / moist. 2 [kg/m³] / [%]	OH_3 / BD_3 vlhk. 3 / moist. 3 [kg/m³] / [%]	OH_{pr} / BD_{avr} vlhk. pr / moist. avr [kg/m³] / [%]	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD [kg/m³]	Miera zhut. Comp.degree [%] (N)
1	bod č. 1	2121	2076	2058	2085	1,00	2085	105,1
		3,20	2,90	3,10	3,07			
2	bod č. 2	2198	2189	2165	2184	1,00	2184	110,1
		3,70	3,70	3,80	3,73			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:							25/2017/PS/Z/VZV	1983 [kg/m³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:
Skúšal - Tested by:

Mgr. TOKOŠ Marek

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
 vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
 Date of issuance: 30.07.2018

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.



Protokol / Protocol: SPB/2018/3049

Rádiometrické meranie objemovej hmotnosti zemín / Radiometric testing of bulk density of soil

Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra
 Zhotoviteľ / Contractor: INPEK HOLDING a.s., Štefánikova trieda 81, SK-94901 Nitra,

Zákazka č. / Order nr.
objednávka

Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 Objekt / Building object: SO: 517
 Konštrukcia / Construction: Lôžko daždovej kanalizácie + obsyp

Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:	Skúšobný postup:	Rozšírená neistota $U(k=2)$:	Odhylky od skúšobného postupu:
Norm, regulation, ...:	Test procedure:	Expand. uncertainty $U(k=2)$:	Deviation from test procedure:
STN 731375:1971	SP-Z07	7,4%	žiadne

Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

Názov materiálu:	štrkodrvina	Odobral:	KUCHÁR Jaroslav
Material name:		Sampler:	
Druh materiálu:	Čierna Voda 0/22	Odbor (dátum-čas):	28.08.2018
Material type:		Sampling (date-time):	
Miesto merania:	stavba	Prevzatie (dátum-čas):	28.08.2018
Measuring site:		Entrance (date-time):	
	Staničenie:		
	Stationing:		vid. nižšie

Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Záznamový lis č.: SPB/2018/3049
 Records note nr.:

Začiatok skúšky (dátum-čas): 28.08.2018
 Test beginning (date-time):
 Koniec skúšky (dátum-čas): 28.08.2018
 Test ending (date-time):

P.č. No.	staničenie a hĺbka stationing & depth	OH_1 / BD_1	OH_2 / BD_2	OH_3 / BD_3	OH_{pr} / BD_{avr}	Korelačný koeficient	Výsledná OH Final BD	Miera zhut. Comp. degree
		vlhk. ₁ / moist. ₁ [kg/m ³] / [%]	vlhk. ₂ / moist. ₂ [kg/m ³] / [%]	vlhk. ₃ / moist. ₃ [kg/m ³] / [%]	vlhk. _{pr} / moist. _{avr} [kg/m ³] / [%]			
1	šachta 11/25 lôžko	1968 2,40	1970 2,30	1961 2,30	1966 2,33	1,00	1966	99,1
2	šachta 25-26 obsyp	1982 2,20	1984 2,40	1977 2,10	1981 2,23	1,00	1981	99,9
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Maximálna objemová hmotnosť určená v protokole: Maximal buld density specified in protocol:		25/2017/PS/Z/VZ					1983	[kg/m ³]

Požiadavka - Requirement:

Minimálna miera zhutnenia podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

95,0 %

Poznámky - Comments:

Skúšal - Tested by:

KUCHÁR Jaroslav

Kontroloval - Controlled by:

SMATANA Zoltán

Schválil - Confirmed by:

Ing. DANCS Norbert
vedúci laboratória a skupiny

Dátum vystavenia:
Date of issuance: 30.08.2018

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru podľa špecifických predpisov. Protokol môže byť reprodukován len celý, jeho časť iba po písomnom súhlase laboratória. Vyjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu.
 Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision according to regulations. Report can be used only complete, her part can be used only after written consent of the laboratory. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material.

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd60	po šachtu č.: KŠd59
Dĺžka úseku (m) : 53,5	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák INPEK HOLDING a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis :	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis :
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o	Meno : Martin Brisuda Podpis :	



Skúšanie vzduchom

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
	Číslo protokolu :
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Labor. denník č. :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd58	po šachtu č.:	KŠd59
Dĺžka úseku (m) :	50	Počet kanalizačných odbočiek :	2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia			

Tlakomer: 400 mbar		Dátum kalibrácie: 15.10.2017	
Doba kondicionovania v min. :		5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :		100	
		Doba trvania skúšky : 14 min.	
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :		15	
		Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške :		Teplota : 21° C	
polojasno			

za zhotoviteľa :	za objednávateľa :	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomoľák	meno : Eva Matičová
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Príkova trieda 81 Nitra 949 01		
Skúšku vykonala firma :	Meno : Martin Brisuda	
BM-MONT s.r.o.	Podpis : ODBORNÝ PRACOVNÍK	

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd58	po šachtu č.: KŠd57
Dĺžka úseku (m) : 54,5	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd19	po šachtu č.: KŠd57
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 84
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.9
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd23	po šachtu č.: KŠd24
Dĺžka úseku (m) : 53,5	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa : meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 61
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.9
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd22	po šachtu č.: KŠd23
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 



INPEK HOLDING a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.9
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd22	po šachtu č.: KŠd21
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák INPEK HOLDING a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomofák Podpis :	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis :
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o	Meno : Martin Brisuda Podpis :	



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.9
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd20	po šachtu č.: KŠd21
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd18	po šachtu č.: KŠd19
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/3	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 



INPEK HOLDING s.r.o.
Štefánikova trieda 81
Nitra 940 01

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd20	po šachtu č.: KŠd19
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING s.r.o.	Podpis : g m	Podpis : Eva Matičová
Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuga Podpis : Martin Brisuga



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd21	po šachtu č.: KŠd57
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 930 01 skúsila firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd23	po šachtu č.: KŠd59
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa : meno : Ing. Milan Gomofák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING s.r.o. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o	Meno : Martin Brisuda	Podpis :

INPEK

Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd24	po šachtu č.: KŠd60
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .


5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomofák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.

Štefánikova trieda 81

Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd60	po šachtu č.: KŠd56
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
za skúšajúcu firmu : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda
		Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.

Štefánikova trieda 81

Nitra 26101



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd59	po šachtu č.: KŠd55
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd58	po šachtu č.: KŠd54
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L ".

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o		Meno : Martin Brisuda Podpis : 

INPEK HOLDING s.r.o.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING s.r.o	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd22	po šachtu č.: KŠd54
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 15.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 21° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s.	Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01		
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o	Meno : Martin Brisuda	Podpis : <i>[Signature]</i>



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd38	po šachtu č.: KŠd37
Dĺžka úseku (m) : 54,5	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno: Ing. Milan Gomoľák	meno: Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Nitra 949 01 IČO: 50 085 956		
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o.	Meno: Martin Brisuda Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 18.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd37	po šachtu č.: KŠd14
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	





3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno: Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno: Eva Matičová
Podpis :  INPEK HOLDING s.r.o. Štefánikova trieda 81 Nitra 940 01 IČO: 50 085 956	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : BM-MONT s.r.o.	Meno: Martin Brisuda Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : 12.6.2018
		Číslo protokolu : 1
		Labor. denník č. :
Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Označenie zberača - stoky : Vetva 1.5
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		
Zhotoviteľ : Inpek holding		Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :		

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd15	po šachtu č.:	KŠd41
Dĺžka úseku (m) :	50	Počet kanalizačných odbočiek :	2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške :	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomoľák	meno : Eva Matičová
Podpis :	Podpis :	Podpis :

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01

Skúšku vykonala firma :	Meno : Jozef Gereník
Dell Trade s.r.o.	Podpis :

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 2
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.5	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd41	po šachtu č.:	KŠd42
Dĺžka úseku (m) :	54,50	Počet kanalizačných odbočiek :	1(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV :	pod niveletou potrubia		



3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
--	--	---

Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník Podpis : 
--	---

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	STN EN 1610	Dátum skúšky :	12.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "		Číslo protokolu :	3
		Labor. denník č. :	
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Označenie zberača - stoky :	
Objekt :	SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		Vetva 1.5
Zhotoviteľ' :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	
		Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ' :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd42	po šachtu č.:	KŠd43
Dĺžka úseku (m) :	50,00	Počet kanalizačných odbočiek :	2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia			


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomolák	meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.

Štefánikova trieda 81

Nitra 949 01

Skúšku vykonala firma :	Meno :
Dell Trade s.r.o.	Jozef Gereník
	Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 4
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.5	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd43	po šachtu č.:	KŠd44
Dĺžka úseku (m) :	53,50	Počet kanalizačných odbočiek :	2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			


3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : g-z	Podpis : 

Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník
	Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 5
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.6	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd16	po šachtu č.:	KŠd45
Dĺžka úseku (m) :	50	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : guz	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : gef
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník	Podpis : gef

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 6
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.6	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd45	po šachtu č.:	KŠd46
Dĺžka úseku (m) :	54,50	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV :	pod niveletou potrubia		

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomolák	meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :

Skúšku vykonala firma :	Meno : Jozef Gereník
Dell Trade s.r.o.	Podpis :

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : 12.6.2018
		Číslo protokolu : 7
		Labor. denník č. :
Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Označenie zberača - stoky : Vetva 1.6
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		
Zhotoviteľ : Inpek holding		Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :		

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd46	po šachtu č.:	KŠd47
Dĺžka úseku (m) :	50,00	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške :	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno:Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomoľák	meno : Eva Matičová
Podpis :	Podpis :	Podpis :

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01

Skúšku vykonala firma :	Meno :
Dell Trade s.r.o.	Jozef Gereník
	Podpis :

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 8
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.6	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd47	po šachtu č.:	KŠd48
Dĺžka úseku (m) :	53,50	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV :	pod niveletou potrubia		


3. Priebeh skúšky


Tlakomer:	250 mbar	Dátum kalibrácie:	22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.		
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100	Doba trvania skúšky :	14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15	Skutočný (mbar) :	0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno	Teplota :	27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
--	---	--

Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník Podpis : 
--	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	STN EN 1610	Dátum skúšky :	12.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "		Číslo protokolu :	9
		Labor. denník č. :	
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Označenie zberača - stoky :	
Objekt :	SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		Vetva 1
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	
			Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd15	po šachtu č.:	KŠd16
Dĺžka úseku (m) :	10	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/2	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	
Teplota : 27° C	

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomoľák	meno : Eva Matičová
Podpis :	Podpis :	Podpis :
INPEK HOLDING, a.s.		
Štefánikova trieda 81		
Nitra 949 01		
Skúšku vykonala firma :	Meno :	Jozef Gereník
Dell Trade s.r.o.	Podpis :	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu : Labor. denník č. :	12.6.2018 10
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd16	po šachtu č.:	KŠd17
Dĺžka úseku (m) :	20,00	Počet kanalizačných odbočiek :	1(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/4	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
Úroveň nezniženej HPV :	pod niveletou potrubia	Zásyp :	nie


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
Doba trvania skúšky :	14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15
Skutočný (mbar) :	0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
Teplota :	27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 11
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky :	Vetva A
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd41	po šachtu č.:	KŠd45
Dĺžka úseku (m) :	10	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/2	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV :	pod niveletou potrubia		


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
---	---	--

Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník Podpis : 
--	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 12
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd45	po šachtu č.:	KŠd49
Dĺžka úseku (m) :	20,00	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/4	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01		
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník	Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 13
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva B	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd42	po šachtu č.:	KŠd46
Dĺžka úseku (m) :	10	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/2	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV :	pod niveletou potrubia		

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : gmc	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : [signature]
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník Podpis : [signature]	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : 12.6.2018
		Číslo protokolu : 14
		Labor. denník č. :
Stavba : Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra		Označenie zberača - stoky : Vetva B
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		
Zhotoviteľ : Inpek holding		Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :		

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd46	po šachtu č.:	KŠd50
Dĺžka úseku (m) :	20,00	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/4	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomolák	meno : Eva Maticová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : guz	Podpis : [signature]
Skúšku vykonala firma :	Meno :	Jozef Gereník
Dell Trade s.r.o.	Podpis :	[signature]

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 15
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva C	
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd43	po šachtu č.:	KŠd47
Dĺžka úseku (m) :	10	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/2	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV :	pod niveletou potrubia		



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	STN EN 1610	Dátum skúšky : Číslo protokolu :	12.6.2018 16
		Labor. denník č. :	
Stavba : Objekt :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky :	Vetva C
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd47	po šachtu č.:	KŠd51
Dĺžka úseku (m) :	20,00	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks):	6/4	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			



3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomolák	meno : Eva Matičová
Podpis: 	Podpis : 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma :	Meno :
Dell Trade s.r.o.	Jozef Gereník
	Podpis : 

INP

KHOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	STN EN 1610	Dátum skúšky :	12.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "		Číslo protokolu :	17
		Labor. denník č. :	
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Označenie zberača - stoky :	
Objekt :	SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		Vetva D
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd44	po šachtu č.:	KŠd48
Dĺžka úseku (m) :	10	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/2	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomoľák	meno : Eva Matičová
Podpis :	Podpis :	Podpis :
INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01		
Skúšku vykonala firma :	Meno :	Jozef Gereník
Dell Trade s.r.o.	Podpis :	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	STN EN 1610	Dátum skúšky :	12.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "		Číslo protokolu :	18
		Labor. denník č. :	
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Označenie zberača - stoky :	Vetva D
Objekt :	SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd48	po šachtu č.:	KŠd52
Dĺžka úseku (m) :	20,00	Počet kanalizačných odbočiek :	0(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/4	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 8,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) :	15
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške :	polojasno
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. David Tomáš	meno : Ing. Milan Gomoľák	meno : Eva Matičová
Podpis : Stefanikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :

Skúšku vykonala firma :	Meno :
Dell Trade s.r.o.	Jozef Gereník
	Podpis :

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	STN EN 1610	Dátum skúšky :	25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "		Číslo protokolu :	1
		Labor. denník č. :	
Stavba :	Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Označenie zberača - stoky :	
Objekt :	SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		Vetva 1.4
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	
		Slovenská správa ciest	
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd38	po šachtu č.:	KŠd39
Dĺžka úseku (m) :	50	Počet kanalizačných odbočiek :	0 (UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia			




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v mín. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
Doba trvania skúšky : 14,00 min.	
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške :	Teplota : 15° C
polojasno	

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomolák	meno : Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956		
Skúšku vykonala firma :	Meno :	Jozef Gereník
12 Dell Trade s.r.o.	Podpis :	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	STN EN 1610	Dátum skúšky :	25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "		Číslo protokolu :	2
		Labor. denník č. :	
Stavba :	Priprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra	Označenie zberača - stoky :	Vetva 1.4
Objekt :	SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV		
Zhotoviteľ :	Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) :	Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :			

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd39	po šachtu č.:	KŠd40
Dĺžka úseku (m) :	53,50	Počet kanalizačných odbočiek :	0 (UV-DN 200)
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/9	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezníženej HPV :	pod niveletou potrubia		




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 250 mbar	Dátum kalibrácie: 22.1.2018
Doba kondicionovania v min. :	5 min.
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100
	Doba trvania skúšky : 14,00 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 15° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno : Ing. Milan Gomolák	meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 063 956	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno : Jozef Gereník	Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd15	po šachtu č.: KŠd14
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno: Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno: Eva Matičová
Podpis :  INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	2	Meno: Jozef Gereník Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd41	po šachtu č.: KŠd37
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno: Ing. Milan Gomolák	meno: Eva Matičová
Podpis : 	Podpis :  INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	2	Meno: Jozef Gereník Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva B
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd42	po šachtu č.: KŠd38
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : 	za objednávateľa: meno: Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno: Eva Matičová Podpis : 
INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956		
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	2	Meno: Jozef Gereník Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva C
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd43	po šachtu č.: KŠd39
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomášák Podpis : 	za objednávateľa: meno: Ing. Milan Gomoľák Podpis : 	za TDI SSC : meno: Eva Matičová Podpis : 
INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova tr. č. 81 Nitra 949 01 IČO: 60 085 956		
Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	2	Meno: Jozef Gereník Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 25.9.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva D
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd44	po šachtu č.: KŠd40
Dĺžka úseku (m) : 20	Počet kanalizačných odbočiek :
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C


4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
meno: Ing. Dávid Tomašák	meno: Ing. Milan Gomoľák	meno: Eva Matičová
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova tr. č. 81
Nitra 949 01
IČO: 50 085 956

Skúšku vykonala firma : Dell Trade s.r.o.	Meno: Jozef Gereník Podpis : 
--	---

PROTOKOL Z KAMEROVÉ PROHLÍDKY
Nº

Město:	Nitra		
Adresa :	Vetva A		
Čtvrť nebo doplněk :			
Datum začátku kontroly :	7 červen 2018		
Datum ukončení kontroly :	11 červen 2018		

Zadavatel:	Inpek Holding s.r.o		
Zadávací firma :	DellTrade s.r.o		

Číslo složky :			
Cíl kontroly :	Závěrečná přejímka nové stavby		
Název sítě :	dažďová kanalizácia - retenčné potrubie		
Typ sítě :	Dešťové vody		

Počet inspekci :	13	z toho stok : 13	přípojky : 0
Kontrolovaná délka :	457.70 m	z toho stok : 457.70 m	přípojky : 0.00 m
Délka měřená na povrchu :	457.70 m		

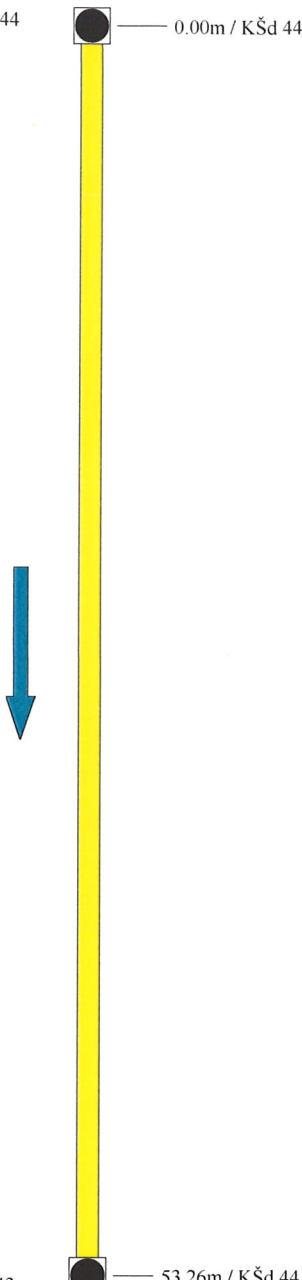
Zvláštní pozorování :			
-----------------------	--	--	--

Vystavil :	Ověřil :	Schválil :
Dne :	Dne :	Dne :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 2 Číslo vstupního uzlu : KŠd 44 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 43 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 44 do KŠd 43 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 53.26 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 44 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 43 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 2 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 44 do KŠd 43	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 44 do KŠd 43	Kontrolovaná délka : 53.26 m Naměřená délka : 53.26 m	

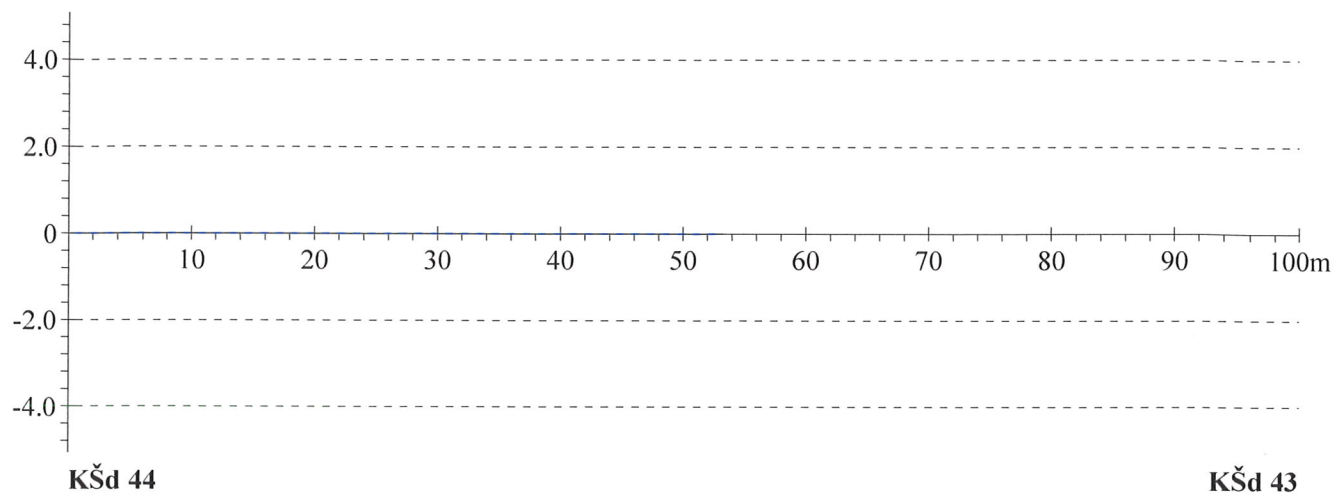
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 44 SMĚR KŠd 43

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 44	0.00m / KŠd 44		BCDA - Vstupní šachta - počiatočná, sútoková	5
				
KŠd 43	53.26m / KŠd 44		BCEA - Vstupní šachta	5

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 2 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 44 do KŠd 43	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 44 do KŠd 43	Kontrolovaná délka : 53.26 m Naměřená délka : 53.26 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 2 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 44 do KŠd 43	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 44 do KŠd 43	Kontrolovaná délka : 53.26 m Naměřená délka : 53.26 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - počiatočná, sútoková			

VZDÁLENOST : 53.26 m		VIDEO : 00:04:33	
BCEA - Vstupní šachta			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 3 Číslo vstupního uzlu : KŠd 43 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 42 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 43 do KŠd 42 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 49.15 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 43 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 42 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 3 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 43 do KŠd 42	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 43 do KŠd 42	Kontrolovaná délka : 49.15 m Naměřená délka : 49.15 m	

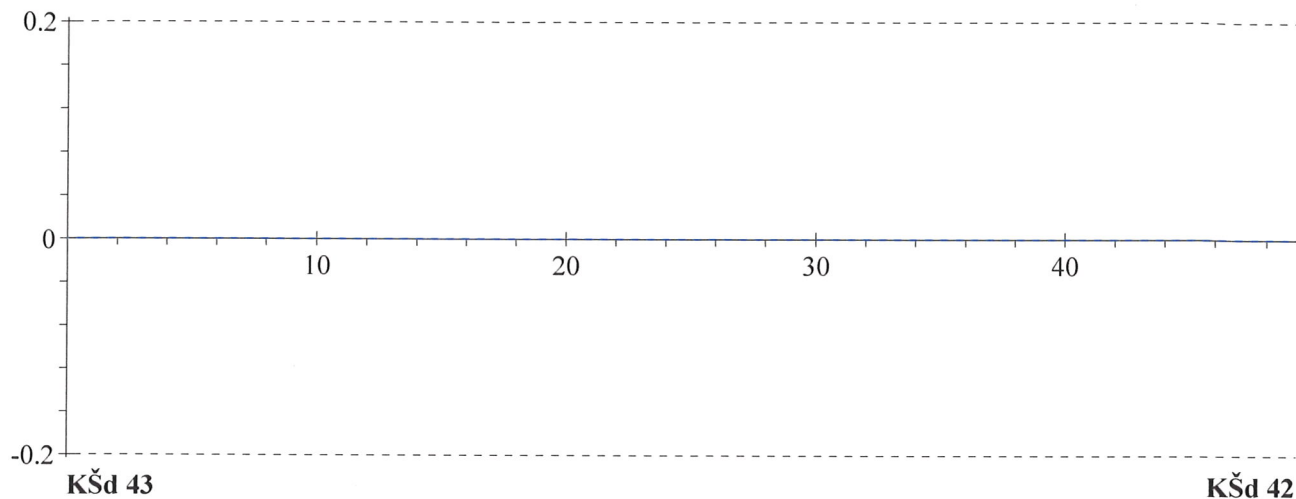
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 43 SMĚR KŠd 42

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 43	0.00m / KŠd 43		BCDA - Vstupní šachta	9
KŠd 42	49.15m / KŠd 43		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	9

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 3 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 43 do KŠd 42	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 43 do KŠd 42	Kontrolovaná délka : 49.15 m Naměřená délka : 49.15 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 3 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 43 do KŠd 42	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 43 do KŠd 42	Kontrolovaná délka : 49.15 m Naměřená délka : 49.15 m	


VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta			

VZDÁLENOST : 49.15 m		VIDEO : 00:04:07	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 4 Číslo vstupního uzlu : KŠd 42 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 41 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 42 do KŠd 41 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 54.70 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 42 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 41 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 4 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 42 do KŠd 41	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 42 do KŠd 41	Kontrolovaná délka : 54.70 m Naměřená délka : 54.70 m	

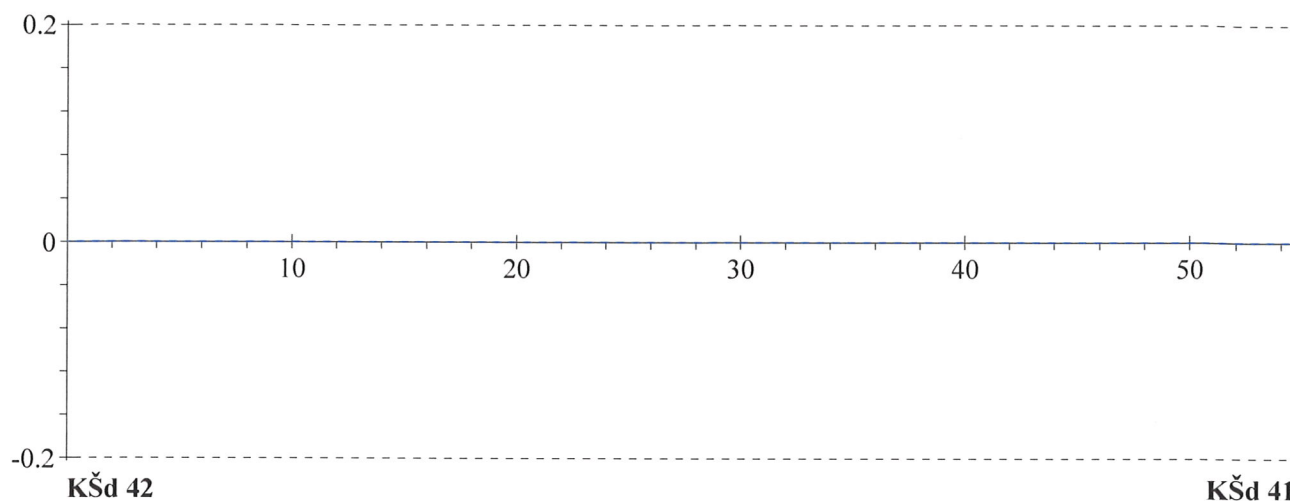
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 42 SMĚR KŠd 41

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 42	0.00m / KŠd 42		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	13
				
KŠd 41	54.70m / KŠd 42		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	13

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 4 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 42 do KŠd 41	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 42 do KŠd 41	Kontrolovaná délka : 54.70 m Naměřená délka : 54.70 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 4 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 42 do KŠd 41	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 42 do KŠd 41	Kontrolovaná délka : 54.70 m Naměřená délka : 54.70 m	


VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 54.70 m		VIDEO : 00:04:37	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 5 Číslo vstupního uzlu : KŠd 48 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 47 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 48 do KŠd 47 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 52.65 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 48 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 47 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 5 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 48 do KŠd 47	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 48 do KŠd 47	Kontrolovaná délka : 52.65 m Naměřená délka : 52.65 m	

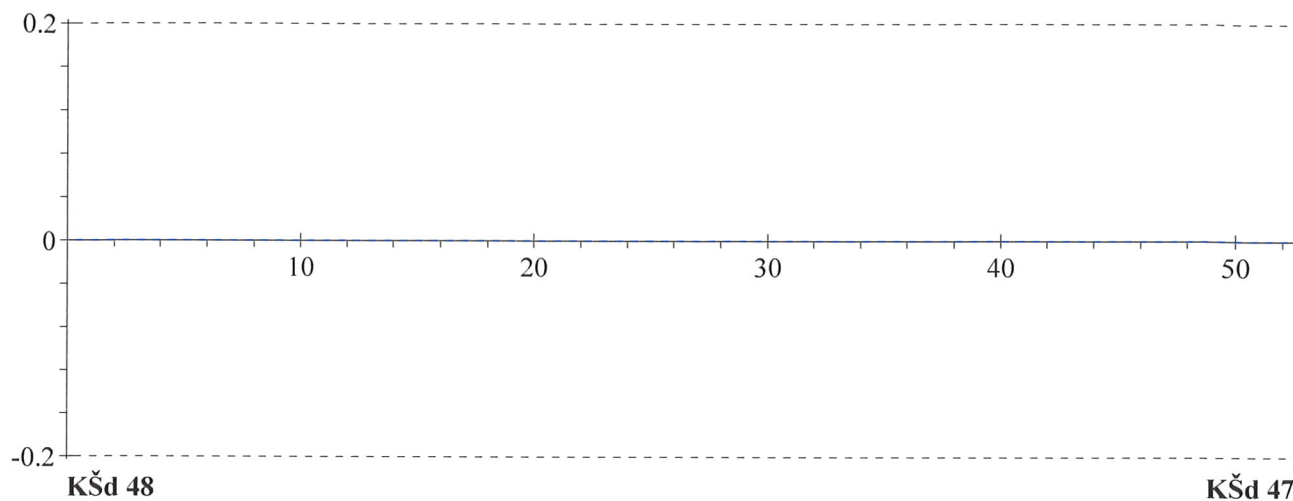
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 48 SMĚR KŠd 47

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 48	0.00m / KŠd 48		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková, počiatočná	17
				
KŠd 47	52.65m / KŠd 48		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	17

Obecné připomínky :

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 5 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 48 do KŠd 47	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 48 do KŠd 47	Kontrolovaná délka : 52.65 m Naměřená délka : 52.65 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 5 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 48 do KŠd 47	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 48 do KŠd 47	Kontrolovaná délka : 52.65 m Naměřená délka : 52.65 m	

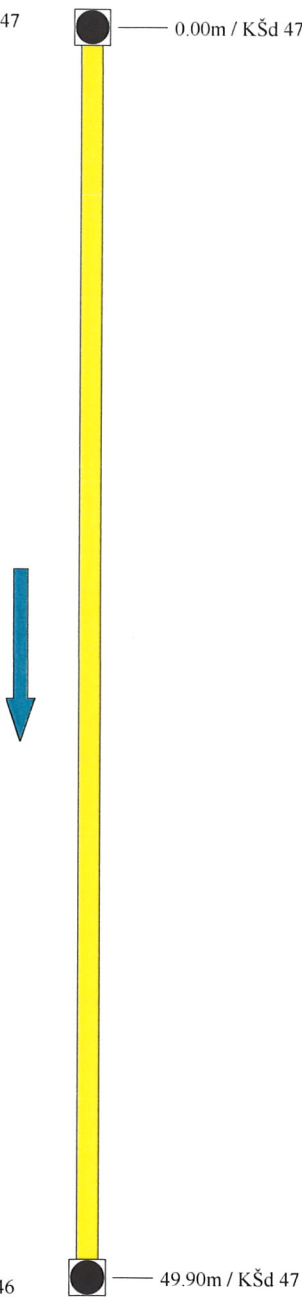
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková, počiatočná			

VZDÁLENOST : 52.65 m		VIDEO : 00:04:04	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 6 Číslo vstupního uzlu : KŠd 47 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 46 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 47 do KŠd 46 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 49.90 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 47 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 46 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 6 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 47 do KŠd 46	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 47 do KŠd 46	Kontrolovaná délka : 49.90 m Naměřená délka : 49.90 m	

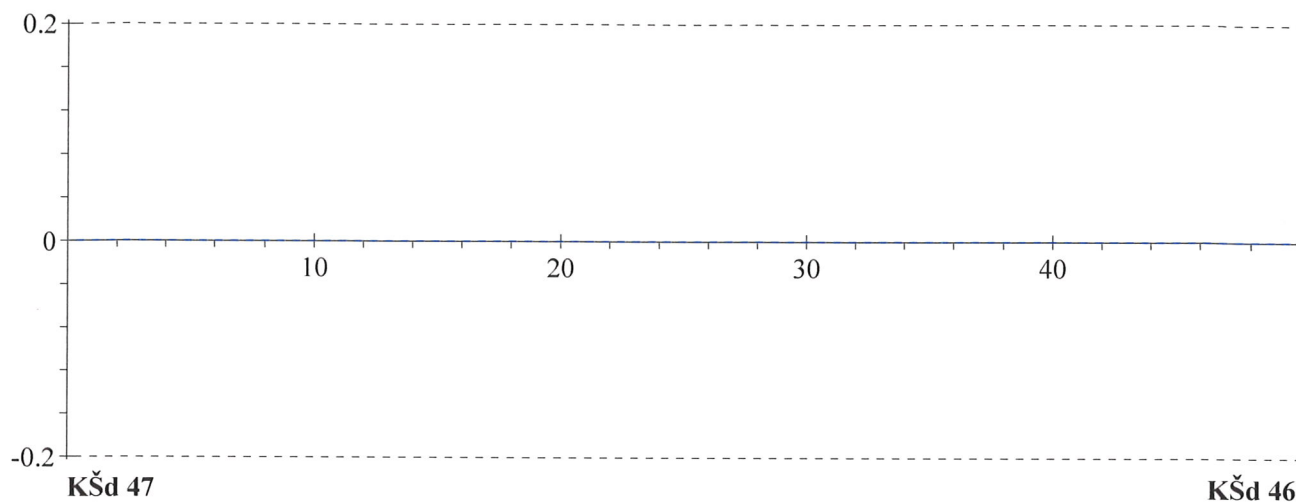
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 47 SMĚR KŠd 46

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 47	0.00m / KŠd 47		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	21
				
KŠd 46	49.90m / KŠd 47		BCEB - Revizní šachta - sůtoková	21

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 6 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 47 do KŠd 46	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 47 do KŠd 46	Kontrolovaná délka : 49.90 m Naměřená délka : 49.90 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 6 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 47 do KŠd 46	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 47 do KŠd 46	Kontrolovaná délka : 49.90 m Naměřená délka : 49.90 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 49.90 m		VIDEO : 00:03:57	
BCEB - Revizní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 7 Číslo vstupního uzlu : KŠd 46 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 45 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 46 do KŠd 45 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 54.90 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 46 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 45 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 7 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 46 do KŠd 45
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 46 do KŠd 45	Datum kontroly : 7 červen 2018 Kontrolovaná délka : 54.90 m Naměřená délka : 54.90 m

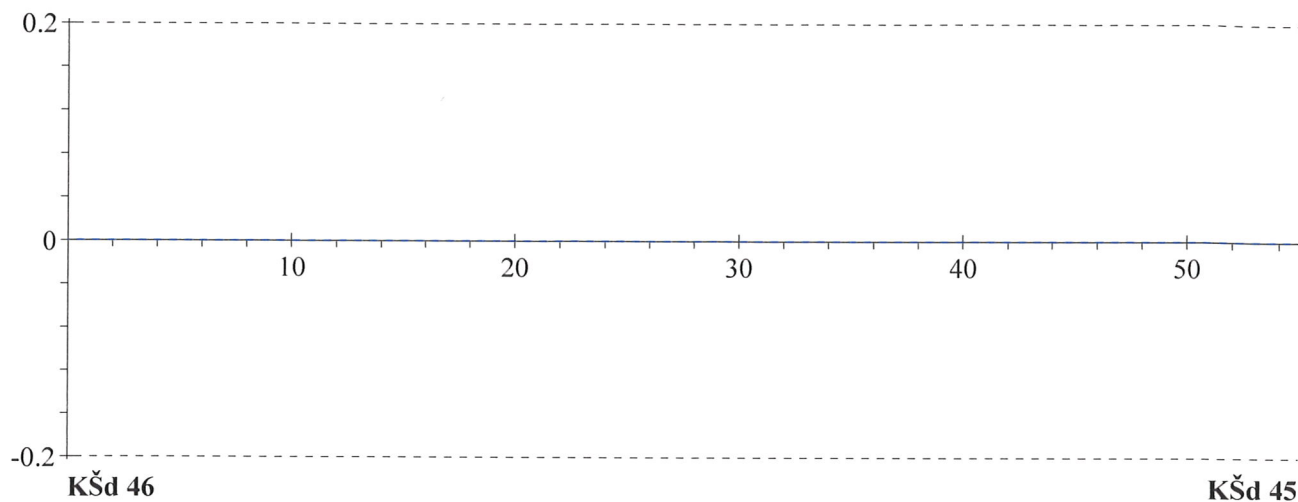
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 46 SMĚR KŠd 45

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 46	0.00m / KŠd 46		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	25
KŠd 45	54.90m / KŠd 46		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	25

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 7 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 46 do KŠd 45	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 46 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 54.90 m Naměřená délka : 54.90 m	

Profil spádu (v m)



		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 7 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 46 do KŠd 45	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 46 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 54.90 m Naměřená délka : 54.90 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 54.90 m		VIDEO : 00:04:40	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 8 Číslo vstupního uzlu : KŠd 16 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 45 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 45 do KŠd 16 Směr kontroly : Proti proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 49.38 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 16 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 45 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 8 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 45 do KŠd 16	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 16 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 49.38 m Naměřená délka : 49.38 m	

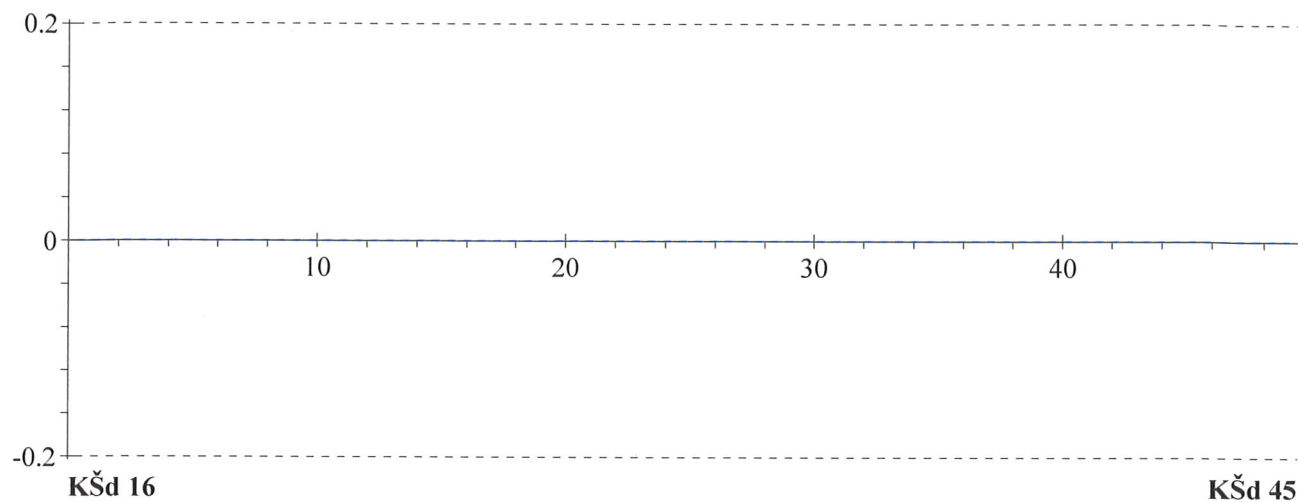
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 16 SMĚR KŠd 45

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 16	0.00m / KŠd 16		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	29
KŠd 45	49.38m / KŠd 16		BCEA - Vstupní šachta	29

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 8 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 45 do KŠd 16	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 16 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 49.38 m Naměřená délka : 49.38 m	

Profil spádu (v m)



		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 8 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 45 do KŠd 16	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 16 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 49.38 m Naměřená délka : 49.38 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 49.38 m		VIDEO : 00:04:07	
BCEA - Vstupní šachta			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 9 Číslo vstupního uzlu : KŠd 15 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 41 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 41 do KŠd 15 Směr kontroly : Proti proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 48.96 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 15 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 41 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

Složka :
Stokový úsek : **Dílec č. 9**
Operátor : **Škulavík**

Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 41 do KŠd 15	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 15 do KŠd 41	Kontrolovaná délka : 48.96 m Naměřená délka : 48.96 m

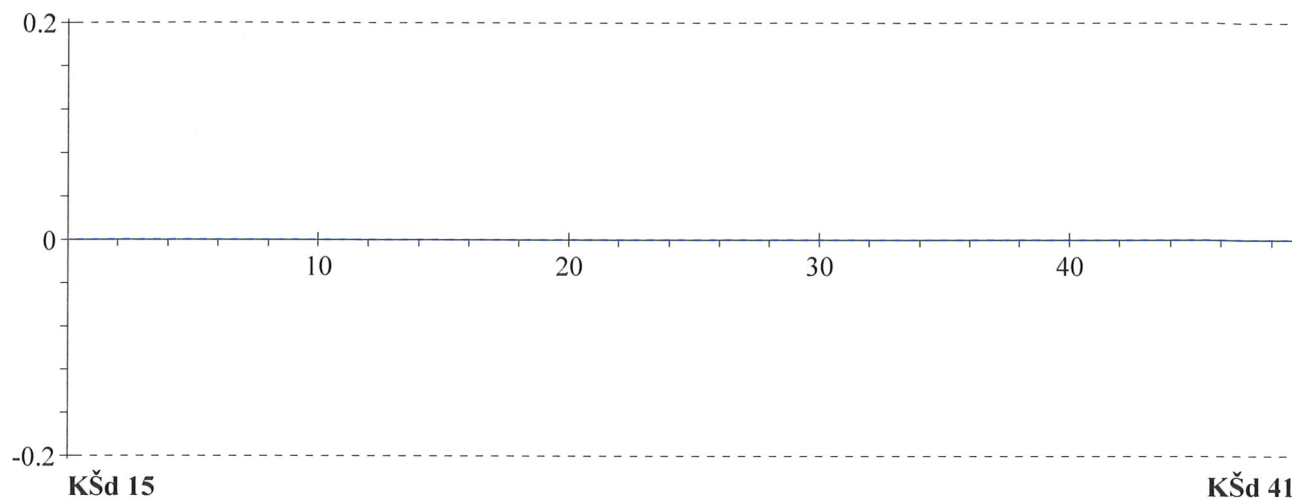
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 15 SMĚR KŠd 41

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 15	0.00m / KŠd 15		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	33
KŠd 41	48.96m / KŠd 15		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	33

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 9 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 41 do KŠd 15	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 15 do KŠd 41	Kontrolovaná délka : 48.96 m Naměřená délka : 48.96 m	

Profil spádu (v m)



		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 9 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 41 do KŠd 15	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 15 do KŠd 41	Kontrolovaná délka : 48.96 m Naměřená délka : 48.96 m	

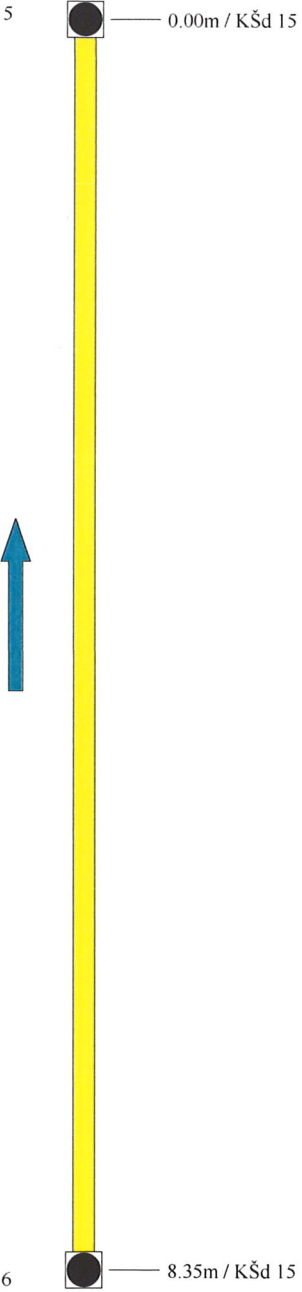
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 48.96 m		VIDEO : 00:04:15	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 10 Číslo vstupního uzlu : KŠd 15 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 16 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 16 do KŠd 15 Směr kontroly : Proti proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 8.35 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 15 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 16 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 10 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 16 do KŠd 15	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 15 do KŠd 16	Kontrolovaná délka : 8.35 m Naměřená délka : 8.35 m	

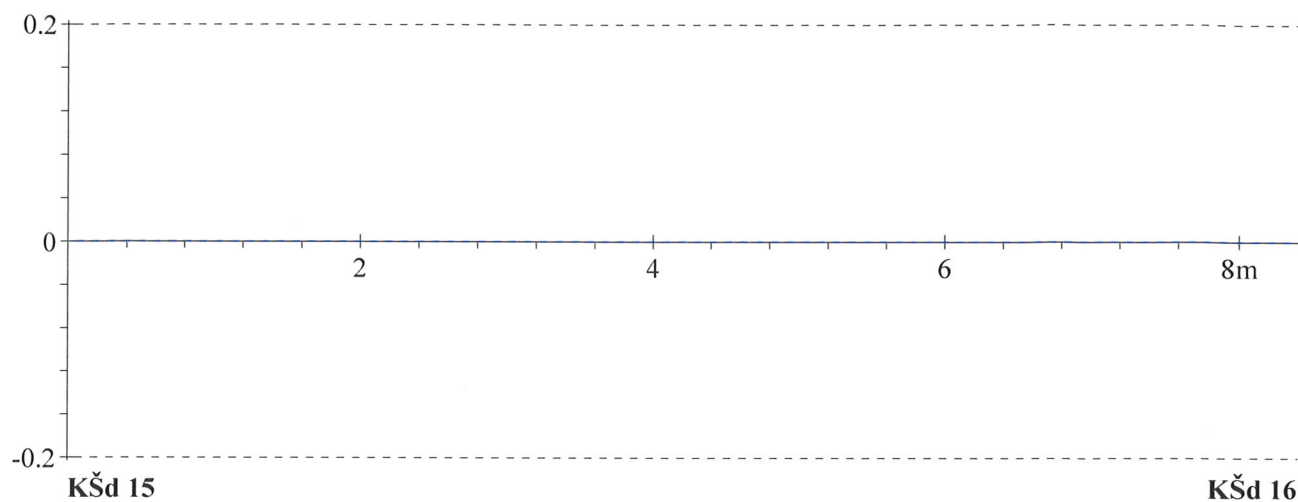
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 15 SMĚR KŠd 16

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 15	0.00m / KŠd 15		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	37
				
KŠd 16	8.35m / KŠd 15		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	37

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 10 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 16 do KŠd 15
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 15 do KŠd 16	Datum kontroly : 7 červen 2018 Kontrolovaná délka : 8.35 m Naměřená délka : 8.35 m

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 10 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 16 do KŠd 15	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 15 do KŠd 16	Kontrolovaná délka : 8.35 m Naměřená délka : 8.35 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 8.35 m		VIDEO : 00:00:50	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
---	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 07.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 11 Číslo vstupního uzlu : KŠd 41 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 45 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 45 do KŠd 41 Směr kontroly : Proti proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 10.09 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 41 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 45 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 45 do KŠd 41	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 41 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 10.09 m Naměřená délka : 10.09 m	

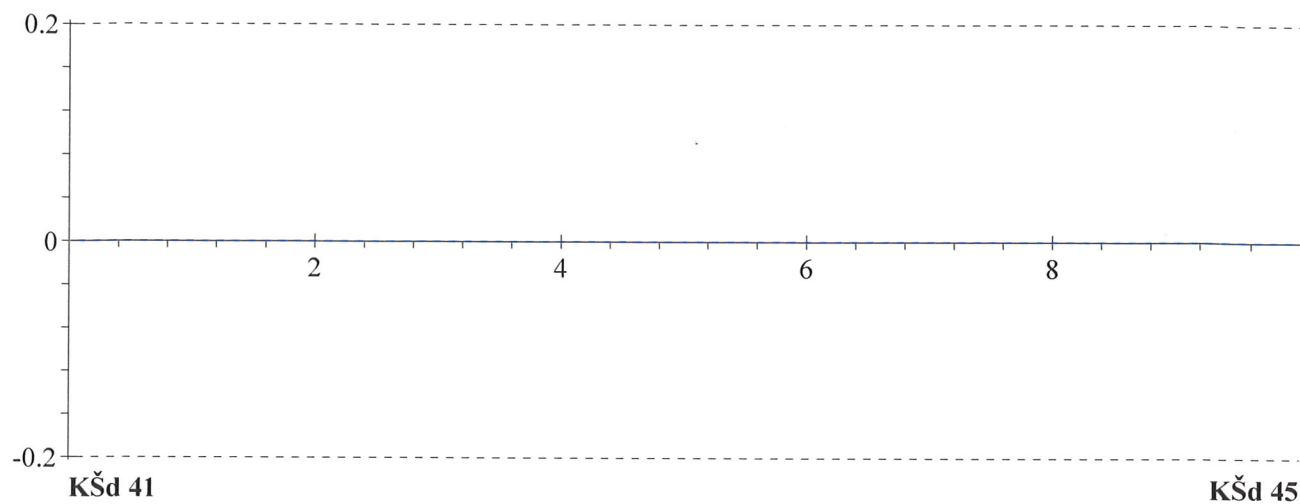
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 41 SMĚR KŠd 45

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 41	0.00m / KŠd 41		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	41
KŠd 45	10.09m / KŠd 41		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	41

Obecné připomínky :

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 45 do KŠd 41	Datum kontroly : 7 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 41 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 10.09 m Naměřená délka : 10.09 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 45 do KŠd 41	Datum kontroly : 7 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 41 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 10.09 m Naměřená délka : 10.09 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			


VZDÁLENOST : 10.09 m		VIDEO : 00:00:59	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
---	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 12 Číslo vstupního uzlu : KŠd 47 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 43 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 47 do KŠd 43 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 8.68 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 47 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 43 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 47 do KŠd 43	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 47 do KŠd 43	Kontrolovaná délka : 8.68 m Naměřená délka : 8.68 m	

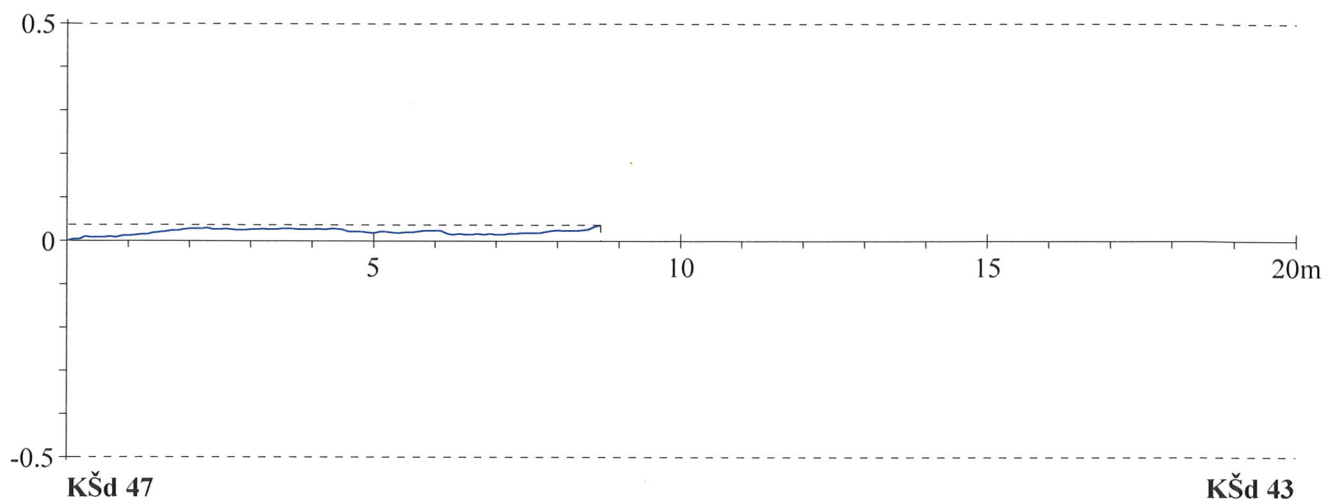
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 47 SMĚR KŠd 43

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 47	0.00m / KŠd 47		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	45
				
KŠd 43	8.68m / KŠd 47		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	45

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 47 do KŠd 43	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 47 do KŠd 43	Kontrolovaná délka : 8.68 m Naměřená délka : 8.68 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 47 do KŠd 43	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 47 do KŠd 43	Kontrolovaná délka : 8.68 m Naměřená délka : 8.68 m	

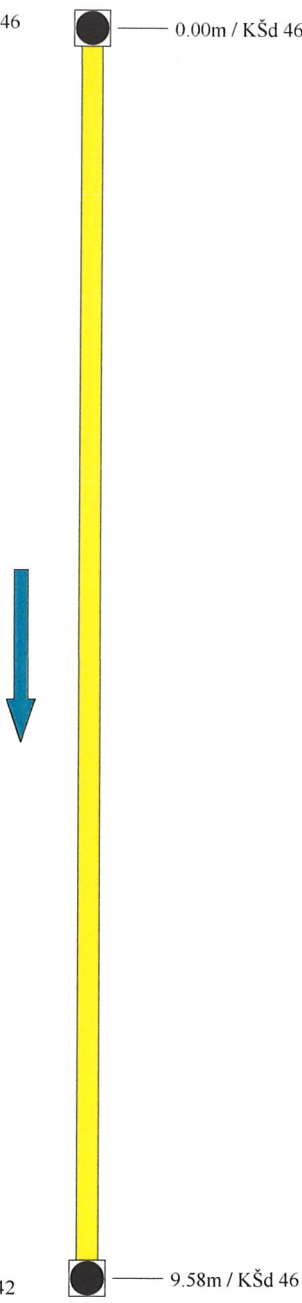
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 8.68 m		VIDEO : 00:00:47	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly	Identifikace kontrolovaného úseku
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018	Číslo úseku : Dílec č. 13 Číslo vstupního uzlu : KŠd 46 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 42 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 46 do KŠd 42 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 9.58 m
Identifikace referencí a nosičů	Identifikace kontrolovaného potrubí
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :	Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -
Podmínky prohlídky	
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos	Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba
Identifikace počátečního uzlu :	Identifikace vstupního uzlu :
Číslo uzlu : KŠd 46 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	Číslo uzlu : KŠd 42 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne
Zvláštní pozorování	
Obsah : 	

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 13 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 46 do KŠd 42	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 46 do KŠd 42	Kontrolovaná délka : 9.58 m Naměřená délka : 9.58 m	

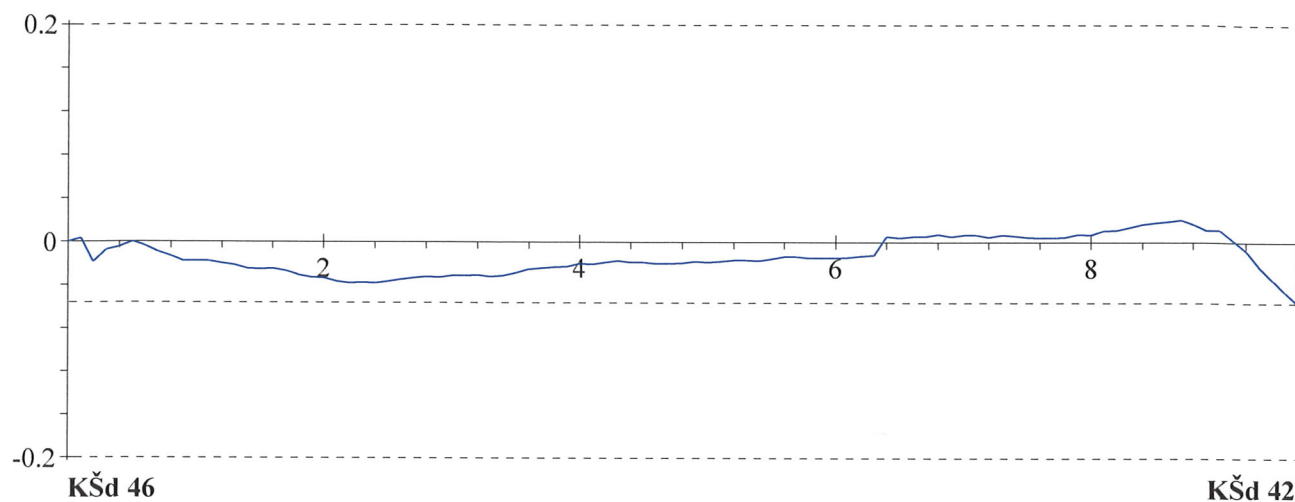
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 46 SMĚR KŠd 42

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 46	0.00m / KŠd 46		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	49
				
KŠd 42	9.58m / KŠd 46		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	49

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 13 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 46 do KŠd 42	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 46 do KŠd 42	Kontrolovaná délka : 9.58 m Naměřená délka : 9.58 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 13 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 46 do KŠd 42	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 46 do KŠd 42	Kontrolovaná délka : 9.58 m Naměřená délka : 9.58 m	


VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 9.58 m		VIDEO : 00:00:54	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 14 Číslo vstupního uzlu : KŠd 44 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 48 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 44 do KŠd 48 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 8.10 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 44 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 48 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 44 do KŠd 48	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 44 do KŠd 48	Kontrolovaná délka : 8.10 m Naměřená délka : 8.10 m

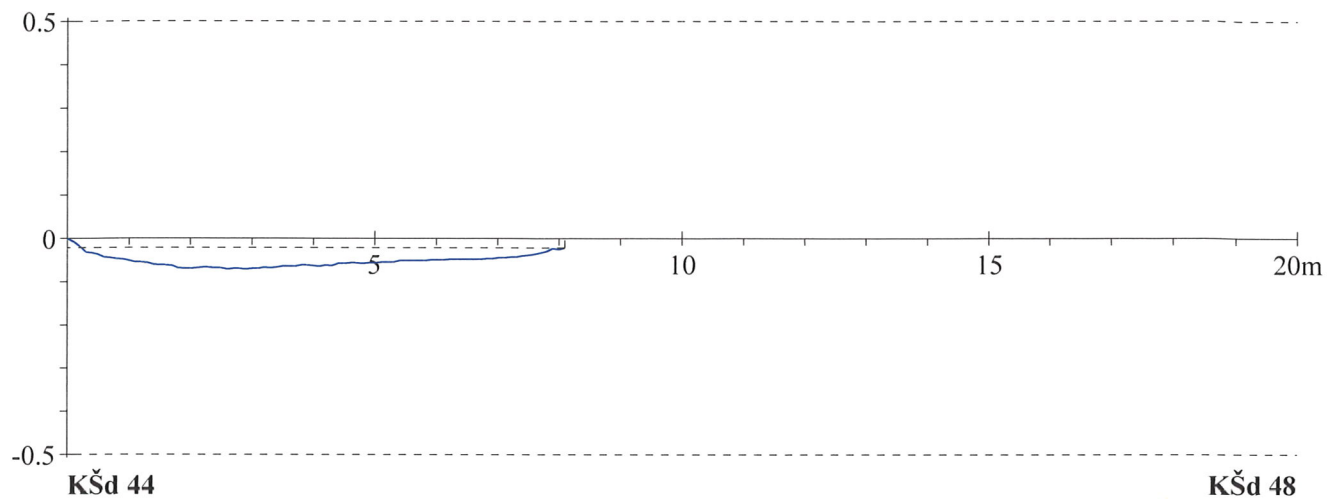
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 44 SMĚR KŠd 48

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 44	0.00m / KŠd 44		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	53
				
KŠd 48	8.10m / KŠd 44		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	53

Obecné připomínky :

Poruchy vodovodu a kanalizace  Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o Složka : Stokový úsek : Dílec č. 14 Operátor : Škulavík			
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 44 do KŠd 48	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 44 do KŠd 48	Kontrolovaná délka : 8.10 m Naměřená délka : 8.10 m

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 14 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 44 do KŠd 48	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 44 do KŠd 48	Kontrolovaná délka : 8.10 m Naměřená délka : 8.10 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 8.10 m		VIDEO : 00:00:51	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Složka :

Datum : 07.06.2018



Stokový úsek	Prům.	Délka kontrolované	Typ sítě	Typ trouba	Vzdálenost	Poznámky	Strana
KŠd 44 vers KŠd 43	1000	53.26 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 53.26	BCDA - Vstupní šachta - počiatková, sůtoková BCEA - Vstupní šachta	5 5
KŠd 43 vers KŠd 42	1000	49.15 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 49.15	BCDA - Vstupní šachta BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	9 9
KŠd 42 vers KŠd 41	1000	54.70 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 54.70	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	13 13
KŠd 48 vers KŠd 47	1000	52.65 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 52.65	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková, počiatková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	17 17
KŠd 47 vers KŠd 46	1000	49.90 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 49.90	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEB - Revizní šachta - sůtoková	21 21
KŠd 46 vers KŠd 45	1000	54.90 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 54.90	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	25 25
KŠd 16 vers KŠd 45	1000	49.38 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 49.38	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta	29 29
KŠd 15 vers KŠd 41	1000	48.96 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 48.96	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	33 33
KŠd 15 vers KŠd 16	1000	8.35 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 8.35	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	37 37
KŠd 41 vers KŠd 45	1000	10.09 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 10.09	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	41 41
KŠd 47 vers KŠd 43	1000	8.68 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 8.68	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	45 45
KŠd 46 vers KŠd 42	1000	9.58 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 9.58	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	49 49
KŠd 44 vers KŠd 48	1000	8.10 m	Pro odpadní vody	PVC-U	0.00 8.10	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	53 53

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Datum : 07.06.2018

Složka :

Vlastnosti kanalizačního dílce								
Stokový úsek	KŠd 44 do KŠd 43	KŠd 43 do KŠd 42	KŠd 42 do KŠd 41	KŠd 48 do KŠd 47	KŠd 47 do KŠd 46	KŠd 46 do KŠd 45	KŠd 16 do KŠd 45	KŠd 15 do KŠd 41
Průměr trubíc :	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000
Měřená délka trubicového dílce :	53.26 m	49.15 m	54.70 m	52.65 m	49.90 m	54.90 m	49.38 m	48.96 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	53.26 m	49.15 m	54.70 m	52.65 m	49.90 m	54.90 m	49.38 m	48.96 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Datum : 07.06.2018

Složka :

Vlastnosti kanalizačního dílce								Celkem
Stokový úsek	KŠd 15 do KŠd 16	KŠd 41 do KŠd 45	KŠd 47 do KŠd 43	KŠd 46 do KŠd 42	KŠd 44 do KŠd 48			
Průměr trubíc :	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000			
Měřená délka trubicového dílce :	8.35 m	10.09 m	8.68 m	9.58 m	8.10 m			457.70 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	8.35 m	10.09 m	8.68 m	9.58 m	8.10 m			457.70 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0			0 / X / X
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 21.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd55	po šachtu č.: KŠd56
Dĺžka úseku (m) : 53,5	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 30 ° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 21.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd54	po šachtu č.: KŠd55
Dĺžka úseku (m) : 50,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod nivelačnou potrubia	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 30° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák INPEK HOLDING, a.s. Podpis : Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 21.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd53	po šachtu č.: KŠd54
Dĺžka úseku (m) : 54,5	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/10	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 30° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štofánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis : <i>[Signature]</i>

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 21.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.8
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd18	po šachtu č.: KŠd53
Dĺžka úseku (m) : 50,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (m.n) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	Zásyp : nie

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 30° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štofánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis :



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.7
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd51	po šachtu č.: KŠd52
Dĺžka úseku (m) : 53,5	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : 	



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.7
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd50	po šachtu č.: KŠd51
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis :



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.7
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd49	po šachtu č.: KŠd50
Dĺžka úseku (m) : 54,5	Počet kanalizačných odbočiek : 1(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/10	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis :

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.7
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd17	po šachtu č.: KŠd49
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Maticová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : 	Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis :



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 21.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd17	po šachtu č.: KŠd18
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 30° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 21.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd16	po šachtu č.: KŠd17
Dĺžka úseku (m) : 20,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod nivelačnú potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 30° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák	za TDI SSC : meno : Eva Maticová
Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefanikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : <i>Gomolák</i>	Podpis : <i>Eva Maticová</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis : <i>Peter Kováčik</i>

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd13	po šachtu č.: KŠd14
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	Zásyp : nie

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomoľák	za TDI SSC : meno : Eva Matičová
Podpis: INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	Podpis : <i>Gomolák</i>	Podpis : <i>Eva Matičová</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis : <i>Peter Kováčik</i>

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd12	po šachtu č.: KŠd13
Dĺžka úseku (m) : 20,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezníženej HPV : pod úrovňou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 61 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>[Signature]</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>[Signature]</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis : <i>[Signature]</i>



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd11	po šachtu č.: KŠd12
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 61 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis :
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd4	po šachtu č.: KŠd11
Dĺžka úseku (m) : 17,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/3	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>[Signature]</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>[Signature]</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>[Signature]</i>	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd52	po šachtu č.: KŠd56
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>Gomolák</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>Eva Matičová</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>Peter Kováčik</i>	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd51	po šachtu č.: KŠd55
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 940 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : 	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : 
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : 	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd50	po šachtu č.: KŠd54
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 940 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>Gomolák</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>Eva Matičová</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>Peter Kováčik</i>	



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd49	po šachtu č.: KŠd53
Dĺžka úseku (m) : 10,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : g m e	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : Eva Matičová
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik	Podpis : Peter Kováčik



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd48	po šachtu č.: KŠd52
Dĺžka úseku (m) : 20,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>Gomolák</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>Eva Matičová</i> Peter Kováčik Slovenská správa ciest 100 LT / AB SAMOSKONTROLNÝ TESTOVANIE EN 1610, LEVEL 2
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>Peter Kováčik</i>	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd47	po šachtu č.: KŠd51
Dĺžka úseku (m) : 20,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno:Ing. Dávid Tomašák INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 84 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>g m</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>me</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>16</i>	



PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽDOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd46	po šachtu č.: KŠd50
Dĺžka úseku (m) : 20,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>Gomolák</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>Eva Matičová</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>Peter Kováčik</i>	

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 22.6.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : INPEK HOLDING, a.s.	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd45	po šachtu č.: KŠd49
Dĺžka úseku (m) : 20,0	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (m.n) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/4	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 23.5.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : polojasno	Teplota : 29° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : meno: Ing. Dávid Tomašák Podpis : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01	za objednávateľa: meno : Ing. Milan Gomolák Podpis : <i>Gomolák</i>	za TDI SSC : meno : Eva Matičová Podpis : <i>Eva Matičová</i>
Skúšku vykonala firma : Najdek s.r.o.	Meno : Peter Kováčik Podpis : <i>Peter Kováčik</i>	

PROTOKOL Z KAMEROVÉ PROHLÍDKY

Nº

Město:	Nitra
Adresa:	Vetva A
Čtvrť nebo doplněk:	
Datum začátku kontroly:	11 červen 2018
Datum ukončení kontroly:	11 červen 2018

Zadavatel:	Inpek Holding s.r.o
Zadávající firma:	Najdek s.r.o

Číslo složky:	
Cíl kontroly:	Závěrečná převímka nové stavby
Název sítě:	SO 517 Dažďová kanalizácia, retenčné potrubie
Typ sítě:	Dešťové vody

Počet inspekci:	18	z toho stok: 18	přípojky: 0
Kontrolovaná délka:	554.40 m	z toho stok: 554.40 m	přípojky: 0.00 m
Délka měřená na povrchu:	554.40 m		

Zvláštní pozorování:

Vystavil:	AQUA DEFEKT, s.r.o.
	Komenského 2219/21
Dne:	010 01 ŽILINA
Podpis:	041/5621 250, 041/5621 242
	IČO: 31578454, IČ DPH: SK2020448694

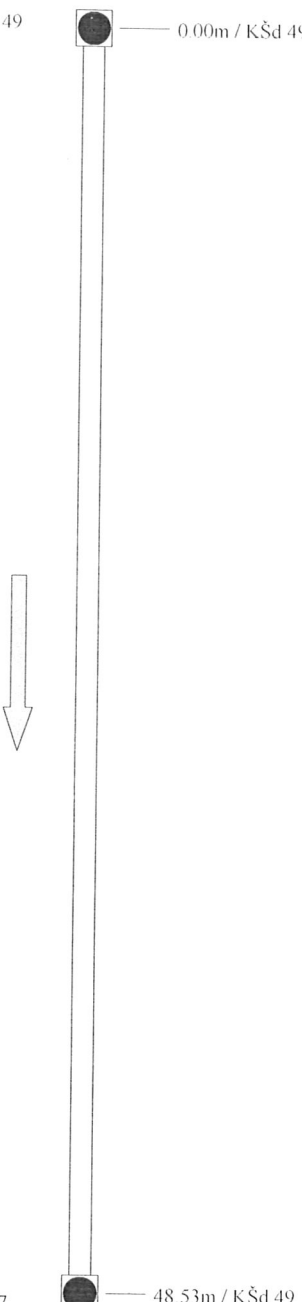
Overil:	AQUA DEFEKT, s.r.o.
	Komenského 2219/21
Dne:	010 01 ŽILINA
Podpis:	041/5621 250, 041/5621 242
	IČO: 31578454, IČ DPH: SK2020448694

Schválil:	AQUA DEFEKT, s.r.o.
	Komenského 2219/21
Dne:	010 01 ŽILINA
Podpis:	041/5621 250, 041/5621 242
	IČO: 31578454, IČ DPH: SK2020448694

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 2 Číslo vstupního uzlu : KŠd 49 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 17 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 49 do KŠd 17 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 48.53 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 49 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 17 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

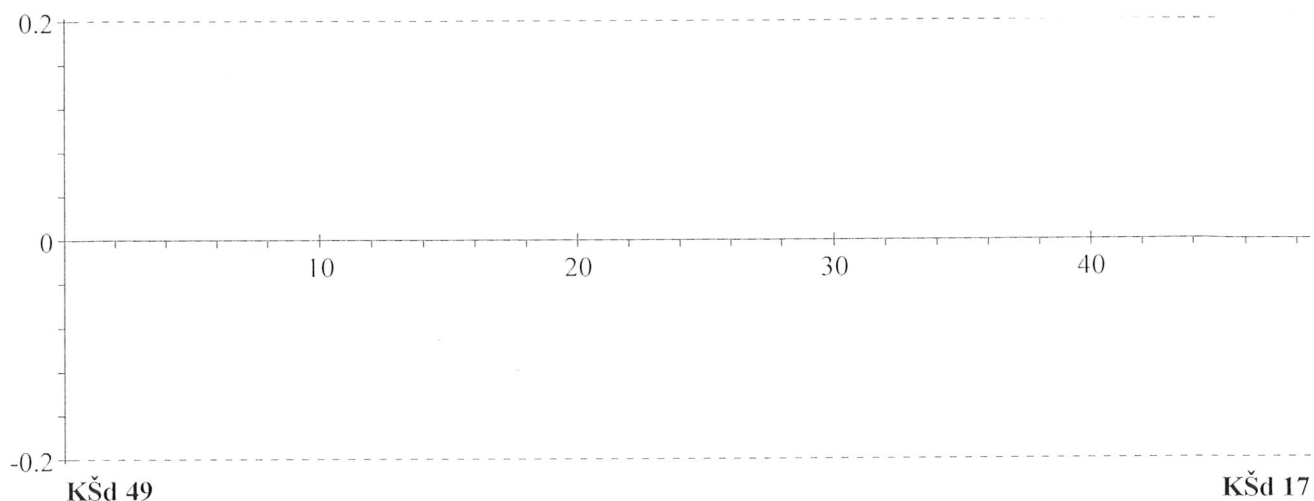
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 2 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 17	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 17	Kontrolovaná délka : 48.53 m Naměřená délka : 48.53 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 49 SMĚR KŠd 17

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 49 	0.00m / KŠd 49		BCDA - Vstupní šachta - sítoková	5
KŠd 17	48.53m / KŠd 49		BCEA - Vstupní šachta - sítoková	5
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 2 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 17	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 17	Kontrolovaná délka : 48.53 m Naměřená délka : 48.53 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 2 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 17	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 17	Kontrolovaná délka : 48.53 m Naměřená délka : 48.53 m	

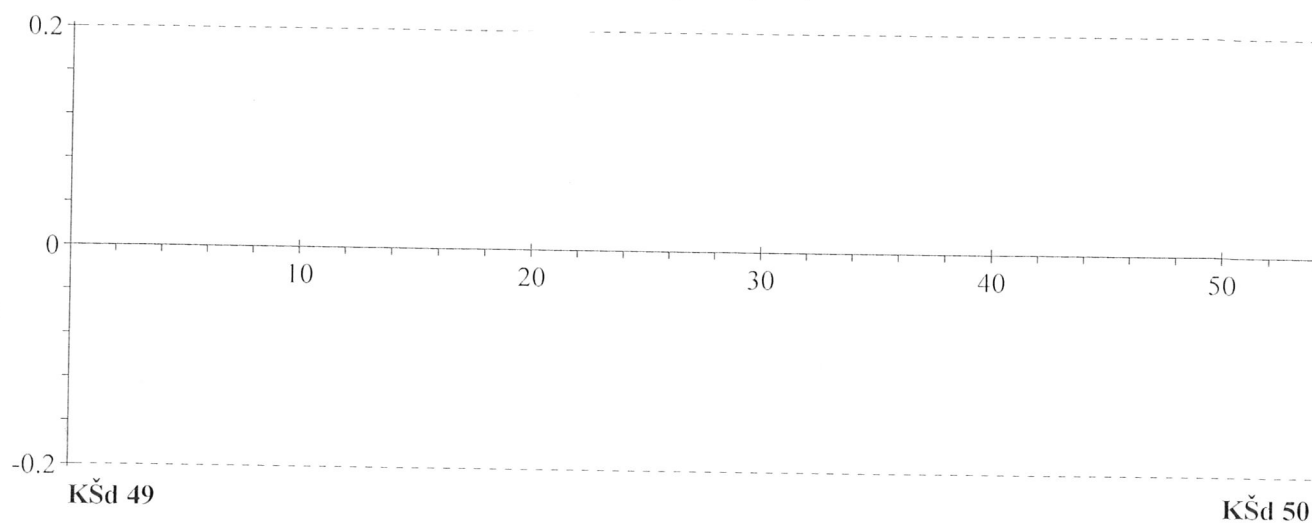
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 48.53 m		VIDEO : 00:04:27	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 3 Číslo vstupního uzlu : KŠd 49 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 50 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 49 do KŠd 50 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 54.08 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 49 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 50 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 3 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 50	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 50	Kontrolovaná délka : 54.08 m Naměřená délka : 54.08 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 3 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 50	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 50	Kontrolovaná délka : 54.08 m Naměřená délka : 54.08 m	

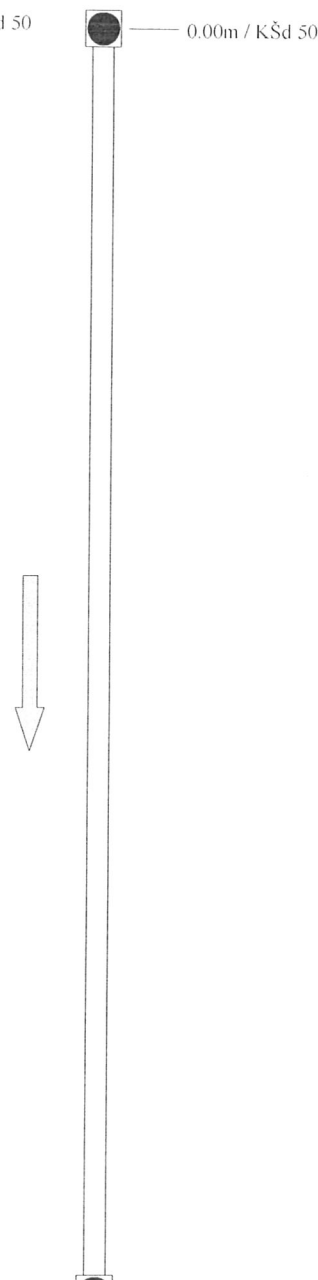
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 54.08 m		VIDEO : 00:04:50	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 4 Číslo vstupního uzlu : KŠd 50 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 51 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 50 do KŠd 51 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 49.91 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 50 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 51 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 4 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 50 do KŠd 51	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 50 do KŠd 51	Kontrolovaná délka : 49.91 m Naměřená délka : 49.91 m	

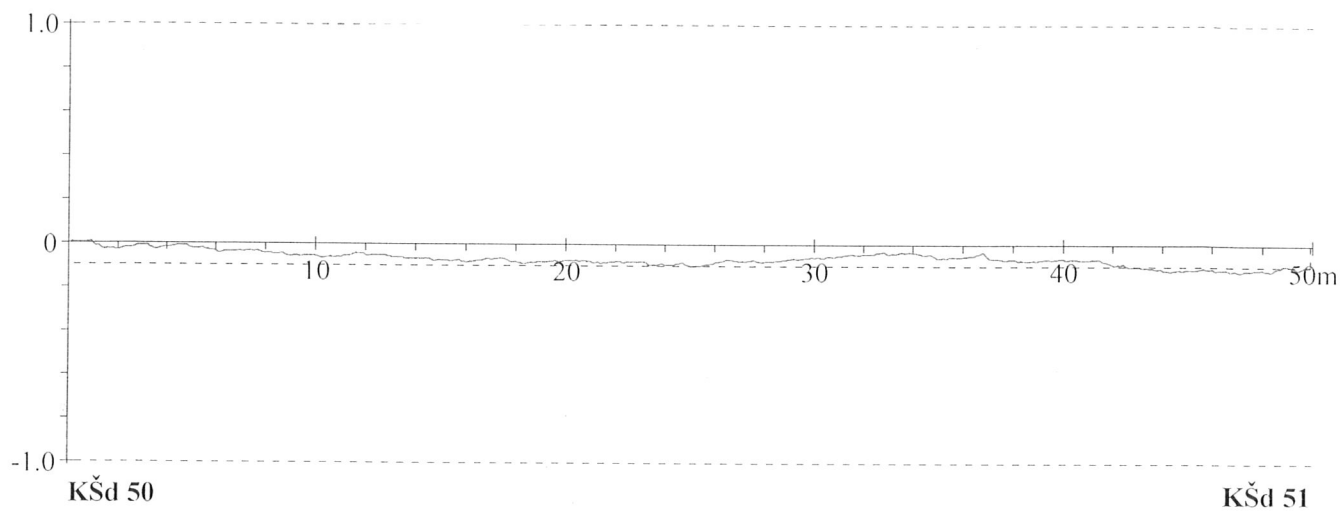
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 50 SMĚR KŠd 51

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 50	0.00m / KŠd 50		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	13
				
KŠd 51	49.91m / KŠd 50		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	13

Obscené připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 4 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 50 do KŠd 51	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 50 do KŠd 51	Kontrolovaná délka : 49.91 m Naměřená délka : 49.91 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 4 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 50 do KŠd 51	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 50 do KŠd 51	Kontrolovaná délka : 49.91 m Naměřená délka : 49.91 m	

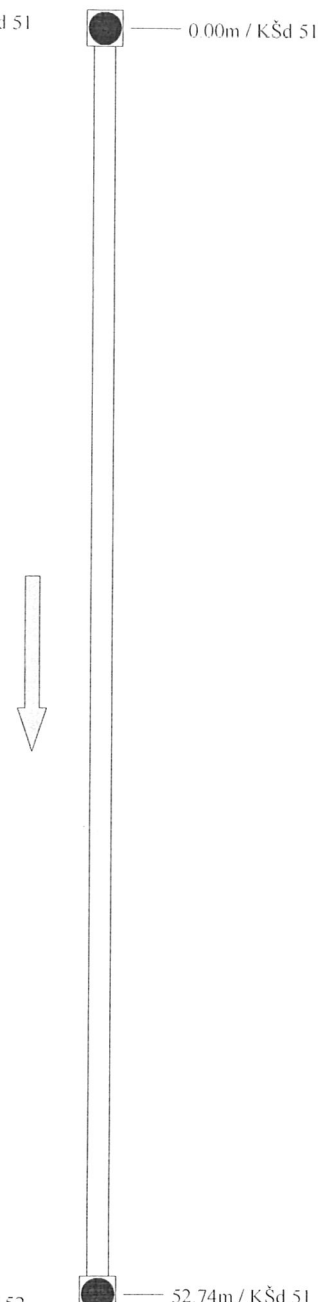
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 49.91 m		VIDEO : 00:04:28	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 5 Číslo vstupního uzlu : KŠd 51 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 52 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 51 do KŠd 52 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 52.74 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 51 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 52 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

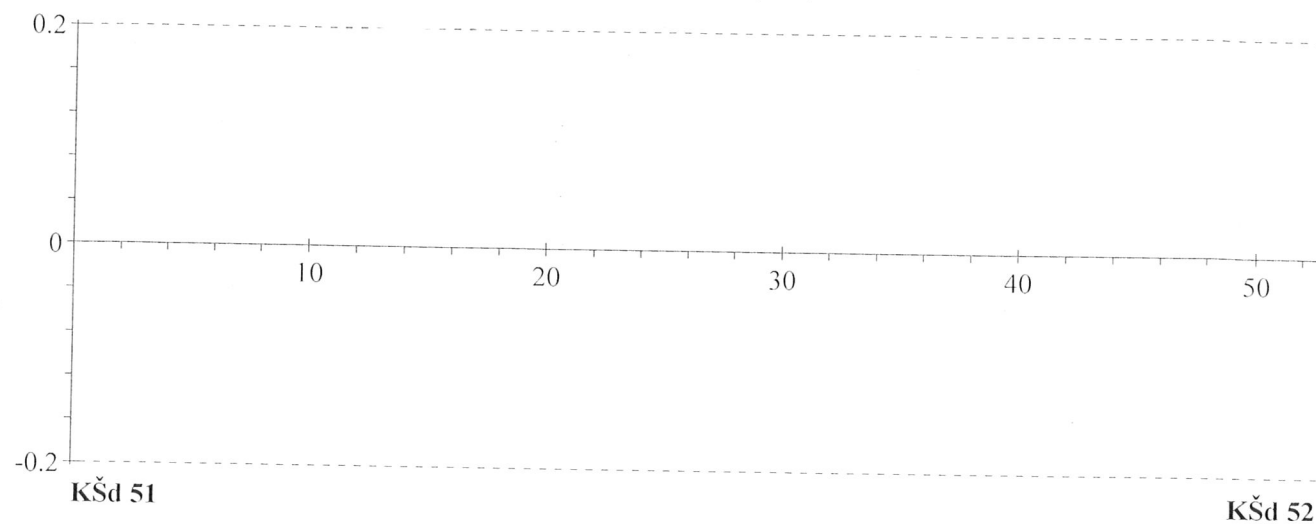
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 5 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 51 do KŠd 52	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 51 do KŠd 52	Kontrolovaná délka : 52.74 m Naměřená délka : 52.74 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 51 SMĚR KŠd 52

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 51	0.00m / KŠd 51		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	17
				
KŠd 52	52.74m / KŠd 51		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	17
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 5 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 51 do KŠd 52	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 51 do KŠd 52	Kontrolovaná délka : 52.74 m Naměřená délka : 52.74 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 5 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 51 do KŠd 52	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 51 do KŠd 52	Kontrolovaná délka : 52.74 m Naměřená délka : 52.74 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 52.74 m		VIDEO : 00:05:07	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 6 Číslo vstupního uzlu : KŠd 53 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 18 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 53 do KŠd 18 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 48.66 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 53 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 18 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 6 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 18	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 18	Kontrolovaná délka : 48.66 m Naměřená délka : 48.66 m	

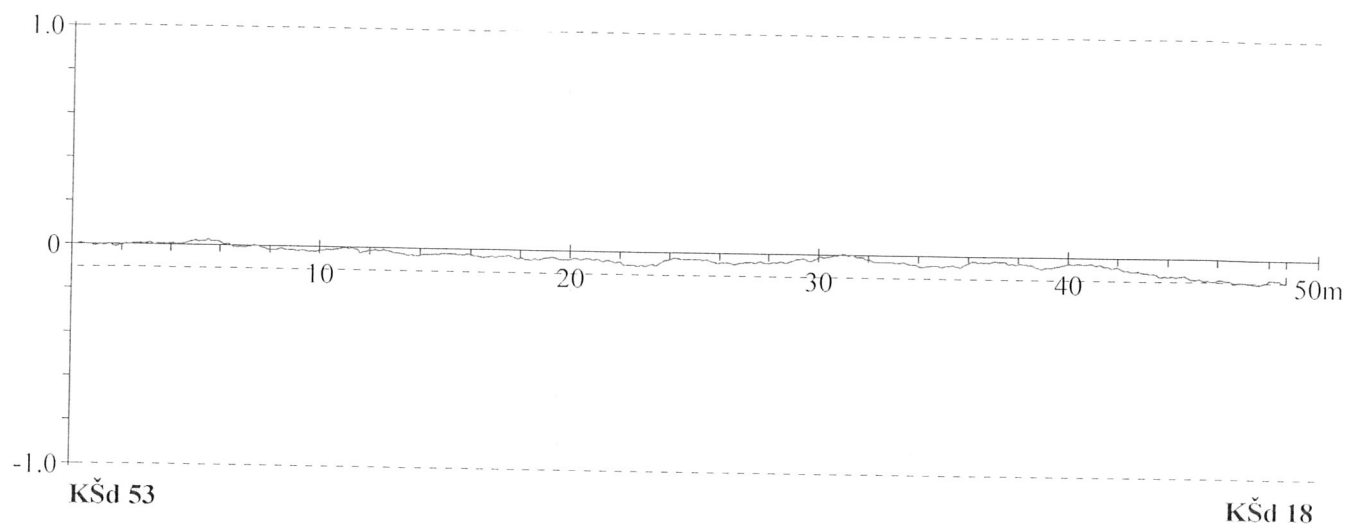
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 53 SMĚR KŠd 18

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 53  0.00m / KŠd 53 KŠd 18 48.66m / KŠd 53			BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	21 21

Obscené připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 6 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 18	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 18	Kontrolovaná délka : 48.66 m Naměřená délka : 48.66 m	

Profil spádu (v m)



		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 6 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 18	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 18	Kontrolovaná délka : 48.66 m Naměřená délka : 48.66 m	

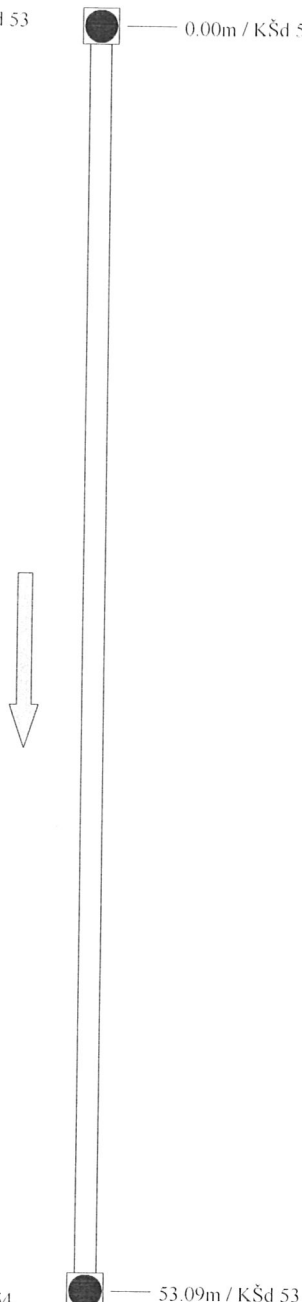
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 48.66 m		VIDEO : 00:04:21	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 7 Číslo vstupního uzlu : KŠd 53 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 54 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 53 do KŠd 54 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 53.09 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 53 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 54 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 7 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 54	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 54	Kontrolovaná délka : 53.09 m Naměřená délka : 53.09 m	

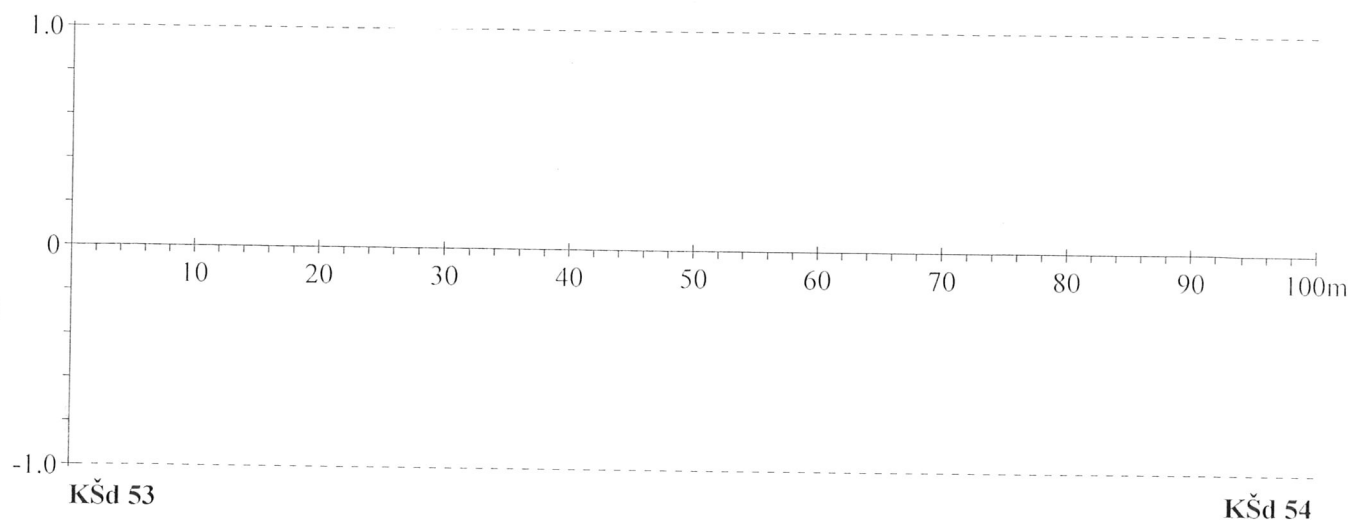
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 53 SMĚR KŠd 54

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 53	0.00m / KŠd 53		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	25
				
KŠd 54	53.09m / KŠd 53		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	25

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 7 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 54	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 54	Kontrolovaná délka : 53.09 m Naměřená délka : 53.09 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 7 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 54	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 54	Kontrolovaná délka : 53.09 m Naměřená délka : 53.09 m	


VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 53.09 m		VIDEO : 00:04:23	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o. Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 8 Číslo vstupního uzlu : KŠd 54 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 55 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 54 do KŠd 55 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 50.18 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 54 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedení stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 55 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedení stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

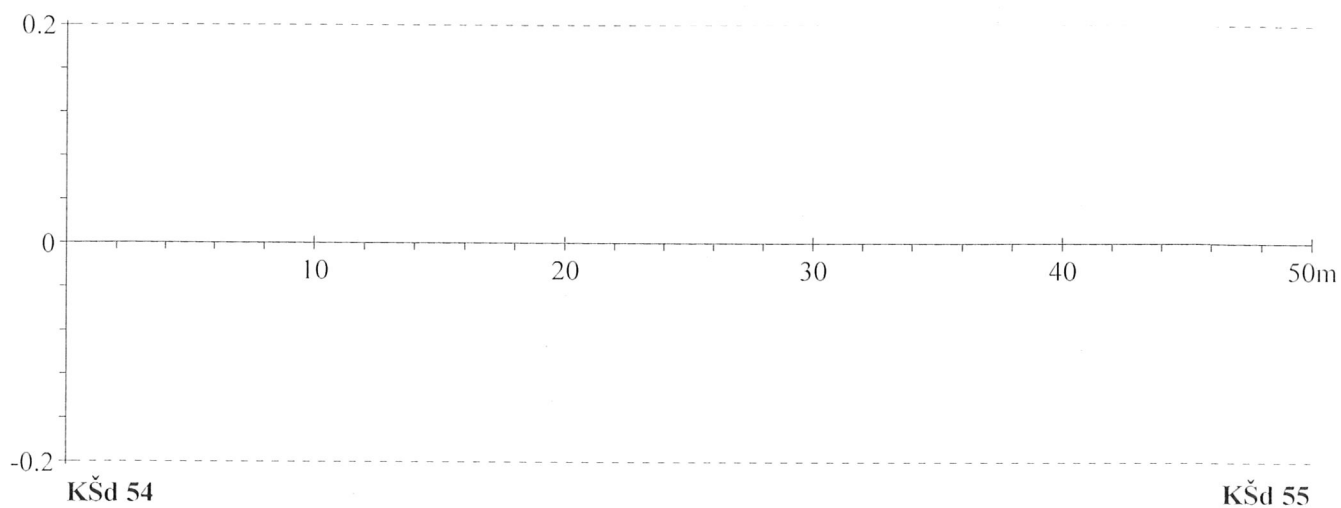
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 8 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 54 do KŠd 55	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 54 do KŠd 55	Kontrolovaná délka : 50.18 m Naměřená délka : 50.18 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 54 SMĚR KŠd 55

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 54 	0.00m / KŠd 54		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	29
KŠd 55	50.18m / KŠd 54		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	29
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 8 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 54 do KŠd 55	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 54 do KŠd 55	Kontrolovaná délka : 50.18 m Naměřená délka : 50.18 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 8 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 54 do KŠd 55	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 54 do KŠd 55	Kontrolovaná délka : 50.18 m Naměřená délka : 50.18 m	

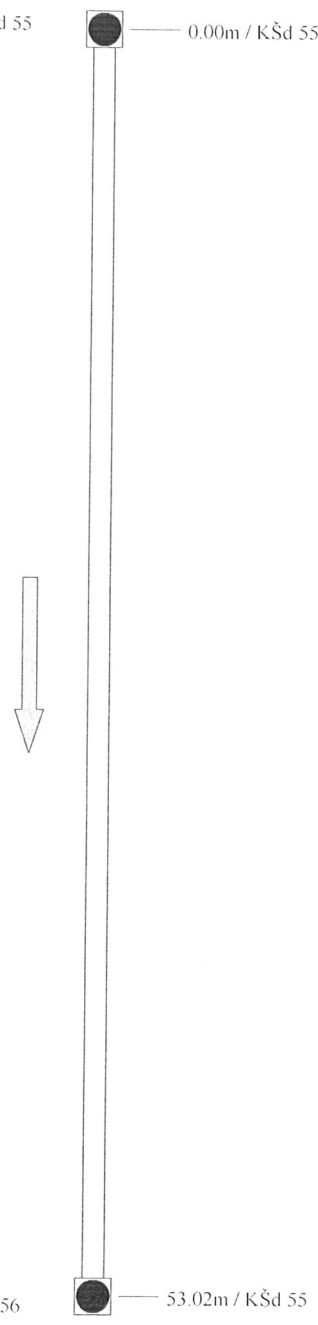
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 50.18 m		VIDEO : 00:04:22	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 9 Číslo vstupního uzlu : KŠd 55 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 56 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 55 do KŠd 56 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 53.02 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 55 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 56 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 9 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 55 do KŠd 56	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 55 do KŠd 56	Kontrolovaná délka : 53.02 m Naměřená délka : 53.02 m	

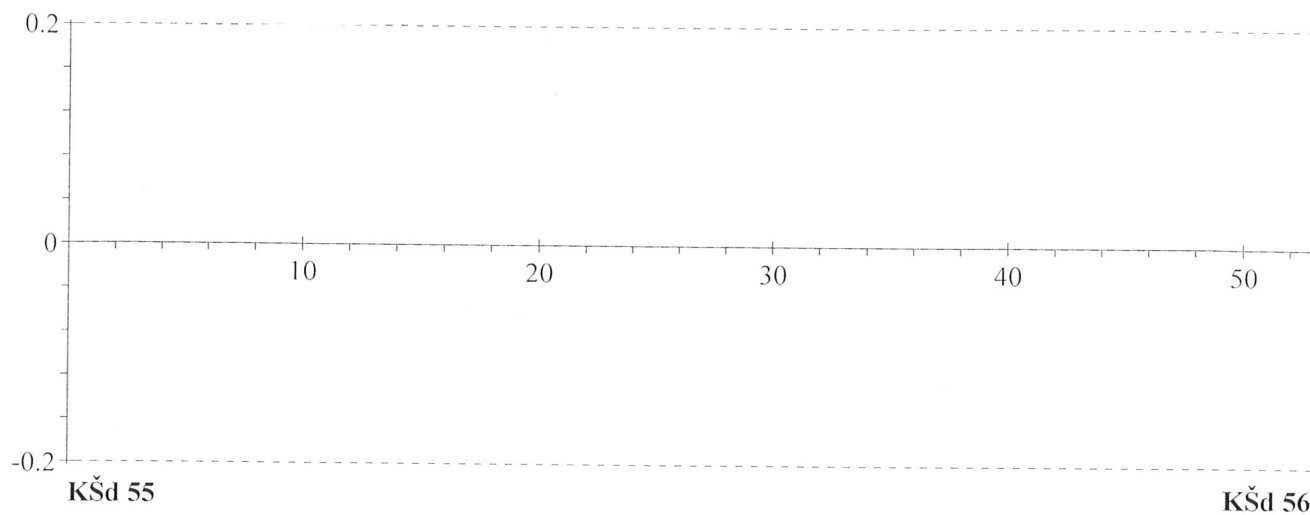
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 55 SMĚR KŠd 56

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 55	0.00m / KŠd 55		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	33
				
KŠd 56	53.02m / KŠd 55		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	33

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 9 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 55 do KŠd 56	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 55 do KŠd 56	Kontrolovaná délka : 53.02 m Naměřená délka : 53.02 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 9 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 55 do KŠd 56	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 55 do KŠd 56	Kontrolovaná délka : 53.02 m Naměřená délka : 53.02 m	

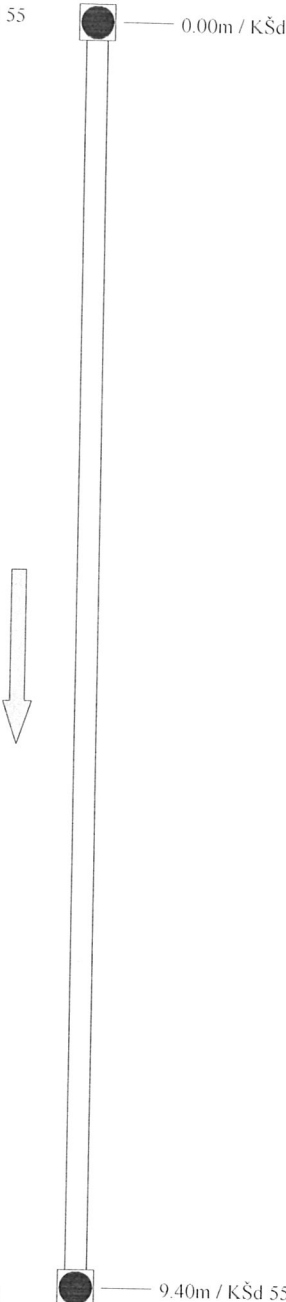
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 53.02 m		VIDEO : 00:04:55	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 10 Číslo vstupního uzlu : KŠd 55 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 51 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 55 do KŠd 51 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 9.40 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 500 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 55 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 51 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obsah přílohy :			

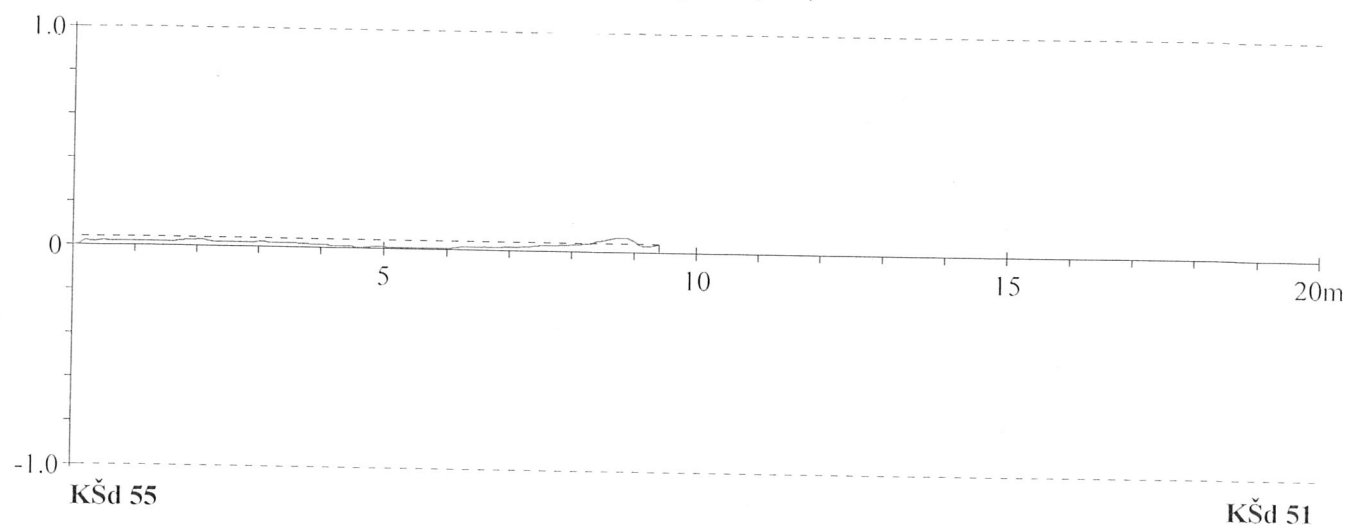
		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 10 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 55 do KŠd 51	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 55 do KŠd 51	Kontrolovaná délka : 9.40 m Naměřená délka : 9.40 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 55 SMĚR KŠd 51

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 55	0.00m / KŠd 55		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	37
				
KŠd 51	9.40m / KŠd 55		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	37
Obecné připomínky :				

Pevnost vodovodní a kanalizační aqua efekt s.r.o.	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 10 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 55 do KŠd 51	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 55 do KŠd 51	Kontrolovaná délka : 9.40 m Naměřená délka : 9.40 m	

Profil spádu (v m)



		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 10 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 55 do KŠd 51	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 55 do KŠd 51	Kontrolovaná délka : 9.40 m Naměřená délka : 9.40 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

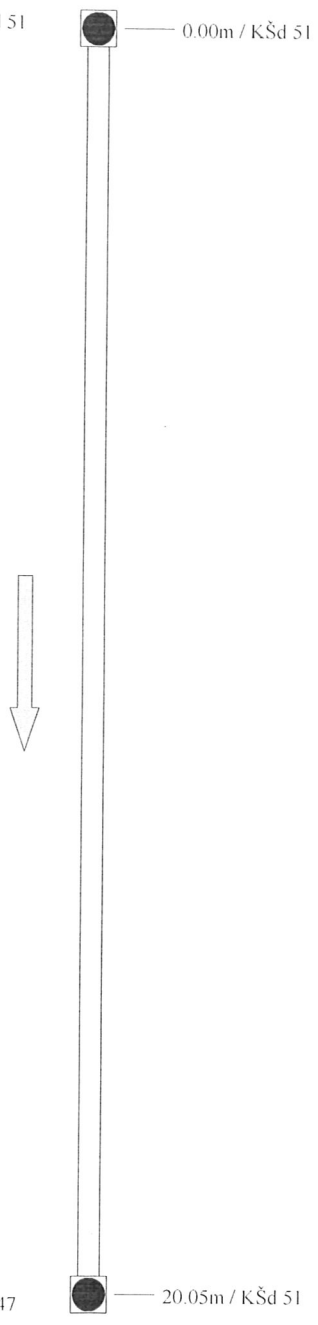
VZDÁLENOST : 9.40 m		VIDEO : 00:01:09	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
--	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 11 Číslo vstupního uzlu : KŠd 51 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 47 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 51 do KŠd 47 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 20.05 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 500 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 51 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 47 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

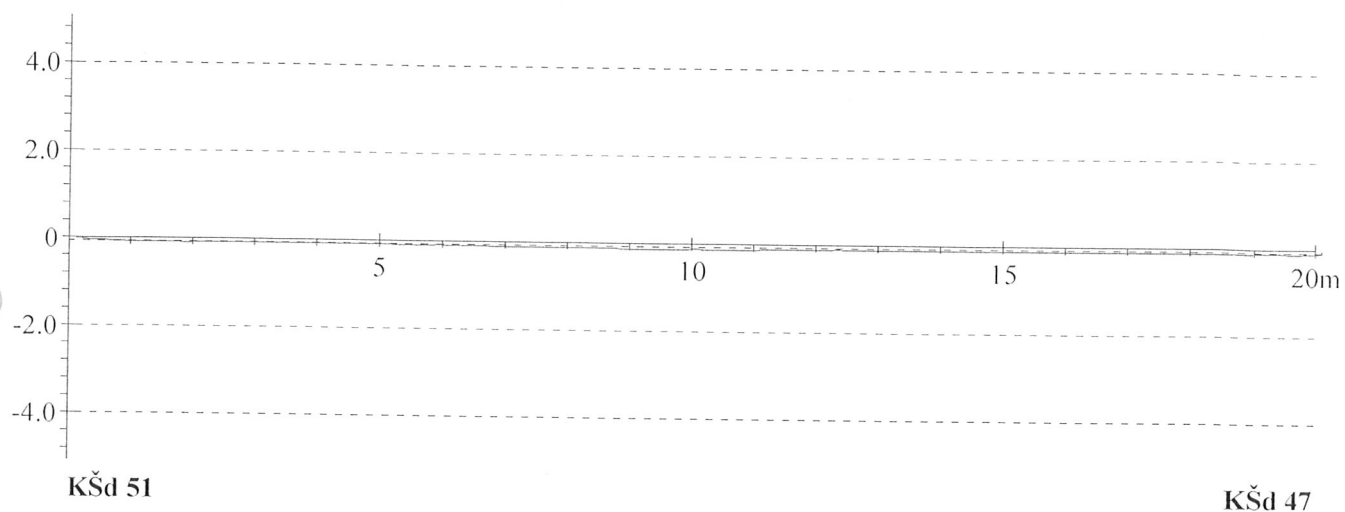
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 51 do KŠd 47	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 51 do KŠd 47	Kontrolovaná délka : 20.05 m Naměřená délka : 20.05 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 51 SMĚR KŠd 47

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 51	0.00m / KŠd 51		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	41
				
KŠd 47	20.05m / KŠd 51		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	41
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 51 do KŠd 47	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 51 do KŠd 47	Kontrolovaná délka : 20.05 m Naměřená délka : 20.05 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 11 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 51 do KŠd 47	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 51 do KŠd 47	Kontrolovaná délka : 20.05 m Naměřená délka : 20.05 m	


VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 20.05 m		VIDEO : 00:01:43	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 12 Číslo vstupního uzlu : KŠd 54 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 50 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 54 do KŠd 50 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 9.46 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 500 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 54 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 50 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

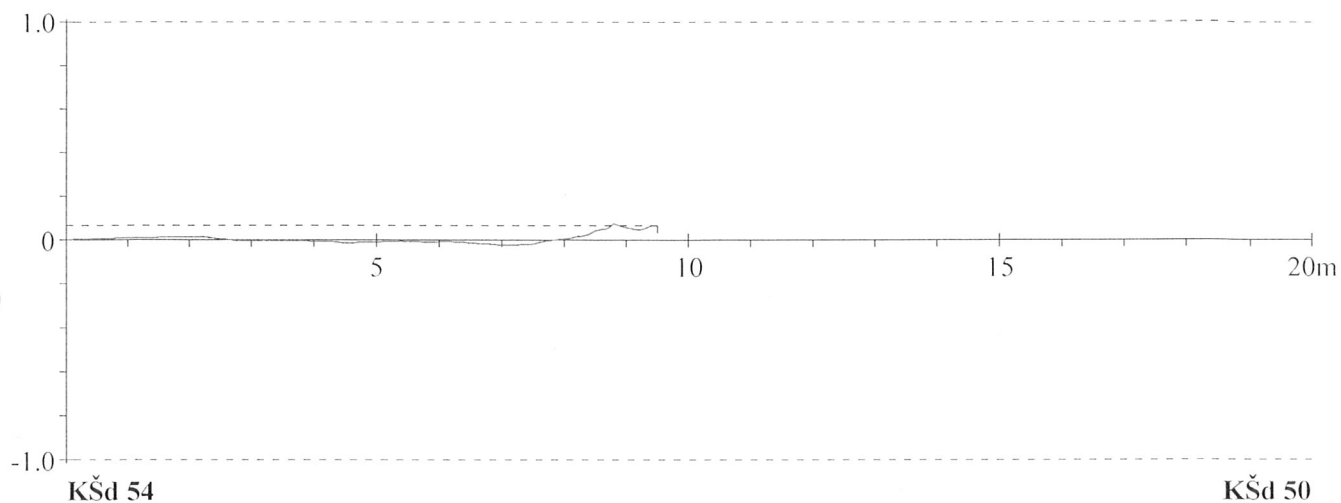
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 54 do KŠd 50	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 54 do KŠd 50	Kontrolovaná délka : 9.46 m Naměřená délka : 9.46 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 54 SMĚR KŠd 50

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 54	0.00m / KŠd 54		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	45
				
KŠd 50	9.46m / KŠd 54		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	45
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 54 do KŠd 50	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 54 do KŠd 50	Kontrolovaná délka : 9.46 m Naměřená délka : 9.46 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 12 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 54 do KŠd 50	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 54 do KŠd 50	Kontrolovaná délka : 9.46 m Naměřená délka : 9.46 m	

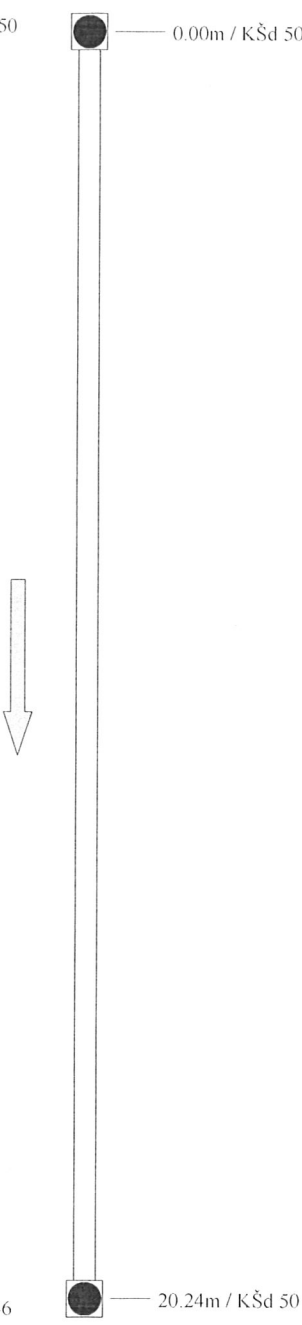
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 9.46 m		VIDEO : 00:00:52	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 13 Číslo vstupního uzlu : KŠd 50 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 46 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 50 do KŠd 46 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 20.24 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 500 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 50 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 46 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 13 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 50 do KŠd 46	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 50 do KŠd 46	Kontrolovaná délka : 20.24 m Naměřená délka : 20.24 m	

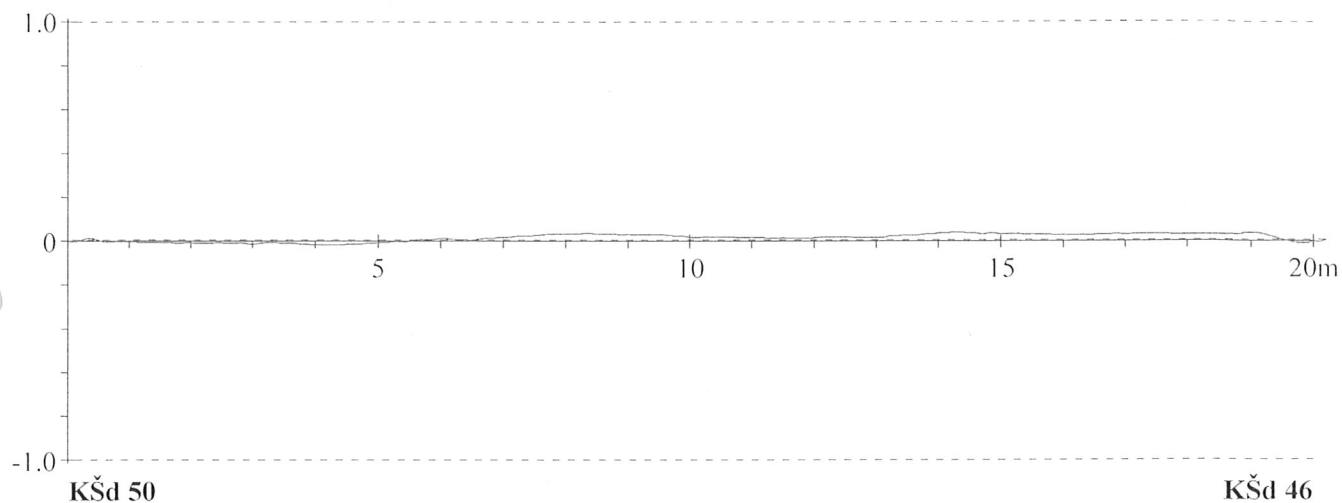
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 50 SMĚR KŠd 46

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 50	0.00m / KŠd 50		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	49
				
KŠd 46	20.24m / KŠd 50		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	49

Obecné připomínky :

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 13 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 50 do KŠd 46	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 50 do KŠd 46	Kontrolovaná délka : 20.24 m Naměřená délka : 20.24 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 13 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 50 do KŠd 46	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 50 do KŠd 46	Kontrolovaná délka : 20.24 m Naměřená délka : 20.24 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

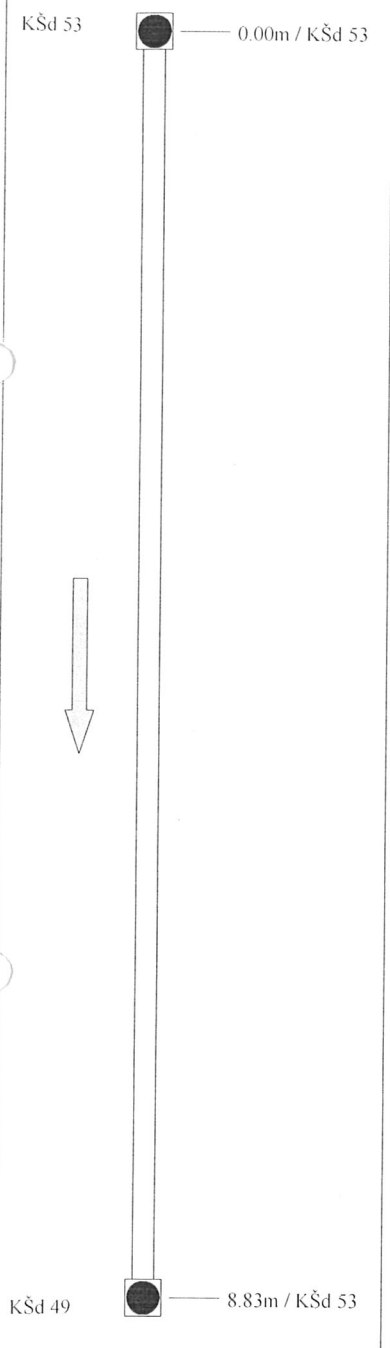
VZDÁLENOST : 20.24 m		VIDEO : 00:01:49	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 14 Operátor : Škulavík
---	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 14 Číslo vstupního uzlu : KŠd 53 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 49 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 53 do KŠd 49 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 8.83 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 500 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 53 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 49 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 14 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 49	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 49	Kontrolovaná délka : 8.83 m Naměřená délka : 8.83 m	

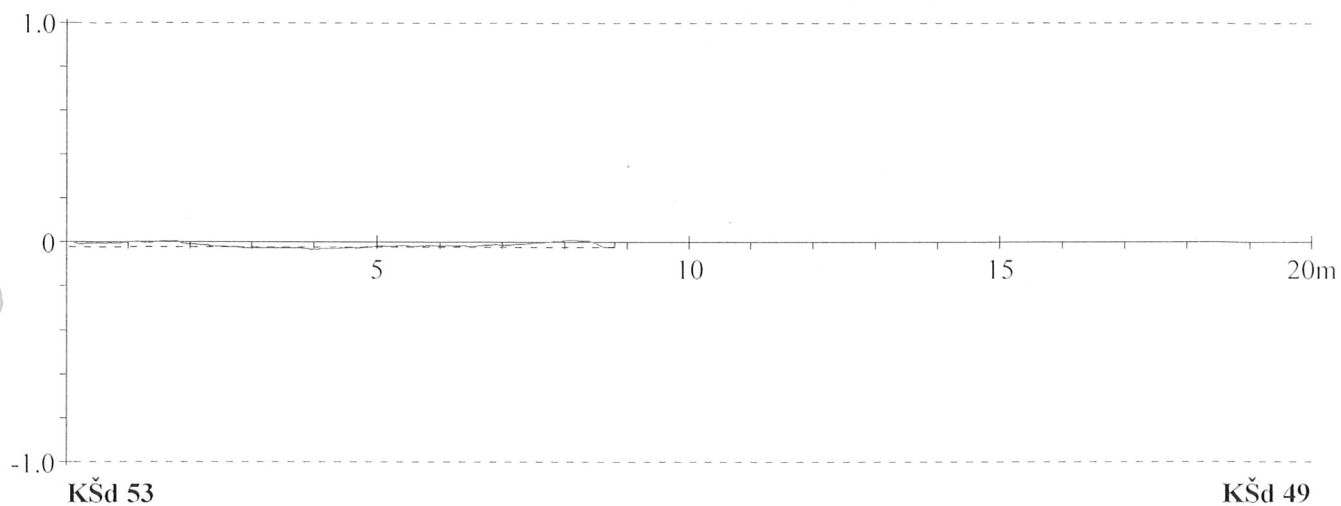
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 53 SMĚR KŠd 49

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 53	0.00m / KŠd 53		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	53
				
KŠd 49	8.83m / KŠd 53		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	53

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 14 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 49	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 49	Kontrolovaná délka : 8.83 m Naměřená délka : 8.83 m	

Profil spádu (v m)



		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 14 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 53 do KŠd 49	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 53 do KŠd 49	Kontrolovaná délka : 8.83 m Naměřená délka : 8.83 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 8.83 m		VIDEO : 00:00:47	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 15 Číslo vstupního uzlu : KŠd 49 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 45 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 49 do KŠd 45 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 19.82 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 500 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 49 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 45 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

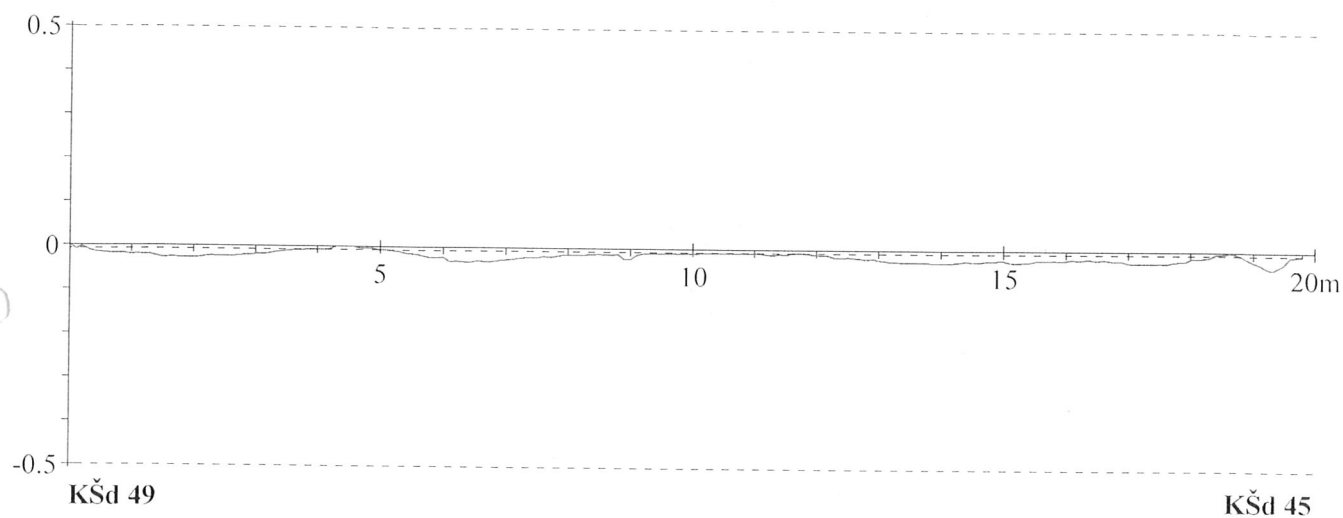
		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 15 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 45	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 19.82 m Naměřená délka : 19.82 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 49 SMĚR KŠd 45

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 49	 0.00m / KŠd 49		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	57
KŠd 45	19.82m / KŠd 49		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	57

Obecné připomínky :

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 15 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 500 mm	Směr toku KŠd 49 do KŠd 45	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 49 do KŠd 45	Kontrolovaná délka : 19.82 m Naměřená délka : 19.82 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

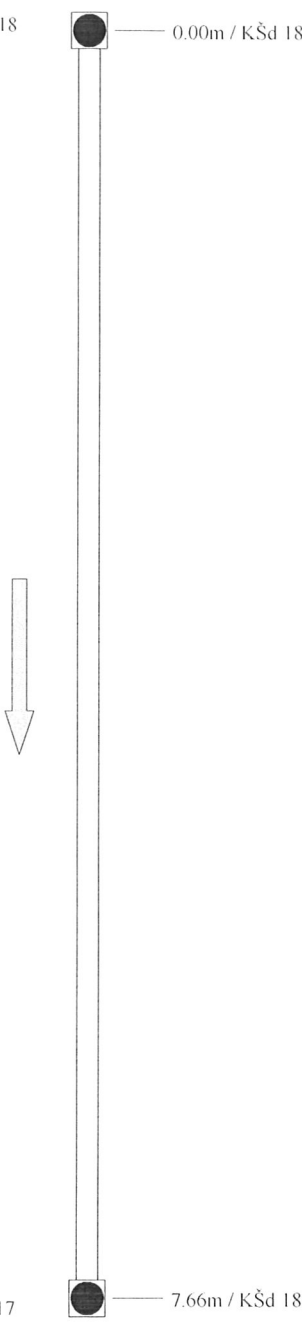
VZDÁLENOST : 19.82 m		VIDEO : 00:01:51	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 16 Operátor : Škulavík
--	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 16 Číslo vstupního uzlu : KŠd 18 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 17 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 18 do KŠd 17 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 7.66 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 18 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 17 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

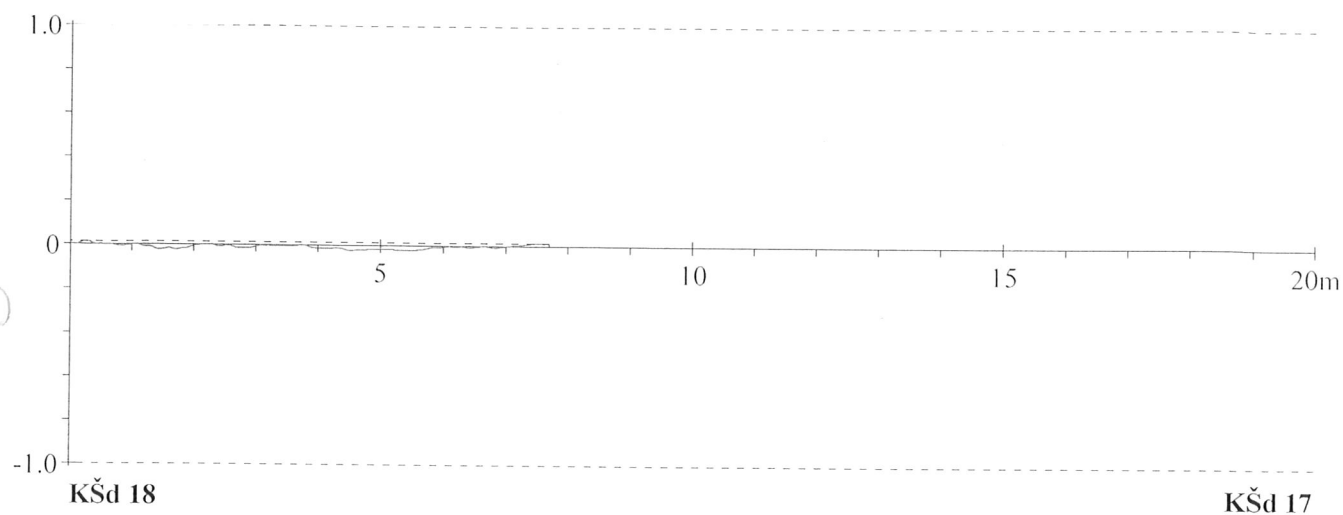
		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 16 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 18 do KŠd 17	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 18 do KŠd 17	Kontrolovaná délka : 7.66 m Naměřená délka : 7.66 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 18 SMĚR KŠd 17

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 18 	0.00m / KŠd 18		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	61
KŠd 17	7.66m / KŠd 18		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	61
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 16 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 18 do KŠd 17	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 18 do KŠd 17	Kontrolovaná délka : 7.66 m Naměřená délka : 7.66 m	

Profil spádu (v m)



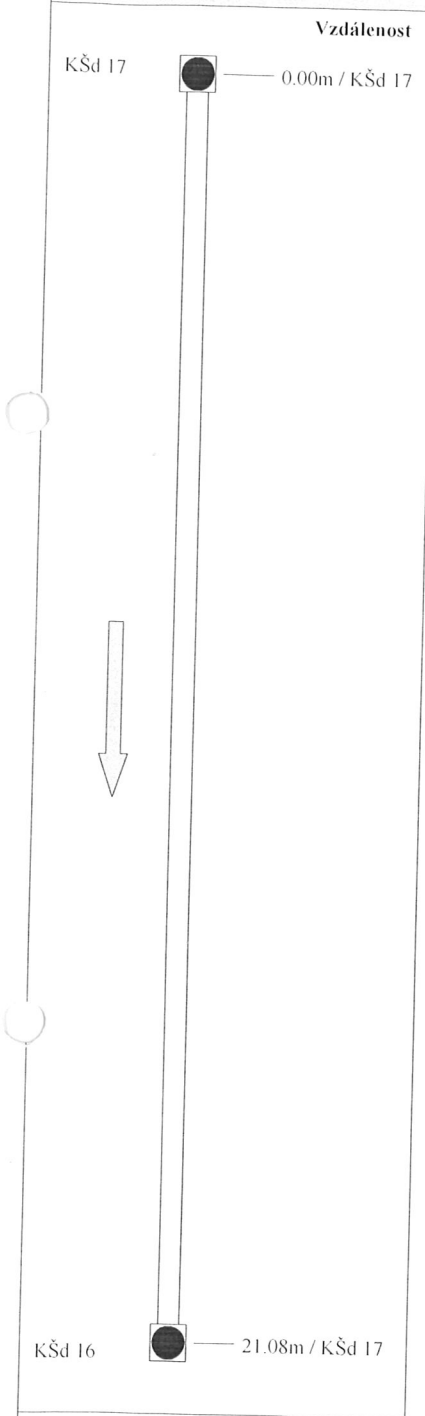
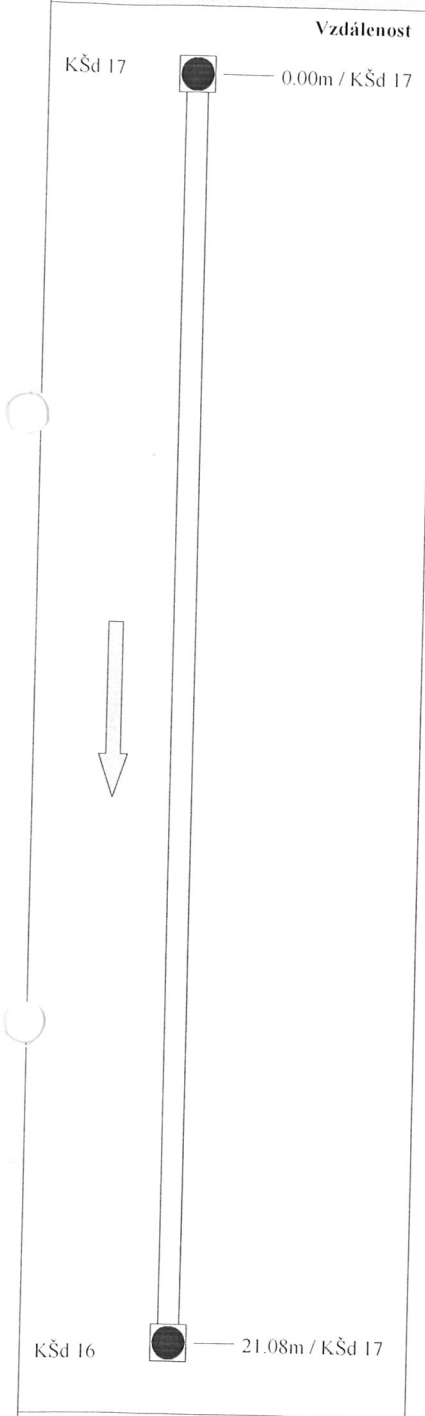
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 16 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 18 do KŠd 17	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 18 do KŠd 17	Kontrolovaná délka : 7.66 m Naměřená délka : 7.66 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 7.66 m		VIDEO : 00:00:36	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

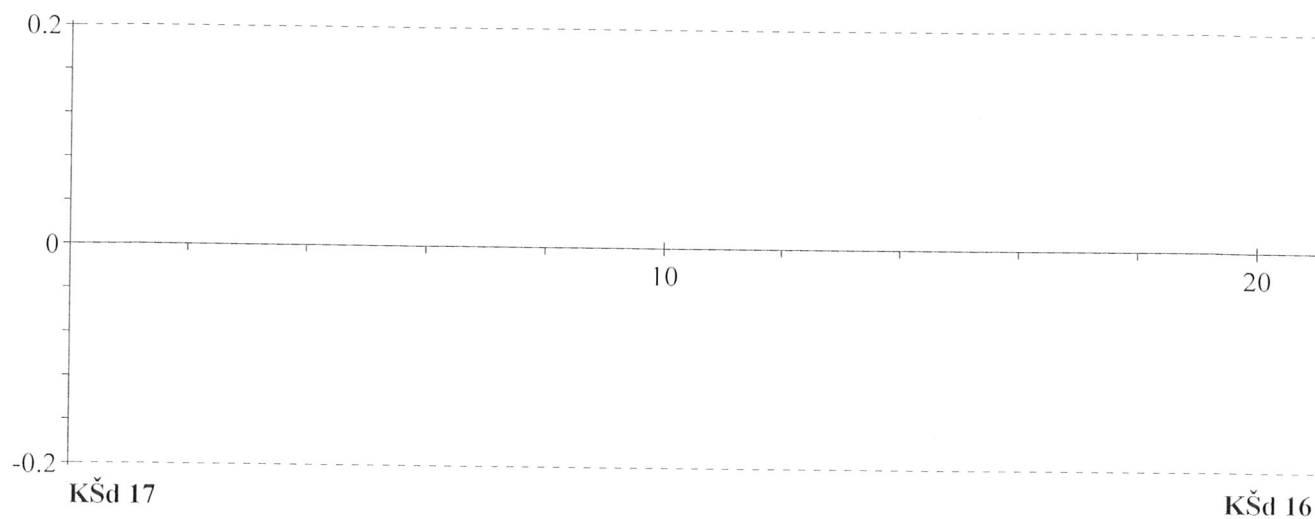
Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 17 Číslo vstupního uzlu : KŠd 17 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 16 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 17 do KŠd 16 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 21.08 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 17 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 16 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 17 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 17 do KŠd 16	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 17 do KŠd 16	Kontrolovaná délka : 21.08 m Naměřená délka : 21.08 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 17 SMĚR KŠd 16				
	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 17 	0.00m / KŠd 17		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	65
KŠd 16 	21.08m / KŠd 17		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	65
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 17 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 17 do KŠd 16	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 17 do KŠd 16	Kontrolovaná délka : 21.08 m Naměřená délka : 21.08 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 17 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 17 do KŠd 16	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 17 do KŠd 16	Kontrolovaná délka : 21.08 m Naměřená délka : 21.08 m	

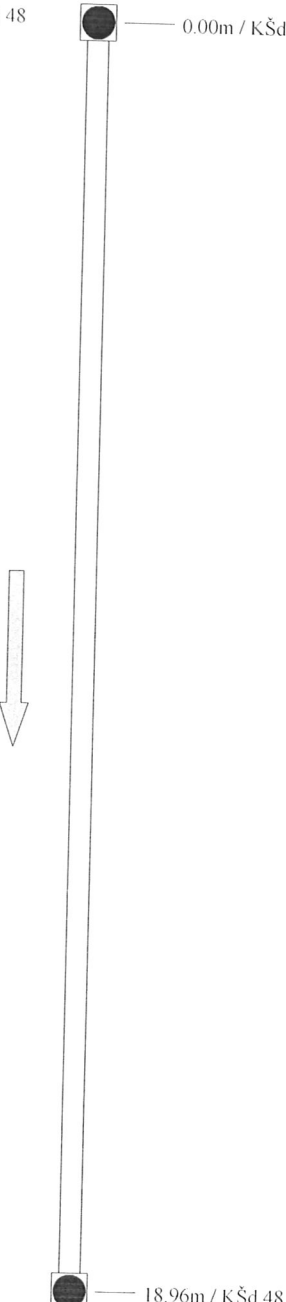
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 21.08 m		VIDEO : 00:01:52	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 18 Číslo vstupního uzlu : KŠd 48 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 52 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 48 do KŠd 52 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 18.96 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 48 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedení stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 52 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedení stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

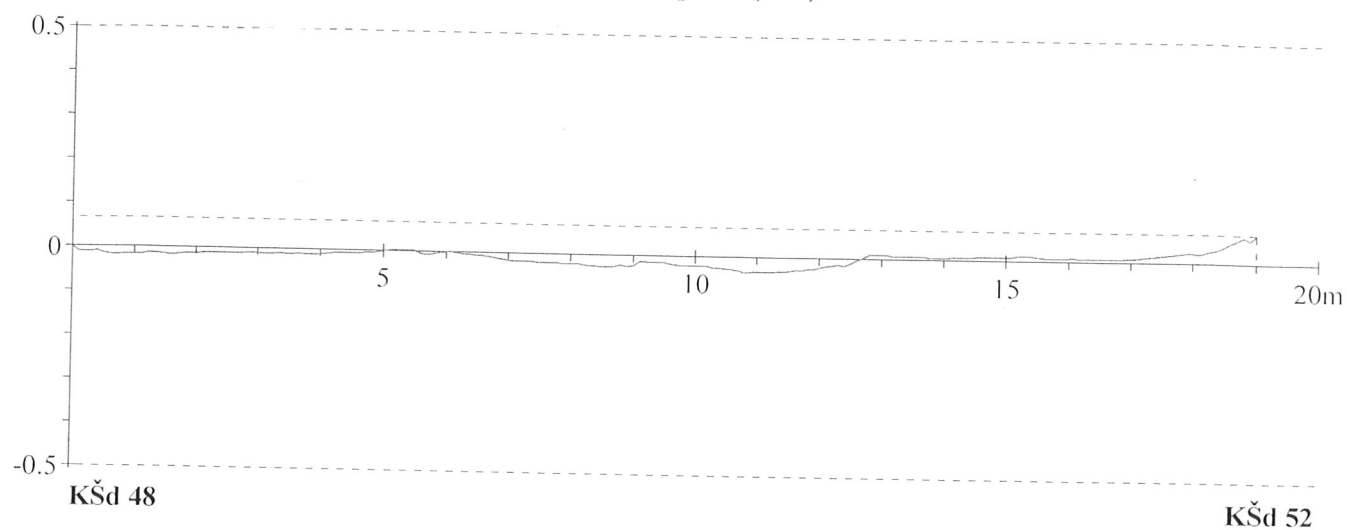
		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 18 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 48 do KŠd 52	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 48 do KŠd 52	Kontrolovaná délka : 18.96 m Naměřená délka : 18.96 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 48 SMĚR KŠd 52

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 48	0.00m / KŠd 48		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	69
				
KŠd 52	18.96m / KŠd 48		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	69
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 18 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 48 do KŠd 52	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 48 do KŠd 52	Kontrolovaná délka : 18.96 m Naměřená délka : 18.96 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 18 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 48 do KŠd 52	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 48 do KŠd 52	Kontrolovaná délka : 18.96 m Naměřená délka : 18.96 m	

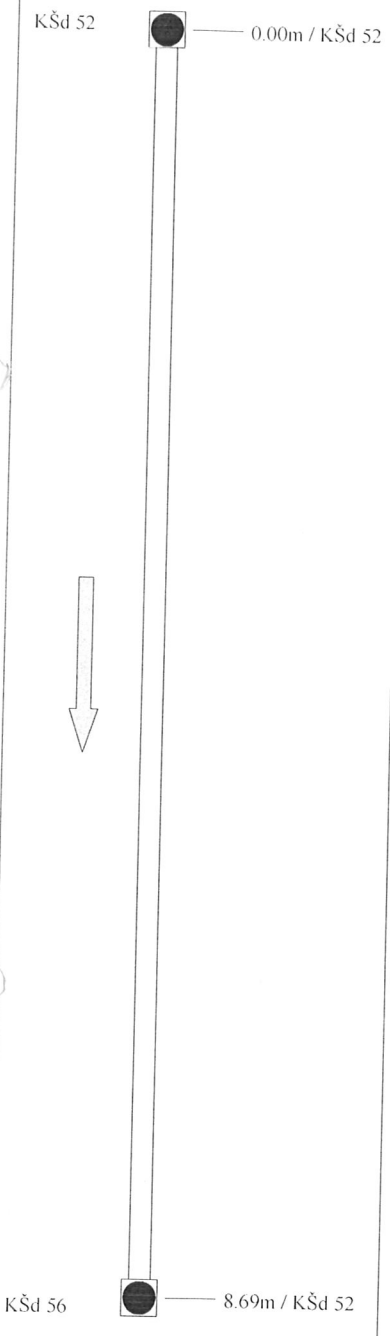
VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 18.96 m		VIDEO : 00:01:43	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 11.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 19 Číslo vstupního uzlu : KŠd 52 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 56 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 52 do KŠd 56 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 8.69 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 52 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 56 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

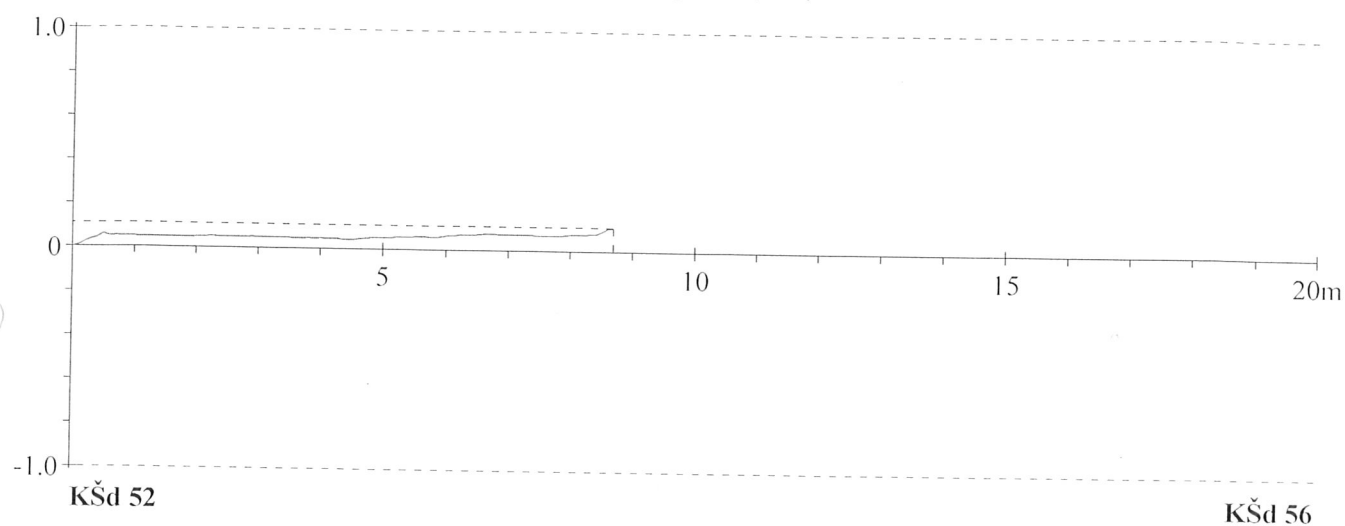
		Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o		Složka : Stokový úsek : Dílec č. 19 Operátor : Škulavík
Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 52 do KŠd 56	Datum kontroly : 11 červen 2018	
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 52 do KŠd 56	Kontrolovaná délka : 8.69 m Naměřená délka : 8.69 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 52 SMĚR KŠd 56

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 52	0.00m / KŠd 52		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	73
				
KŠd 56	8.69m / KŠd 52		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	73
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 19 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 52 do KŠd 56	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 52 do KŠd 56	Kontrolovaná délka : 8.69 m Naměřená délka : 8.69 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 19 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 52 do KŠd 56	Datum kontroly : 11 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 52 do KŠd 56	Kontrolovaná délka : 8.69 m Naměřená délka : 8.69 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 8.69 m		VIDEO : 00:00:47	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Prostředí ochrany životního prostředí
aqua efekt
s.r.o.

Nitra
Vetva A

Datum : 11.06.2018

Složka :

Stokový úsek	Prům.	Délka kontrolovane	Typ sítě	Typ trouba	Vzdálenost	Poznámky	Strana
KŠd 49 vers KŠd 17	1000	48.53 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 48.53	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	5 5
KŠd 49 vers KŠd 50	1000	54.08 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 54.08	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	9 9
KŠd 50 vers KŠd 51	1000	49.91 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 49.91	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	13 13
KŠd 51 vers KŠd 52	1000	52.74 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 52.74	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	17 17
KŠd 53 vers KŠd 18	1000	48.66 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 48.66	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	21 21
KŠd 53 vers KŠd 54	1000	53.09 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 53.09	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	25 25
KŠd 54 vers KŠd 55	1000	50.18 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 50.18	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	29 29
KŠd 55 vers KŠd 56	1000	53.02 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 53.02	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	33 33
KŠd 55 vers KŠd 51	500	9.40 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 9.40	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	37 37
KŠd 51 vers KŠd 47	500	20.05 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 20.05	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	41 41
KŠd 54 vers KŠd 50	500	9.46 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 9.46	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	45 45
KŠd 50 vers KŠd 46	500	20.24 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 20.24	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	49 49
KŠd 53 vers KŠd 49	500	8.83 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 8.83	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	53 53
KŠd 49 vers KŠd 45	500	19.82 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 19.82	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	57 57
KŠd 18 vers KŠd 17	1000	7.66 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 7.66	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	61 61
KŠd 17 vers KŠd 16	1000	21.08 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 21.08	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	65 65
KŠd 48 vers KŠd 52	1000	18.96 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 18.96	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	69 69
KŠd 52 vers KŠd 56	1000	8.69 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 8.69	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	73 73

<Název společnosti>

<Adresa společnosti>

Strana : 74/77

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A
Složka :

Datum : 11.06.2018

Poslední vydání: 11.06.2018
aqua efekt
K.15

Vlastností kanalizačního dílce								
Stokový úsek	KŠd 49 do KŠd 17	KŠd 49 do KŠd 50	KŠd 50 do KŠd 51	KŠd 51 do KŠd 52	KŠd 53 do KŠd 18	KŠd 53 do KŠd 54	KŠd 54 do KŠd 55	KŠd 55 do KŠd 56
Průměr trubice :	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000
Měřená délka trubicového dílce :	48.53 m	54.08 m	49.91 m	52.74 m	48.66 m	53.09 m	50.18 m	53.02 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	48.53 m	54.08 m	49.91 m	52.74 m	48.66 m	53.09 m	50.18 m	53.02 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Složka :

Datum : 11.06.2018

Projektová společnost
aqua efekt
s.r.o.

Vlastnosti kanalizačního dílce								
Stokový úsek	KŠd 55 do KŠd 51	KŠd 51 do KŠd 47	KŠd 54 do KŠd 50	KŠd 50 do KŠd 46	KŠd 53 do KŠd 49	KŠd 49 do KŠd 45	KŠd 18 do KŠd 17	KŠd 17 do KŠd 16
Průměr trubce :	Ř500	Ř500	Ř500	Ř500	Ř500	Ř500	Ř1000	Ř1000
Měřená délka trubicového dílce :	9.40 m	20.05 m	9.46 m	20.24 m	8.83 m	19.82 m	7.66 m	21.08 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	9.40 m	20.05 m	9.46 m	20.24 m	8.83 m	19.82 m	7.66 m	21.08 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A
Složka :

Datum : 11.06.2018

Plnění měřicího účelu
aqua efekt

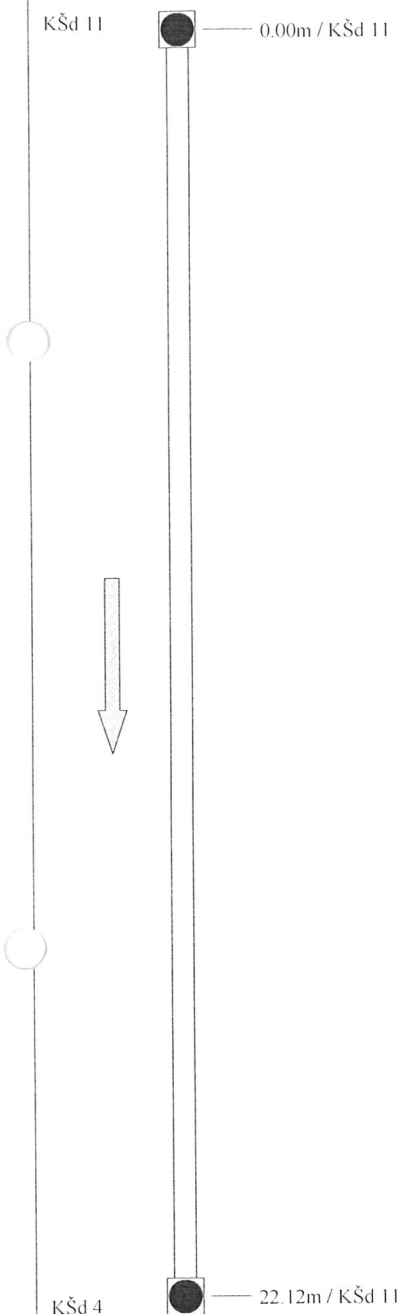
Vlastnosti kanalizačního dílce								Celkem
Stokový úsek	KŠd 48 do KŠd 52	KŠd 52 do KŠd 56						
Průměr trubice :	Ř1000	Ř1000						
Měřená délka trubcového dílce :	18.96 m	8.69 m						554.40 m
Kontrolovaná délka trubcového dílce :	18.96 m	8.69 m						554.40 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0						0 / X / X
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 20 Operátor : Škulavík
--	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 28.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 20 Číslo vstupního uzlu : KŠd 11 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 4 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 11 do KŠd 4 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 22.12 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažený bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : * Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 11 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 4 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 20 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 11 do KŠd 4	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 11 do KŠd 4	Kontrolovaná délka : 22.12 m Naměřená délka : 22.12 m	

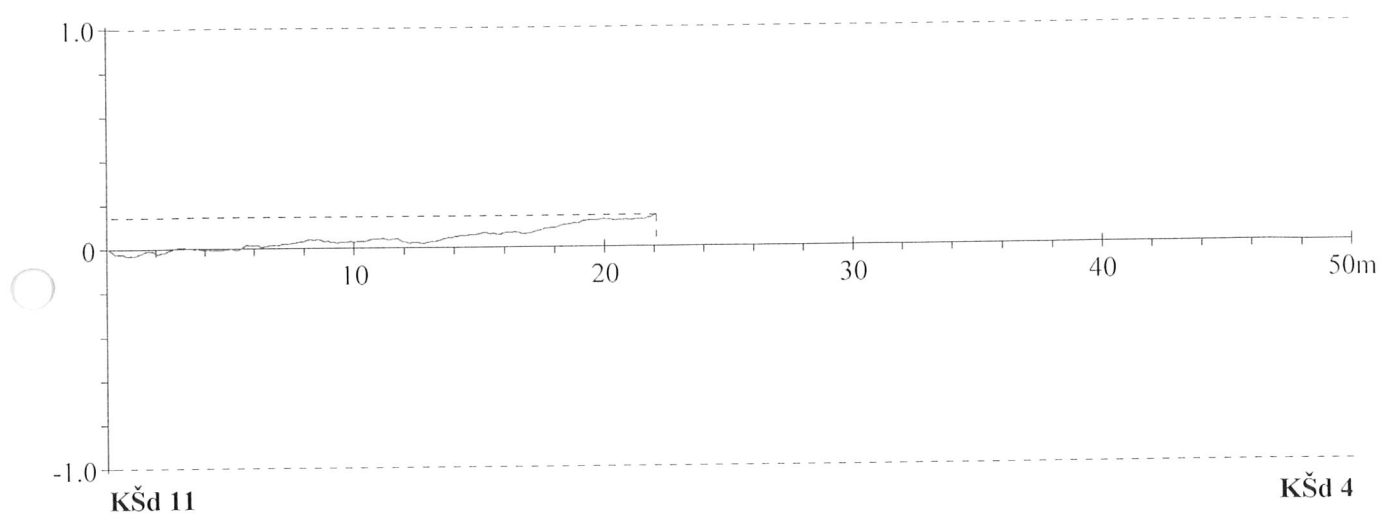
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 11 SMĚR KŠd 4

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 11	0.00m / KŠd 11		BCDA - Vstupní šachta - sítoková	77
				
KŠd 4	22.12m / KŠd 11		BCEA - Vstupní šachta - sítoková	77

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 20 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 11 do KŠd 4	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 11 do KŠd 4	Kontrolovaná délka : 22.12 m Naměřená délka : 22.12 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 20 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 11 do KŠd 4	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 11 do KŠd 4	Kontrolovaná délka : 22.12 m Naměřená délka : 22.12 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

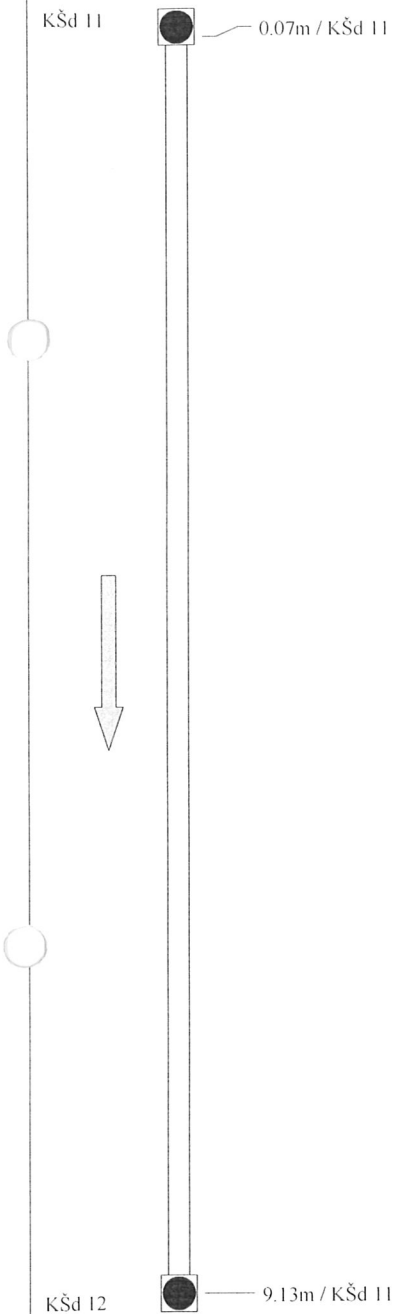
VZDÁLENOST : 22.12 m		VIDEO : 00:02:08	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 21 Operátor : Škulavík
--	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 28.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 21 Číslo vstupního uzlu : KŠd 11 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 12 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 11 do KŠd 12 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 9.13 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažený bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 11 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 12 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 21 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 11 do KŠd 12	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 11 do KŠd 12	Kontrolovaná délka : 9.13 m Naměřená délka : 9.13 m	

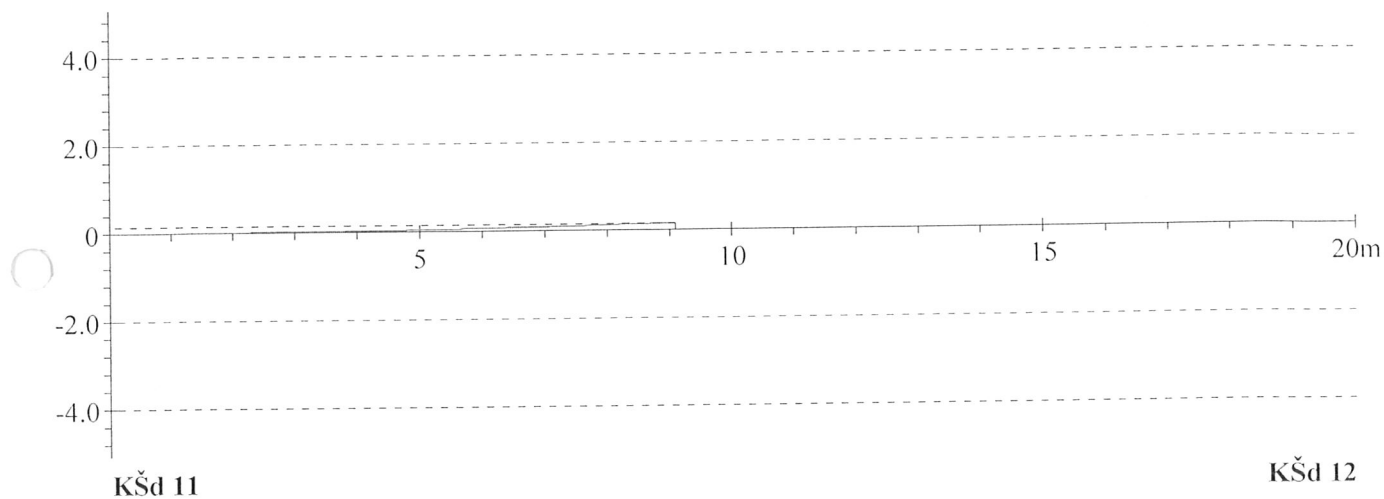
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 11 SMĚR KŠd 12

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 11	0.07m / KŠd 11		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	81
				
KŠd 12	9.13m / KŠd 11		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	81

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 21 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 11 do KŠd 12	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 11 do KŠd 12	Kontrolovaná délka : 9.13 m Naměřená délka : 9.13 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 21 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 11 do KŠd 12	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 11 do KŠd 12	Kontrolovaná délka : 9.13 m Naměřená délka : 9.13 m	

VZDÁLENOST : 0.07 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

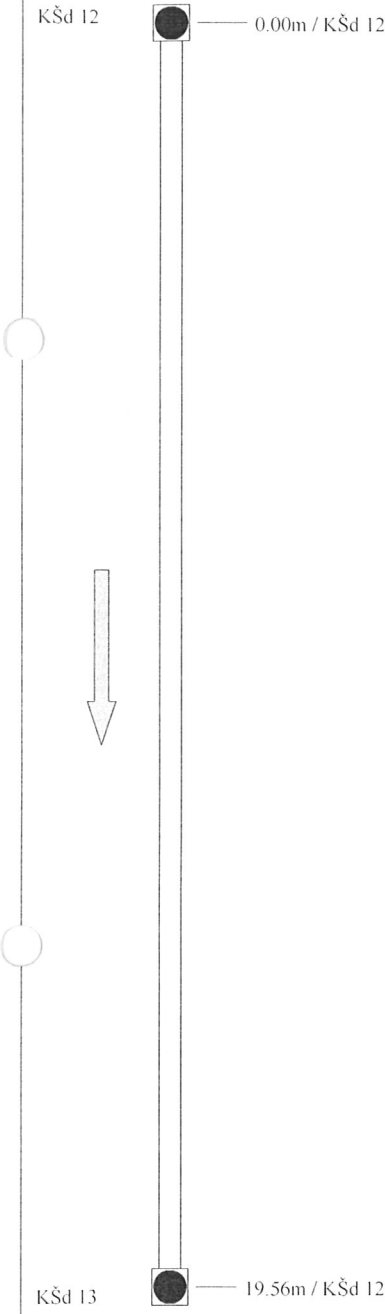
VZDÁLENOST : 9.13 m		VIDEO : 00:00:46	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 22 Operátor : Škulavík
--	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 28.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 22 Číslo vstupního uzlu : KŠd 12 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 13 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 12 do KŠd 13 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 19.56 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Vztažný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 12 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedení stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 13 Rozměry vstupní šachty : Ø1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedení stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

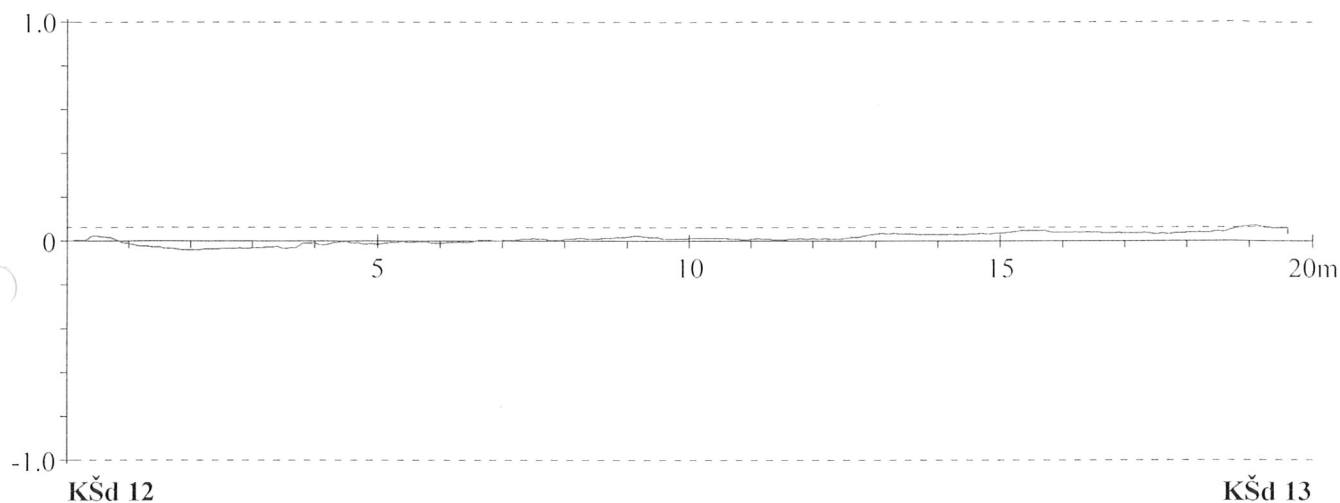
	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 22 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 12 do KŠd 13	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 12 do KŠd 13	Kontrolovaná délka : 19.56 m Naměřená délka : 19.56 m	

SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 12 SMĚR KŠd 13

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 12	0.00m / KŠd 12		BCDA - Vstupní šachta	85
				
KŠd 13	19.56m / KŠd 12		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	85
Obecné připomínky :				

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 22 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 12 do KŠd 13	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 12 do KŠd 13	Kontrolovaná délka : 19.56 m Naměřená délka : 19.56 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 22 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 12 do KŠd 13	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 12 do KŠd 13	Kontrolovaná délka : 19.56 m Naměřená délka : 19.56 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta			

VZDÁLENOST : 19.56 m		VIDEO : 00:01:33	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o	Složka: Stokový úsek : Dílec č. 23 Operátor : Škulavík
--	--	--

Identifikace kontroly		Identifikace kontrolovaného úseku	
Cíl : Závěrečná přejímka nové stavby Město: Nitra Adresa : Vetva A Umístění : V pozemní komunikaci Vlastnictví pozemku : Veřejný majetek Odpovědný orgán : Zadavatel: Inpek Holding s.r.o Vedoucí stavby : Datum kontroly : 28.06.2018		Číslo úseku : Dílec č. 23 Číslo vstupního uzlu : KŠd 13 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Číslo vstupního uzlu : KŠd 14 Hloubka potrubí ve vstupním uzlu : Směr přítoku : KŠd 13 do KŠd 14 Směr kontroly : Po proudu Typ stoky : Gravitační Využití stoky : Pro odpadní vody Stav, statut : nové, mimo provoz Délka měřená na povrchu : 9.97 m	
Identifikace referencí a nosičů		Identifikace kontrolovaného potrubí	
Číslo normy pro kódování : NF EN 13508-2 Označný bod na délce : Střed poklopu vstupního objektu Číslo videa : Číslo fotografie :		Tvar potrubí : Kruhovitý Průměr nebo výška : 1000 Šířka : Materiál : PVC-U Jednotková délka : 5.00 Materiál vystýlky : Žádný Typ vystýlky : -	
Podmínky prohlídky			
Předchozí čištění : Ano Srážky : Žádné srážky Vnější teplota : > 0 Kontrolní metoda : Televizní přenos		Regulace průtoku : Žádné Stavba pod vodní plochou : Ne Vizuální stav násypu : Dokončeno Stav vozovky : Existující dopravní stavba	
Identifikace počátečního uzlu :		Identifikace vstupního uzlu :	
Číslo uzlu : KŠd 13 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne		Číslo uzlu : KŠd 14 Rozměry vstupní šachty : O1000 Celková výška zařízení : Hloubka kontrolovaného potrubí Hloubka zařízení (zpevněné dno výstupního potrubí) : Počet přípojek : 0 Stupadlo nebo žebřík : Jednořadý stupadlový žebřík Provedený stokový žlábek : Ano Stopy infiltrace : Ne	
Zvláštní pozorování			
Obecné připomínky :			

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 23 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 13 do KŠd 14	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 13 do KŠd 14	Kontrolovaná délka : 9.97 m Naměřená délka : 9.97 m	

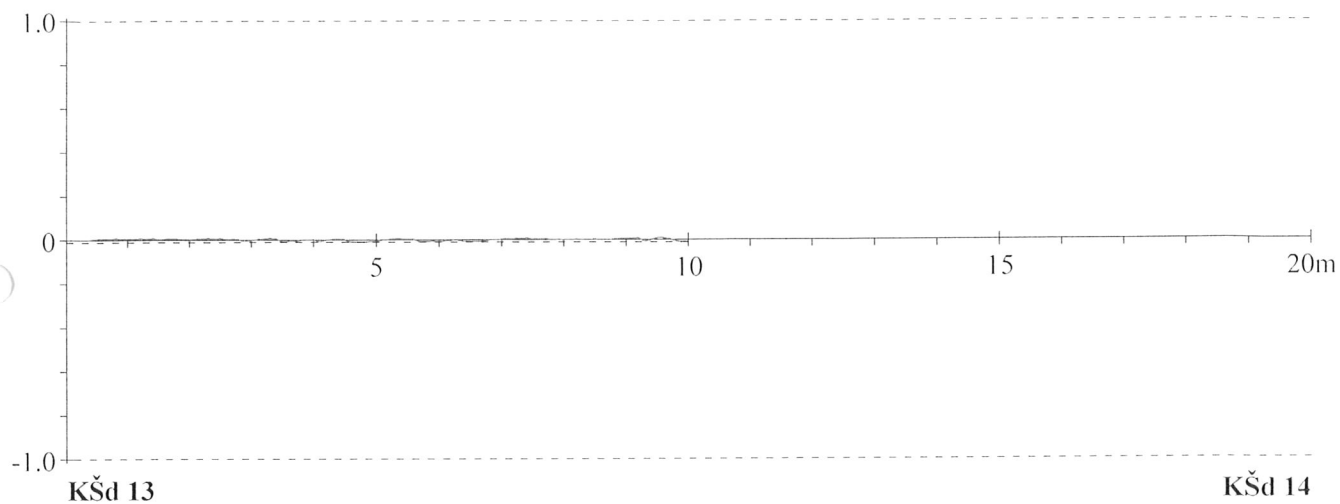
SYNTÉZA ÚSEKU KŠd 13 SMĚR KŠd 14

	Vzdálenost	Fotografie	Poznámky	Strana
KŠd 13	0.00m / KŠd 13		BCDA - Vstupní šachta - sůtoková	89
				
KŠd 14	9.97m / KŠd 13		BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	89

Obecné připomínky :

	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 23 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 13 do KŠd 14	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 13 do KŠd 14	Kontrolovaná délka : 9.97 m Naměřená délka : 9.97 m	

Profil spádu (v m)



	Nitra Vetva A Inpek Holding s.r.o			Složka : Stokový úsek : Dílec č. 23 Operátor : Škulavík
	Typ sítě : Pro odpadní vody	Průměr potrubí : 1000 mm	Směr toku KŠd 13 do KŠd 14	Datum kontroly : 28 červen 2018
Materiál : PVC-U	Délka trouby : 5.00 m	Směr kontroly KŠd 13 do KŠd 14	Kontrolovaná délka : 9.97 m Naměřená délka : 9.97 m	

VZDÁLENOST : 0.00 m		VIDEO : 00:00:00	
BCDA - Vstupní šachta - sůtoková			

VZDÁLENOST : 9.97 m		VIDEO : 00:00:49	
BCEA - Vstupní šachta - sůtoková			

SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Datum : 11.06.2018

Složka :

Projektová a inženýrská firma
aqua efekt
s.r.o.

Stokový úsek	Prům.	Délka kontrolovane	Typ sítě	Typ trouba	Vzdálenost	Poznámky	Strana
KŠd 49 vers KŠd 17	1000	48.53 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 48.53	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	5 5
KŠd 49 vers KŠd 50	1000	54.08 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 54.08	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	9 9
KŠd 50 vers KŠd 51	1000	49.91 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 49.91	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	13 13
KŠd 51 vers KŠd 52	1000	52.74 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 52.74	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	17 17
KŠd 53 vers KŠd 18	1000	48.66 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 48.66	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	21 21
KŠd 53 vers KŠd 54	1000	53.09 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 53.09	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	25 25
KŠd 54 vers KŠd 5	1000	50.18 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 50.18	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	29 29
KŠd 55 vers KŠd 56	1000	53.02 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 53.02	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	33 33
KŠd 55 vers KŠd 51	500	9.40 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 9.40	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	37 37
KŠd 51 vers KŠd 47	500	20.05 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 20.05	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	41 41
KŠd 54 vers KŠd 50	500	9.46 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 9.46	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	45 45
KŠd 50 vers KŠd 46	500	20.24 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 20.24	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	49 49
KŠd 53 vers KŠd 49	500	8.83 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 8.83	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	53 53
KŠd 49 vers KŠd 45	500	19.82 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 19.82	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	57 57
KŠd 18 vers KŠd 17	1000	7.66 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 7.66	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	61 61
KŠd 17 vers KŠd 16	1000	21.08 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 21.08	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	65 65
KŠd 48 vers KŠd 2	1000	18.96 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 18.96	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	69 69
KŠd 52 vers KŠd 56	1000	8.69 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 8.69	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	73 73
KŠd 11 vers KŠd 4	1000	22.12 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 22.12	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	77 77
KŠd 11 vers KŠd 12	1000	9.13 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.07 9.13	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	81 81
KŠd 12 vers KŠd 13	1000	19.56 m	Pro odpadni vody	PVC-U	0.00 19.56	BCDA - Vstupní šachta - sůtoková BCEA - Vstupní šachta - sůtoková	85 85
KŠd 13 vers KŠd 14	1000	9.97 m	Pro odpadni vody	PVC-U			

<Název společnosti>

<Adresa společnosti>

Strana : 90/94

SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Složka :

Datum : 11.06.2018

Produktentwicklung & Innovation
aqua effekt

Stokový úsek	Prům.	Délka kontrolované	Typ sítě	Typ trouba	Vzdálenost	Poznámky	Strana
					0.00 9.97	BCDA - Vstupní šachta - sítoková BCEA - Vstupní šachta - sítoková	89 89

<Název společnosti>
<Adresa společnosti>

Strana : 91/94

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Složka :

Datum : 11.06.2018

Projektová a inženýringová firma
aqua efekt
s.r.o.

Vlastnosti kanalizačního dílce								
Stokový úsek	KŠd 49 do KŠd 17	KŠd 49 do KŠd 50	KŠd 50 do KŠd 51	KŠd 51 do KŠd 52	KŠd 53 do KŠd 18	KŠd 53 do KŠd 54	KŠd 54 do KŠd 55	KŠd 55 do KŠd 56
Průměr trubice :	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000
Měřená délka trubicového dílce :	48.53 m	54.08 m	49.91 m	52.74 m	48.66 m	53.09 m	50.18 m	53.02 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	48.53 m	54.08 m	49.91 m	52.74 m	48.66 m	53.09 m	50.18 m	53.02 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Složka :

Datum : 11.06.2018

Převládající vzhled a funkce :
aqua efekt

Vlastnosti kanalizačního dílce								
Stokový úsek	KŠd 55 do KŠd 51	KŠd 51 do KŠd 47	KŠd 54 do KŠd 50	KŠd 50 do KŠd 46	KŠd 53 do KŠd 49	KŠd 49 do KŠd 45	KŠd 18 do KŠd 17	KŠd 17 do KŠd 16
Průměr trubice :	Ř500	Ř500	Ř500	Ř500	Ř500	Ř500	Ř1000	Ř1000
Měřená délka trubicového dílce :	9.40 m	20.05 m	9.46 m	20.24 m	8.83 m	19.82 m	7.66 m	21.08 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	9.40 m	20.05 m	9.46 m	20.24 m	8.83 m	19.82 m	7.66 m	21.08 m
Připojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

HLAVNÍ SYNTÉZA TELEVIZNÍ KONTROLY

Nitra
Vetva A

Složka :

Datum : 11.06.2018

Podniky vodovodních zařízení s.r.o.
aqua efekt
s.r.o.

Vlastnosti kanalizačního dílce								Celkem
Stokový úsek	KŠd 48 do KŠd 52	KŠd 52 do KŠd 56	KŠd 11 do KŠd 4	KŠd 11 do KŠd 12	KŠd 12 do KŠd 13	KŠd 13 do KŠd 14		
Průměr trubice :	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000	Ř1000		
Měřená délka trubicového dílce :	18.96 m	8.69 m	22.12 m	9.13 m	19.56 m	9.97 m		615.18 m
Kontrolovaná délka trubicového dílce :	18.96 m	8.69 m	22.12 m	9.13 m	19.56 m	9.97 m		615.18 m
Přípojky kanalizace / vstupní šachta / výstup :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0		0 / X / X
• Kompletní zkontrolovaný stokový úsek								

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd31	po šachtu č.: KŠd32
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	


3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Stefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma : ERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 910 09 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis : 
--	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.1
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd27	po šachtu č.: KŠd28
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 1(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	





3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 950	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIX spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943		Podpis : 

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.1
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd27	po šachtu č.: KŠd26
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : INPEK HOLDING, a.s. Čistáňkova trieda 81 Nitra 945 04 IČO: 50 085 956	za objednávateľa :	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 47522020 IČ DPH: SK2030290943	Podpis :
---	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.1
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd26	po šachtu č.: KŠd25
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING , a.s. Účastníci skúšky

Štefánikova trieda 81

za zhotoviteľa : Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : ERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2030290943	Podpis :
--	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.2
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd30	po šachtu č.: KŠd31
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 25° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01
IČO: 50 085 958

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 016 08 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
---	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.2
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd29	po šachtu č.: KŠd30
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 25° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 936	za objednávateľa :	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Rudlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 1737636 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
--	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva D
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd28	po šachtu č.: KŠd32
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Zásyp : nie	
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	


3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 25° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek vyhovuje požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r. • Rudlinského 11 • P. O. BOX 211 • 810 00 BRATISLAVA • IČO: 17322626 • IČ DPH: SK2020290947	Podpis : 
---	---

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis :	Dátum skúšky : 11.09.2018
STN EN 1610	Číslo protokolu :
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Labor. denník č. :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Označenie zberača - stoky :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Vetva C
Zhotoviteľ :	Technický dozor investora (TDI) :
Inpek holding	Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.:	KŠd27	po šachtu č.:	KŠd31
Dĺžka úseku (m) :	10	Počet kanalizačných odbočiek :	0
Materiál a druh rúr :	PP SN 10	DN potrubia (mm) :	500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) :	6/2	Druh spojov :	na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :			
Lôžko :	áno	Obsyp :	áno
		Zásyp :	nie
Úroveň nezniženej HPV :			
pod niveletou potrubia			

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar		Dátum kalibrácie: 16.10.2017	
Doba kondicionovania v min. :	5 min.		
Skutočný skúšobný tlak (mbar) :	100	Doba trvania skúšky :	30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15 Skutočný (mbar) : 0,0			
Podmienky pri skúške : slnečno		Teplota : 25° C	

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : INPEL Sietňovník Nitra 26 IČO: 50 085 93	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma : TEKATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626	Podpis : 
---	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva B
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd30	po šachtu č.: KŠd34
Dĺžka úseku (m) : 18	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/3	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : slnečno	
	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L ".

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01
IČO: 50 085 930

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 610 08 PRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
--	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽDOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva B
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd26	po šachtu č.: KŠd30
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 25° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING, a.s.

Štefánikova trieda
Nitra 949 01

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : ICO: 50 005 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Rudlinského 11 P. O. BOX 211 610 09 BRATISLAVA ICO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
---	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 11.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd33	po šachtu č.: KŠd29
Dĺžka úseku (m) : 18	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/3	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 27° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING, a.s.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01
IČO: 50 085 986

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. • Radlinského 11 • P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA • IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
---	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva A
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd25	po šachtu č.: KŠd29
Dĺžka úseku (m) : 10	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/2	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	Skutočný (mbar) : 0,0
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 25° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING, s.r.o.
Štefánikova trieda 81
Nitra 949 01
IČO: 50 085 956

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa :	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
---	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd36	po šachtu č.: KŠd40
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezníženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Štefánikova trieda 8 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : Ferratechnik s.p.a. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 08 BRATISLAVA IČO: 17322626 TEL: 021 44 542709/290943	Podpis :
--	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd35	po šachtu č.: KŠd39
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	


3. Priebeh skúšky


Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 456	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 12 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma :  FERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11. P.O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis : 
--	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd34	po šachtu č.: KŠd38
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : INPEK HOLDING a.s. Štefánikova trieda 8 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Skúšku vykonala firma : BRATECHNIK s.p.a. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 DPH: SK2020290943		Podpis :

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd33	po šachtu č.: KŠd37
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 500
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Štefánikova trieda 8 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : FERRATECHNIK spol. s r.o. Rudlinského 11 P. O. BOX 211 810 09 Bratislava IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
--	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba :PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd35	po šachtu č.: KŠd36
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa: INPEK HOLDING, a.s. Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : RRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17222636 DPH: SK2020290943	Podpis :
--	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd34	po šachtu č.: KŠd35
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	Zásyp : nie



3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovolený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING , a.s. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNİK SPOL. S R.O. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 01 BRATISLAVA IČO: 17322626 DIČ: SK2020290943	Podpis : 
--	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd33	po šachtu č.: KŠd34
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	
Zásyp : nie	




3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Stefánikova trieda 6 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 213 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020290943	Meno : Podpis : 
---	--

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 30.7.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.4
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd13	po šachtu č.: KŠd33
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 2(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 100 mbar	Dátum kalibrácie: 30.7.2018
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 14 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 100	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 34° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING , a.s. 5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Štefánikova trieda 81 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma :	Meno :
	Podpis :

BRATECHNİK S.A.
Radlinského 11
P. O. BOX 211
810 00 BRATISLAVA
IČO: 17322626
DPH: SK2020290943

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.1
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd11	po šachtu č.: KŠd25
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 1(UV-DN 200)
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : Stefánikova trieda 84 Nitra 949 01 IČO: 50 085 956	za objednávateľa: 12	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : FERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17333636 IČ DPH: SK2020290943	Podpis :
---	----------

PROTOKOL ZO SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET

Skúšanie vzduchom

1. Všeobecné údaje

Skúšobný predpis : STN EN 1610	Dátum skúšky : 10.09.2018
Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, metóda " L "	Číslo protokolu :
Stavba : PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA	Labor. denník č. :
Objekt : SO 517 ODVEDENIE DÁŽĎOVÝCH VÔD PARKOVISKA NV	Označenie zberača - stoky : Vetva 1.2
Zhotoviteľ : Inpek holding	Technický dozor investora (TDI) : Slovenská správa ciest
Budúci prevádzkovateľ :	

2. Technické údaje skúšaného úseku

Skúšaný úsek od šachty č.: KŠd12	po šachtu č.: KŠd29
Dĺžka úseku (m) : 50	Počet kanalizačných odbočiek : 0
Materiál a druh rúr : PP SN 10	DN potrubia (mm) : 1000
Dĺžka / počet rúr (m/ks) : 6/9	Druh spojov : na hrdlové gumičku
Spôsob uloženia potrubia v čase skúšky :	
Lôžko : áno	Obsyp : áno
	Zásyp : nie
Úroveň nezniženej HPV : pod niveletou potrubia	

3. Priebeh skúšky

Tlakomer: 400 mbar	Dátum kalibrácie: 16.10.2017
Doba kondicionovania v min. : 5 min.	
Skutočný skúšobný tlak (mbar) : 100	Doba trvania skúšky : 30 min.
Únik vzduchu pre skúšaný úsek : Dovoľený (mbar) : 15	
Skutočný (mbar) : 0,0	
Podmienky pri skúške : slnečno	Teplota : 26° C

4. Vyhodnotenie skúšky

Skúšaný úsek **vyhovuje** požiadavkám STN EN 1610 metóde " L " .

INPEK HOLDING, a.s.

Štefánikova trieda 81

Nitra 949 01

5. Účastníci skúšky

za zhotoviteľa : IČO: 50 085 950	za objednávateľa:	za TDI SSC :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Skúšku vykonala firma : TERRATECHNIK spol. s r.o. Radlinského 11 P. O. BOX 211 810 00 BRATISLAVA IČO: 17322626 IČ DPH: SK2020000000	Podpis :
---	----------

Statistika úseku

od 29.08.2018 do 10.09.2018

Rozměr : 1 000/1 000

Pro. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
1	29.08.2018	KŠd32	KŠd31	Nitra	PVC	53,70	m 1.000/ 1.000	0
2	29.08.2018	KŠd28	KŠd27	Nitra	PVC	53,90	m 1.000/ 1.000	0
3	29.08.2018	KŠd27	KŠd26	Nitra	PVC	50,00	m 1.000/ 1.000	0
4	29.08.2018	KŠd26	KŠd25	Nitra	PVC	54,50	m 1.000/ 1.000	0
5	10.09.2018	KŠd31	KŠd30	Nitra	PVC	50,10	m 1.000/ 1.000	0
6	10.09.2018	KŠd30	KŠd29	Nitra	PVC	54,60	m 1.000/ 1.000	0
7	10.09.2018	KŠd29	KŠd12	Nitra	PVC	50,20	m 1.000/ 1.000	0
14	10.09.2018	KŠd25	KŠd11	Nitra	PVC	50,20	m 1.000/ 1.000	0
Množstevní pro Rozměr : 1 000/1 000								
Počet:		Úseky	8 ks	Suma:		Úseku	417,20 m	
		Stanice	18 ks			Monitorování	417,20 m	
		Snímky	0 ks					

Rozměr : 500/500

Pro. č	Datum	Horní šachta	Spodní šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh.	Profil	Foto
8	10.09.2018	KŠd28	KŠd32	Nitra	PVC	10,00	m 500/ 500	0
9	10.09.2018	KŠd36	KŠd32	Nitra	PVC	20,00	m 500/ 500	0
10	10.09.2018	KŠd35	KŠd31	Nitra	PVC	20,00	m 500/ 500	0
11	10.09.2018	KŠd27	KŠd31	Nitra	PVC	10,00	m 500/ 500	0
12	10.09.2018	KŠd34	KŠd30	Nitra	PVC	20,00	m 500/ 500	0
13	10.09.2018	KŠd26	KŠd30	Nitra	PVC	10,00	m 500/ 500	0
15	10.09.2018	KŠd33	KŠd29	Nitra	PVC	20,00	m 500/ 500	0
16	10.09.2018	KŠd25	KŠd29	Nitra	PVC	10,00	m 500/ 500	0
Množstevní pro Rozměr : 500/500								
Počet:		Úseky	8 ks	Suma:		Úseku	120,00 m	
		Stanice	16 ks			Monitorování	120,00 m	
		Snímky	0 ks					

Množstevní celková :

Počet:		Úseky	16 ks	Suma:		Úseku	537,20 m
		Stanice	34 ks			Monitorování	537,20 m
		Snímky	0 ks				

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek

KŠd32 - KŠd31

Horní Šachta

Spodní Šachta

Směr prohlídky

KŠd32

KŠd31

ve smeru toku

Číslo prohlídky

1

Datum prohlídky 29.08.2018

Videopásky

Videos.-zacátek 00:00:00

Videos.-konec 00:00:10

Duvod insp.

Druh monitor. Optická prohlídka

Č. kanálu

Rok výroby

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 1.000 mm

Šířka (DN) 1.000 mm

Délka trubky

53,70 m

Délka úseku 53,70 m

Délka prohlídky 53,70 m

Místo

Doména

Ulice

Vlastník

Operátor

Přítomen

Poloha

Kanalizační

systém

Materiál

Vnitřní ochrana

Poznámka

Komentář

kmenových dat

Priemyselný park

Nitra

S.Kozár, N. Michalčík

Dešťová kanalizace

Polyvinylchlorid

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd32
	00:00:10	53,70	EH		Konec úseku; KŠd31

Foto	Video	Vzdál./nŠtáv	Popis
		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd32
		53.70 EH	Konec úseku; KŠd31

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd32 - KŠd31

Horní šachta

KŠd32

Spodní šachta

KŠd31

Délka prohlídky

53,70 m

Směr prohlídky

ve smeru toku

Číslo prohlídky

1

Délka úseku

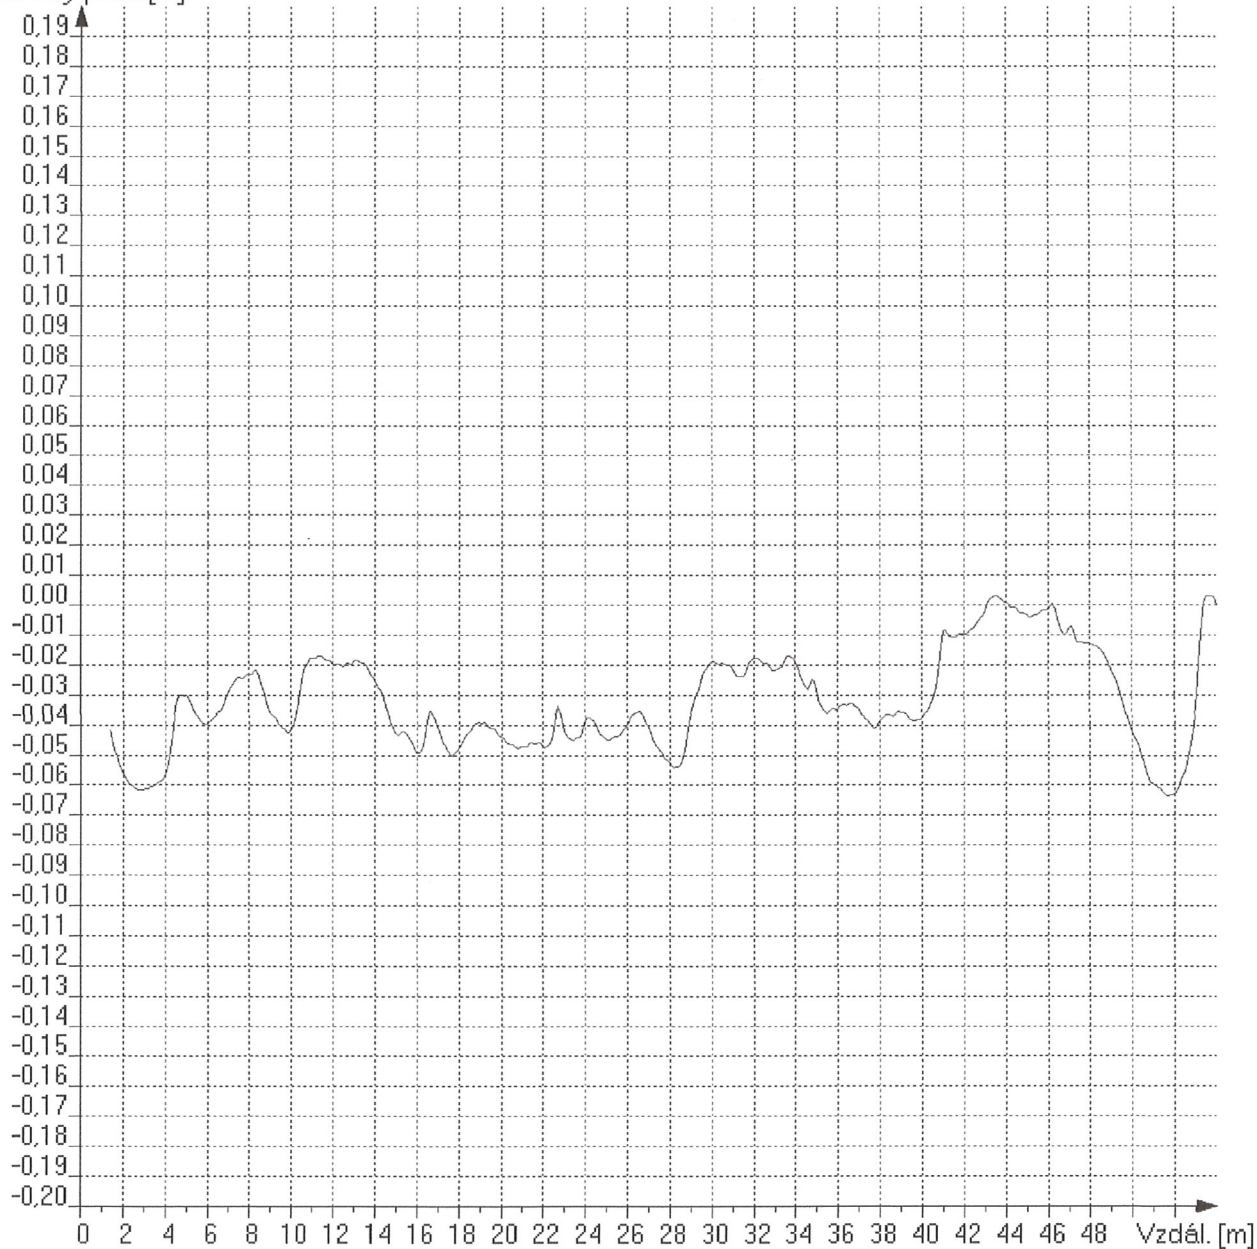
53,70 m

Kanalizační systém

KR

Datum

29.08.2018

Výškový profil [m]

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek

KŠd28 - KŠd27

Horní Šachta

Spodní Šachta

Směr prohlídky

KŠd28

KŠd27

ve smeru toku

Číslo prohlídky

2

Datum prohlídky 29.08.2018

Videopásy

Videos.-zacátek 00:00:00

Videos.-konec 00:00:10

Duvod insp.

Druh monitor. Optická prohlídka

Č. kanálu

Rok výroby

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 1.000 mm

Šířka (DN) 1.000 mm

Délka trubky

Délka úseku 53,90 m

Délka prohlídky 53,90 m

Místo

Doména

Ulice

Vlastník

Operátor

Přítomen

Poloha

Kanalizační

systém

Materiál

Vnitřní ochrana

Poznámka

Komentář

kmenových dat

Priemyselný park

Nitra

S.Kozár, D.Kandráč

Dešťová kanalizace

Polyvinylchlorid

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd28
	00:00:10	53,90	EH		Konec úseku; KŠd27

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
			KŠd28	
00:00:00		0.00	HA	Začátek úseku; KŠd28
00:00:10		53.90	EH	Konec úseku; KŠd27
			KŠd27	

Grafické znázornění spádu

Úsek
KŠd28 - KŠd27

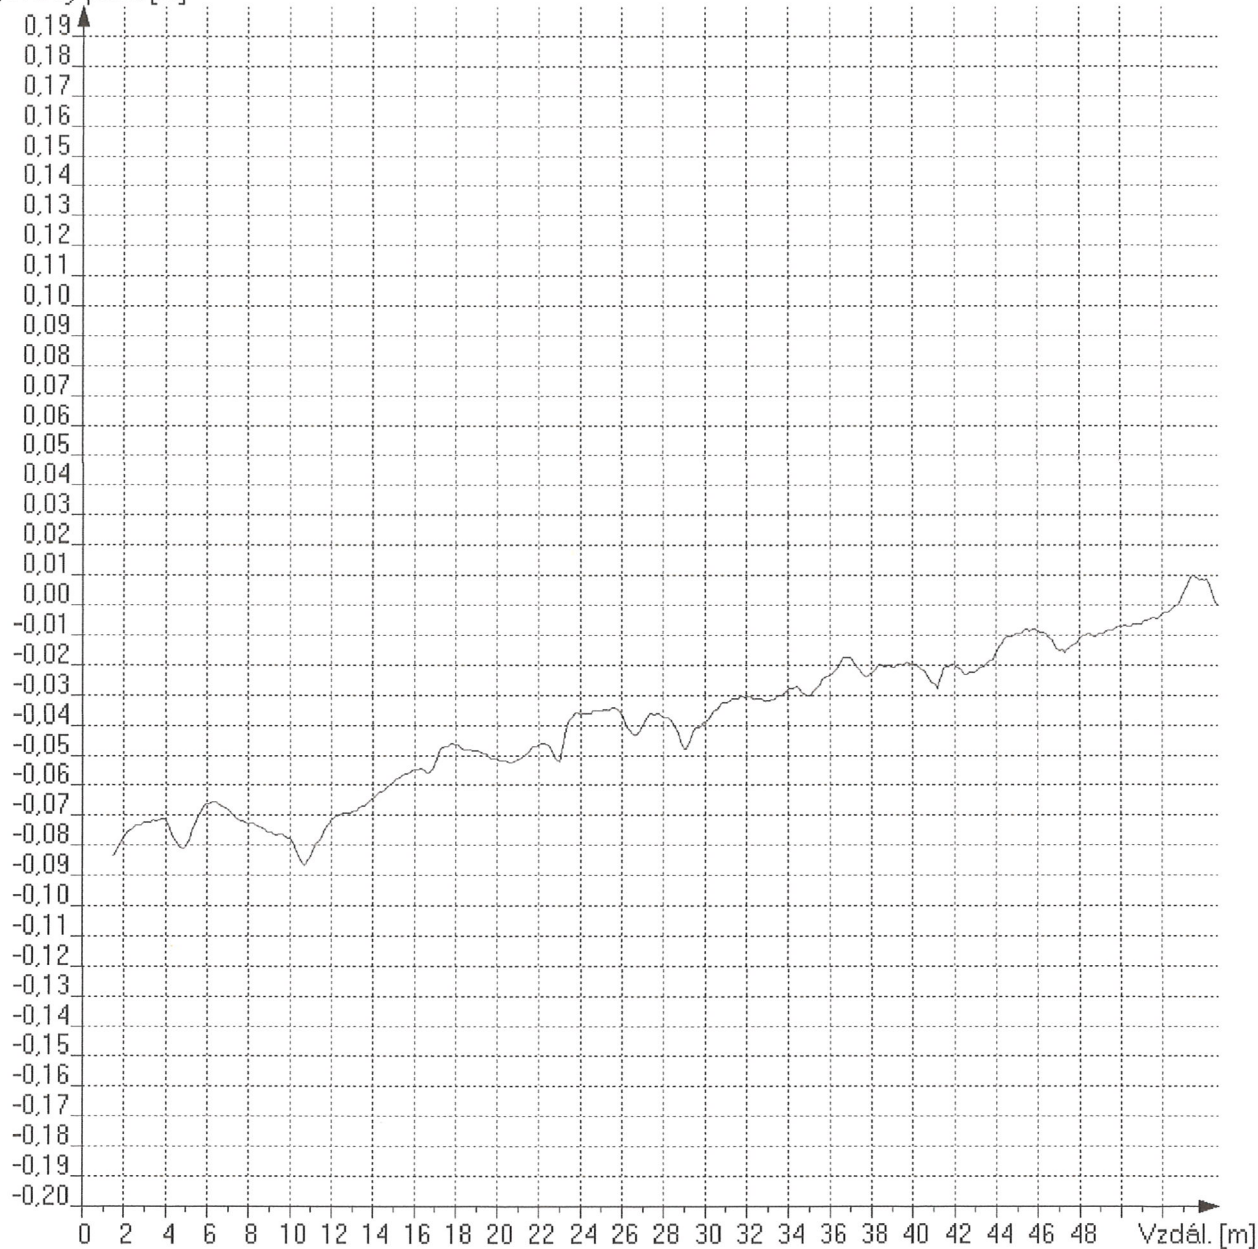
Horní šachta KŠd28
Spodní šachta KŠd27

Délka prohlídky 53,90 m
Délka úseku 53,90 m

Směr prohlídky ve smeru toku
Kanalizační systém KR

Číslo prohlídky 2
Datum 29.08.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd27	Číslo prohlídky	3
KŠd27 - KŠd26	Spodní Šachta	KŠd26	Datum prohlídky	29.08.2018
	Směr prohlídky	ve smeru toku		

Videopásy		Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek	00:00:00	Doména	
Videos.-konec	00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.		Vlastník	
Druh monitor.	Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, D.Kandráč
Č. kanálu		Přítomen	
Rok výroby		Poloha	
Tvar profilu	Kruhový profil	Kanalizační systém	Dešťová kanalizace
Výška	1.000 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Šířka (DN)	1.000 mm	Vnitřní ochrana	
Délka trubky		Poznámka	
Délka úseku	50,00 m	Komentář	
Délka prohlídky	50,00 m	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd27
	00:00:10	50,00	EH		Konec úseku; KŠd26

Foto	Video	Vzdál./mŠtáv	Popis
		KŠd27	
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd27
00:00:10		50.00 EH	Konec úseku; KŠd26
		KŠd26	

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd27 - KŠd26

Horní šachta

KŠd27

Spodní šachta

KŠd26

Délka prohlídky

50,00 m

Směr prohlídky

ve smeru toku

Císlo prohlídky

3

Délka úseku

50,00 m

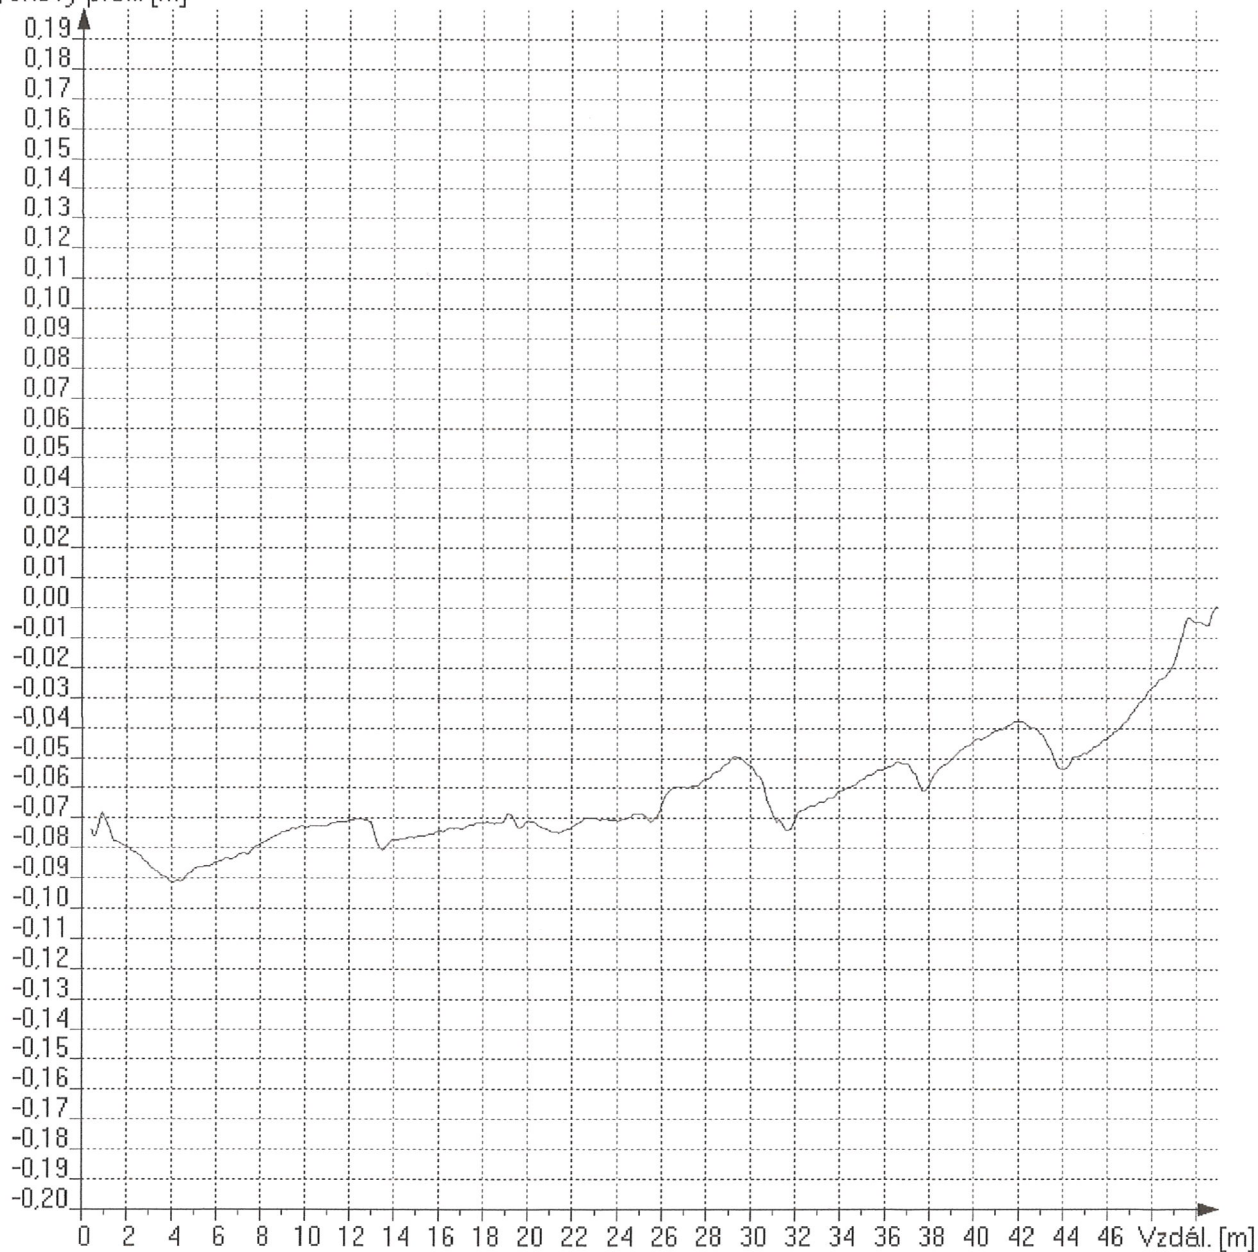
Kanalizační systém

KR

Datum

29.08.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek

KŠd26 - KŠd25

Horní Šachta

Spodní Šachta

Směr prohlídky

KŠd26

KŠd25

ve smeru toku

Číslo prohlídky

4

Datum prohlídky 29.08.2018

Videopásy

Videos.-zacátek 00:00:00

Videos.-konec 00:00:10

Duvod insp.

Druh monitor. Optická prohlídka

Č. kanálu

Rok výroby

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 1.000 mm

Šířka (DN) 1.000 mm

Délka trubky

Délka úseku 54,50 m

Délka prohlídky 54,50 m

Místo

Doména

Ulice

Vlastník

Operátor

Přítomen

Poloha

Kanalizační

systém

Materiál

Vnitřní ochrana

Poznámka

Komentář

kmenových dat

Priemyselný park

Nitra

S.Kozár, D.Kandráč

Dešťová kanalizace

Polyvinylchlorid

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd26
	00:00:10	54,50	EH		Konec úseku; KŠd25

Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd26	Císlo prohlídky	4
KŠd26 - KŠd25	Spodní Šachta	KŠd25	Datum prohlídky	29.08.2018
	Směr prohlídky	ve smeru toku		

Videopáska	Č. kanálu
Tvar profilu Kruhový profil	Místo Priemyselný park
Výška 1000 mm	Ulice Nitra
Šírka (DN) 1000 mm	Operátor S.Kozár, D.Kandráč
Délka trubky	Kanal. systém Dešťová kanalizace
Délka úseku 54,50 m	Materiál Polyvinylchlorid
Délka prohlídky 54,50 m	Vnitřní ochrana

Merítka 1/ 412 Zobrazení ve smeru inspekce

Strana grafiky 1

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
KŠd26				
00:00:00		0.00	HA	Začátek úseku; KŠd26
00:00:10		54.50	EH	Konec úseku; KŠd25
KŠd25				

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd26 - KŠd25

Horní šachta

KŠd26

Spodní šachta

KŠd25

Délka prohlídky

54,50 m

Směr prohlídky

ve smeru toku

Číslo prohlídky

4

Délka úseku

54,50 m

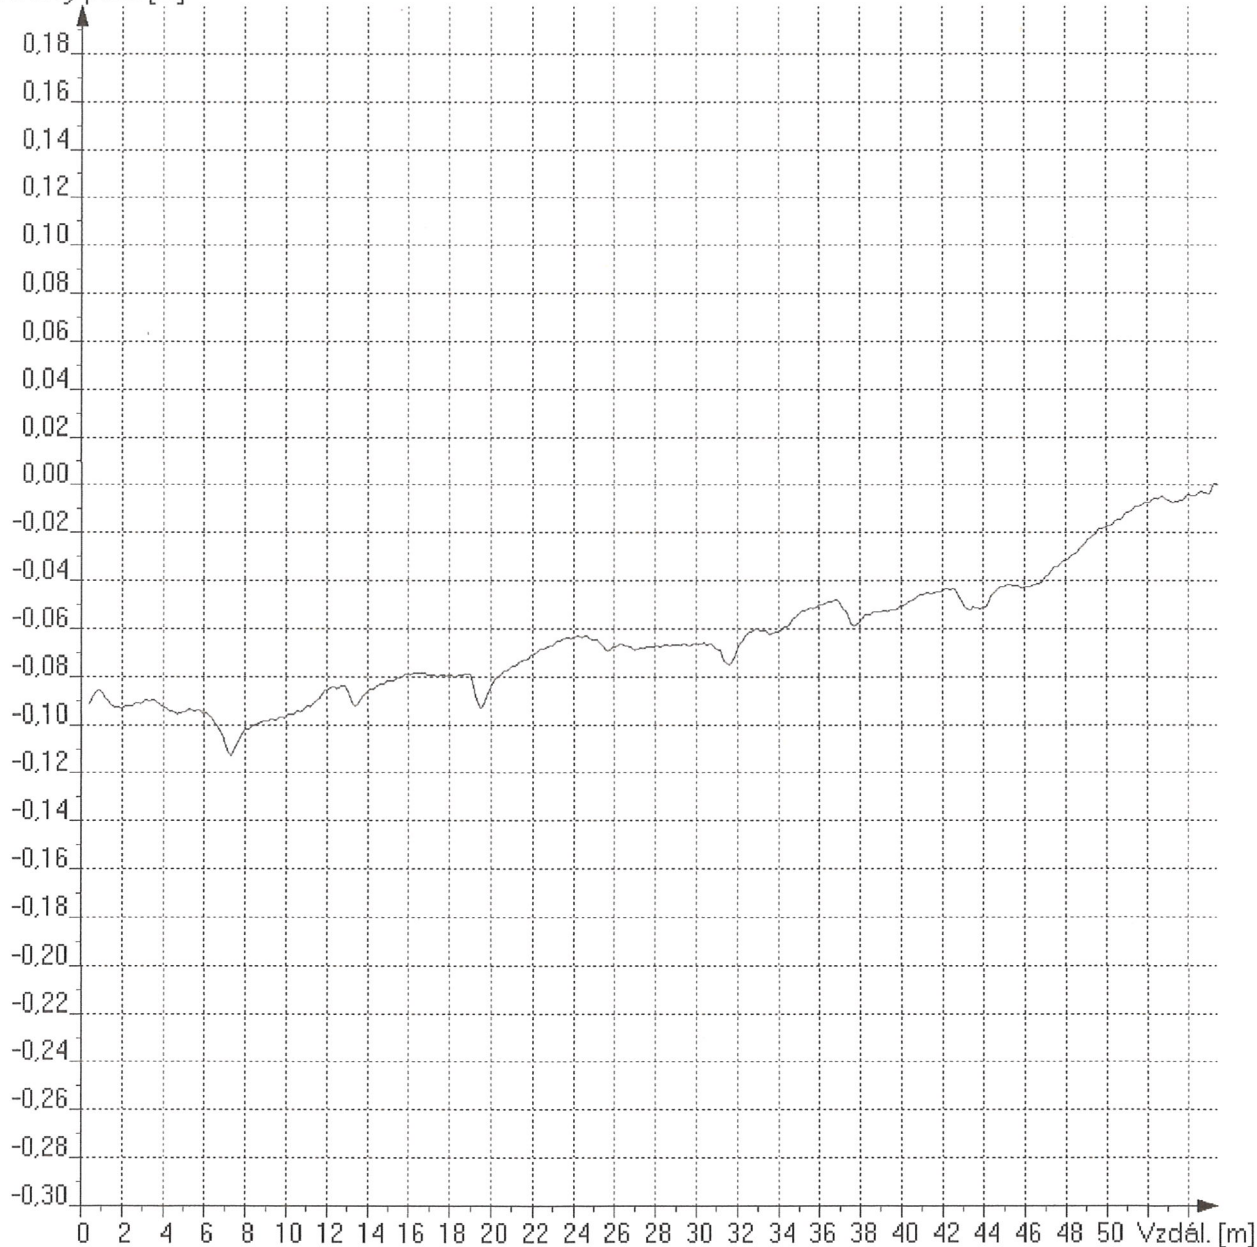
Kanalizační systém

KR

Datum

29.08.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek

KŠd31 - KŠd30

Horní Šachta

Spodní Šachta

Směr prohlídky

KŠd31

KŠd30

ve smeru toku

Číslo prohlídky

5

Datum prohlídky 10.09.2018

Videopásy

Videos.-zacátek 00:00:00

Videos.-konec 00:00:10

Duvod insp.

Druh monitor. Optická prohlídka

Č. kanálu

Rok výroby

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 1.000 mm

Šířka (DN) 1.000 mm

Délka trubky

Délka úseku 50,10 m

Délka prohlídky 50,10 m

Místo

Doména

Ulice

Vlastník

Operátor

Přítomen

Poloha

Kanalizační

systém

Materiál

Vnitřní ochrana

Poznámka

Komentář

kmenových dat

Priemyselný park

Nitra

S.Kozár, N. Michalčík

Dešťová kanalizace

Polyvinylchlorid

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd31
	00:00:10	50,10	EH		Konec úseku; KŠd30

Foto	Video	Vzdál./mŠtáv	Popis
		KŠd31	
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd31
00:00:10		50.10 EH	Konec úseku; KŠd30
		KŠd30	

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd31 - KŠd30

Horní šachta

KŠd31

Spodní šachta

KŠd30

Délka prohlídky 50,10 m

Směr prohlídky ve smeru toku

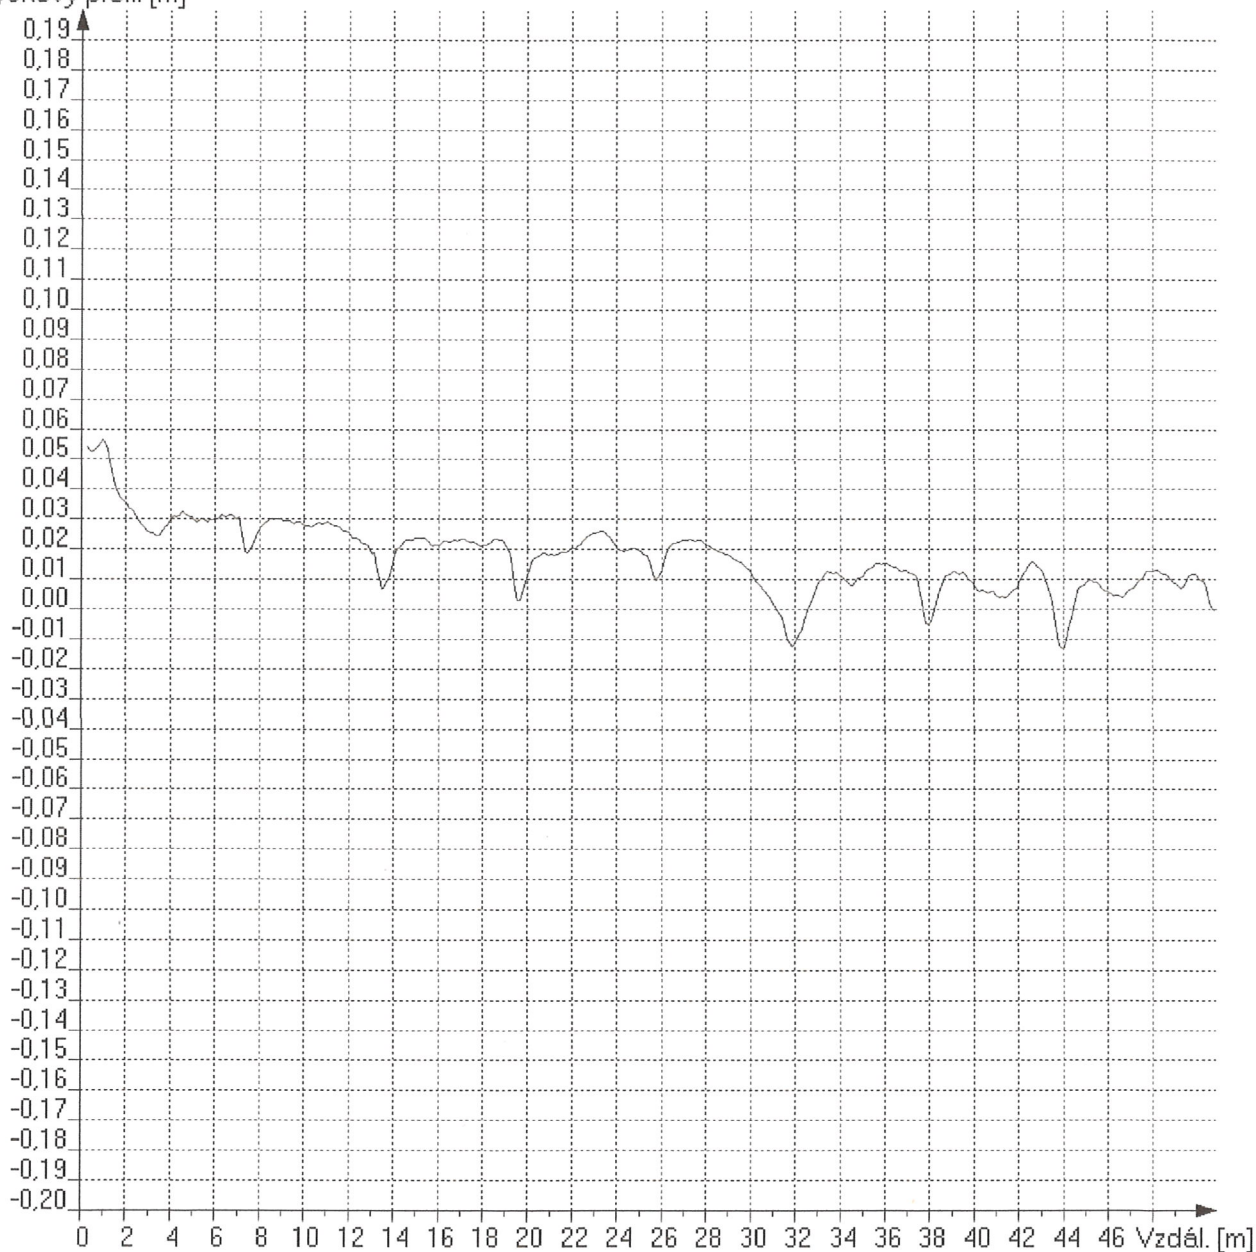
Číslo prohlídky 5

Délka úseku 50,10 m

Kanalizační systém KR

Datum 10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd30	Číslo prohlídky	6
KŠd30 - KŠd29	Spodní Šachta	KŠd29	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	ve smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační systém	Dešťová kanalizace
Výška 1.000 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Šířka (DN) 1.000 mm	Vnitřní ochrana	
Délka trubky	Poznámka	
Délka úseku 54,60 m	Komentář	
Délka prohlídky 54,60 m	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd30
	00:00:10	54,60	EH		Konec úseku; KŠd29

Foto	Video	Vzdál./mŠtáv	Popis
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd30
00:00:10		54.60 EH	Konec úseku; KŠd29

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd30 - KŠd29

Horní šachta

KŠd30

Spodní šachta

KŠd29

Délka prohlídky

54,60 m

Směr prohlídky

ve smeru toku

Číslo prohlídky

6

Délka úseku

54,60 m

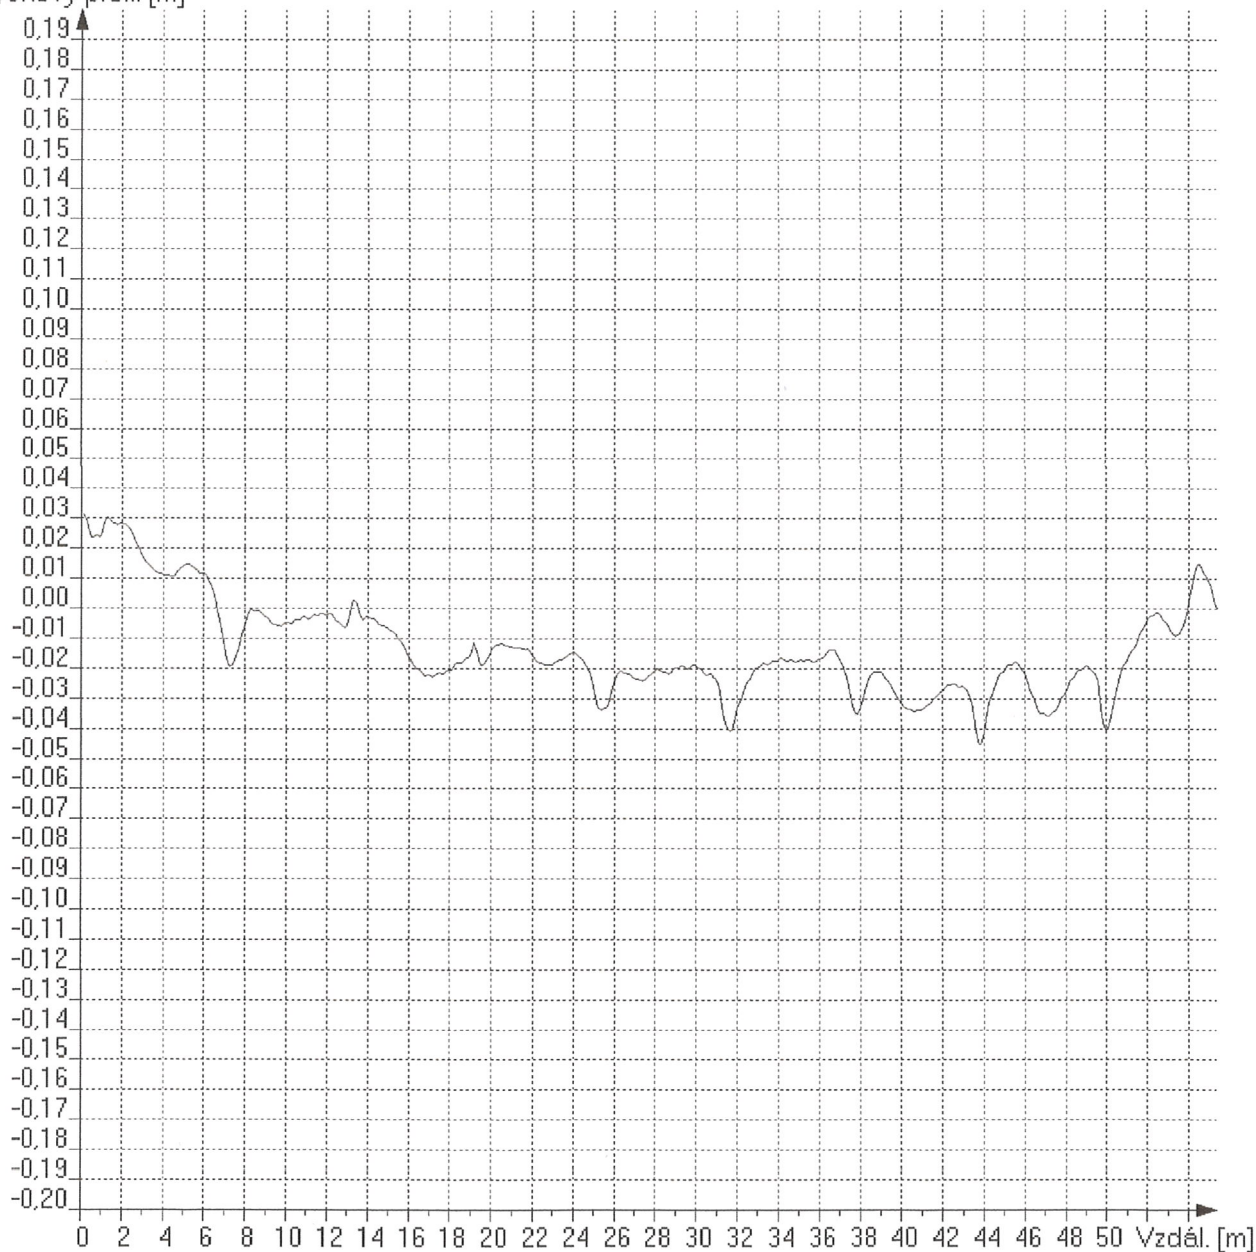
Kanalizační systém

KR

Datum

10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd29	Číslo prohlídky	7
KŠd29 - KŠd12	Spodní Šachta	KŠd12	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	ve smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor.	Operátor	S.Kozár, D.Kandráč
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu	Kanalizační	Dešťová kanalizace
Výška	systém	
Šířka (DN)	Materiál	Polyvinylchlorid
Délka trubky	Vnitřní ochrana	
Délka úseku	Poznámka	
Délka prohlídky	Komentář	
	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd29
	00:00:10	50,20	EH		Konec úseku; KŠd12

Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd29	Císlo prohlídky	7
KŠd29 - KŠd12	Spodní Šachta	KŠd12	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	ve smeru toku		

Videopáska		Č. kanálu	
Tvar profilu	Kruhový profil	Místo	Priemyselný park
Výška	1000 mm	Ulice	Nitra
Šírka (DN)	1000 mm	Operátor	S.Kozár, D.Kandráč
Délka trubky		Kanal. systém	Dešťová kanalizace
Délka úseku	50,20 m	Materiál	Polyvinylchlorid
Délka prohlídky	50,20 m	Vnitřní ochrana	

Merítko 1/ 380 Zobrazení ve smeru inspekce Strana grafiky 1

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
				KŠd29
	00:00:00	0.00	HA	Začátek úseku; KŠd29
	00:00:10	50.20	EH	Konec úseku; KŠd12
				KŠd12

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd29 - KŠd12

Horní šachta

KŠd29

Spodní šachta

KŠd12

Délka prohlídky 50,20 m

Směr prohlídky ve smeru toku

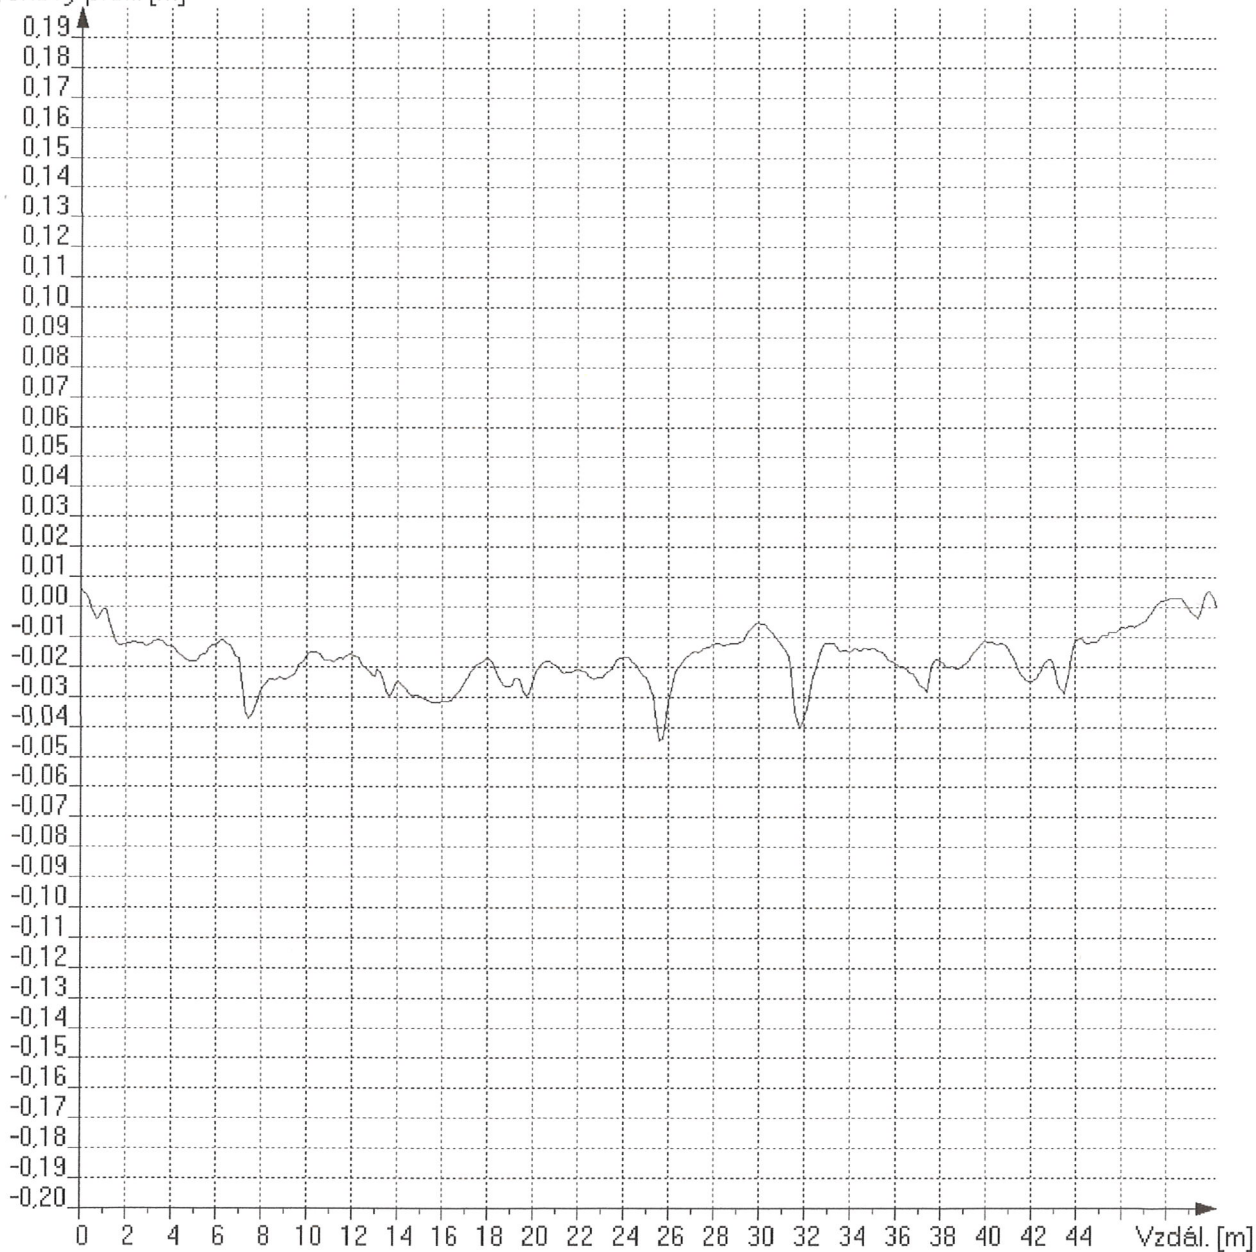
Číslo prohlídky 7

Délka úseku 50,20 m

Kanalizační systém KR

Datum 10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

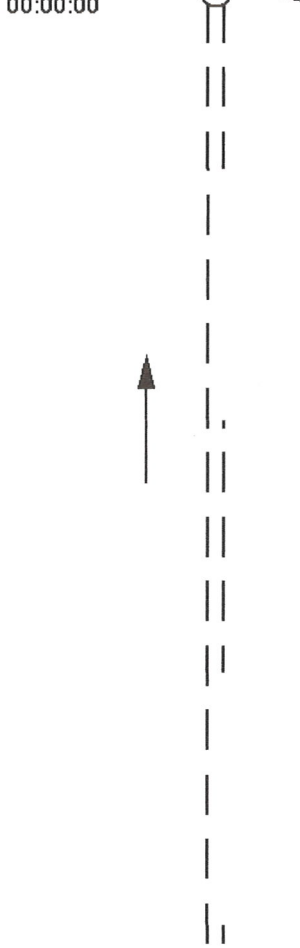
TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd28	Číslo prohlídky	8
KŠd32 - KŠd28	Spodní Šachta	KŠd32	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační systém	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Šířka (DN) 500 mm	Vnitřní ochrana	
Délka trubky	Poznámka	
Délka úseku 10,00 m	Komentář	
Délka prohlídky 10,00 m	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd32
	00:00:10	10,00	EH		Konec úseku; KŠd28

Foto	Video	Vzdál./mŠtáv	Popis
KŠd32			
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd32
00:00:10		10.00 EH	Konec úseku; KŠd28
KŠd28			

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd32 - KŠd28

Horní šachta

KŠd28

Spodní šachta

KŠd32

Délka prohlídky

10,00 m

Směr prohlídky

proti smeru toku

Císlo prohlídky

8

Délka úseku

10,00 m

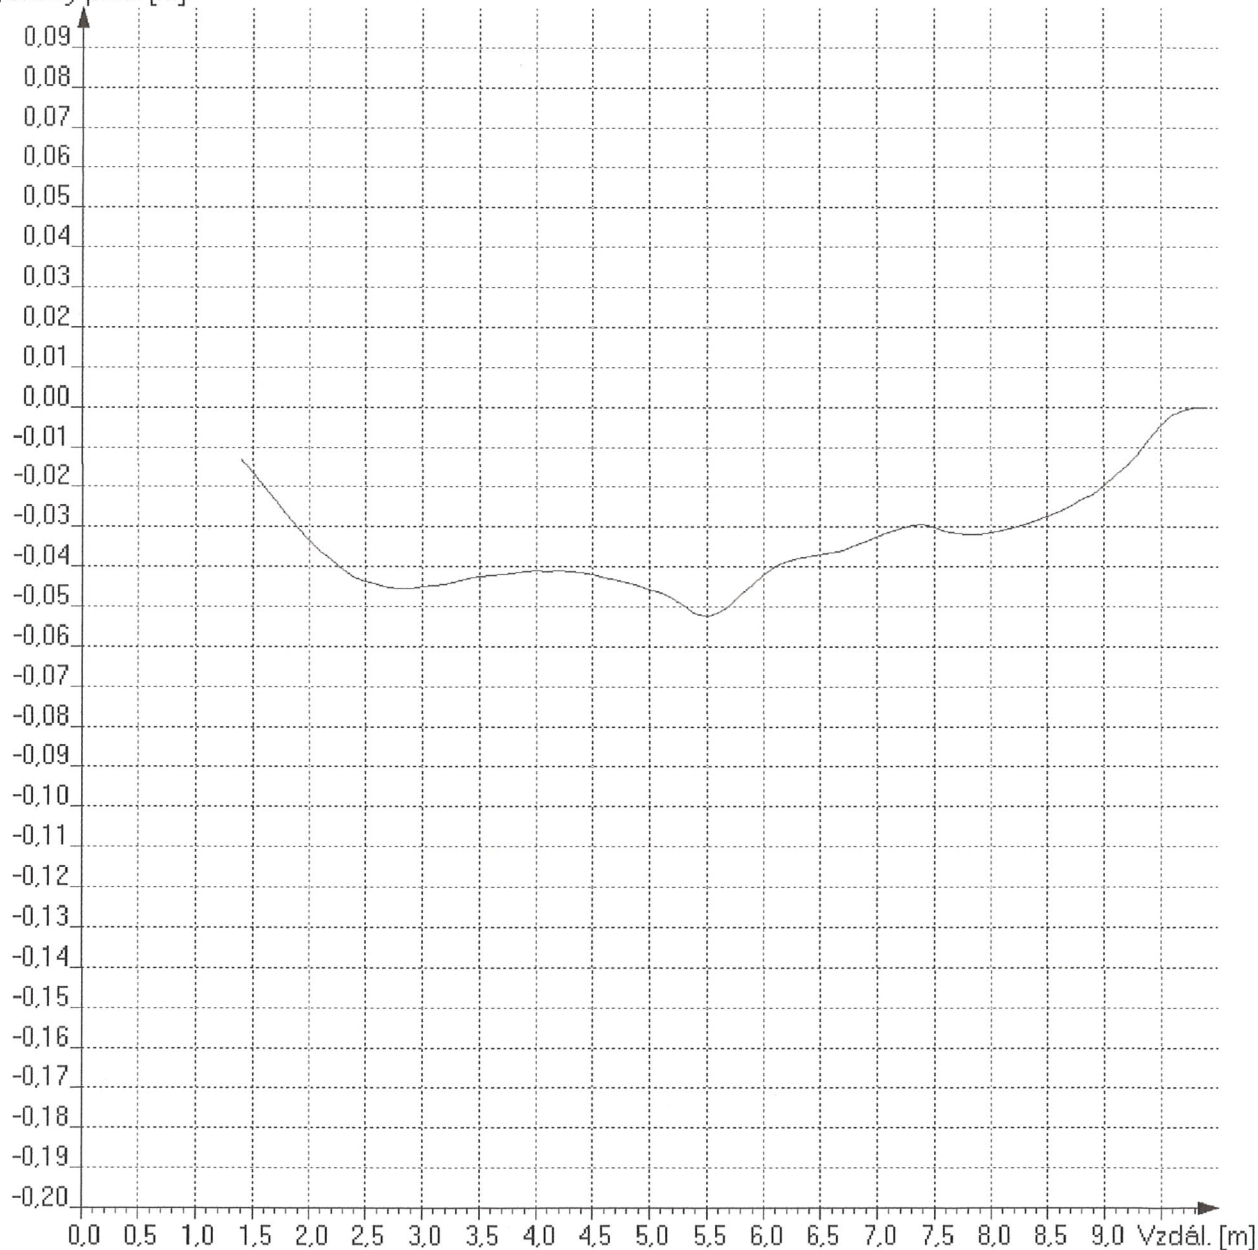
Kanalizační systém

KR

Datum

10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd36	Číslo prohlídky	9
KŠd32 - KŠd36	Spodní Šachta	KŠd32	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační systém	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Šířka (DN) 500 mm	Vnitřní ochrana	
Délka trubky	Poznámka	
Délka úseku 20,00 m	Komentář	
Délka prohlídky 20,00 m	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd32
	00:00:10	20,00	EH		Konec úseku; KŠd36

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
		00:00:00	0.00 HA	Začátek úseku; KŠd32
		00:00:10	20.00 EH	Konec úseku; KŠd36

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

výpracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornení spádu

Úsek

KŠd32 - KŠd36

Horní šachta

KŠd36

Spodní šachta

KŠd32

Délka prohlídky

20,00 m

Směr prohlídky

proti smeru toku

Číslo prohlídky

9

Délka úseku

20,00 m

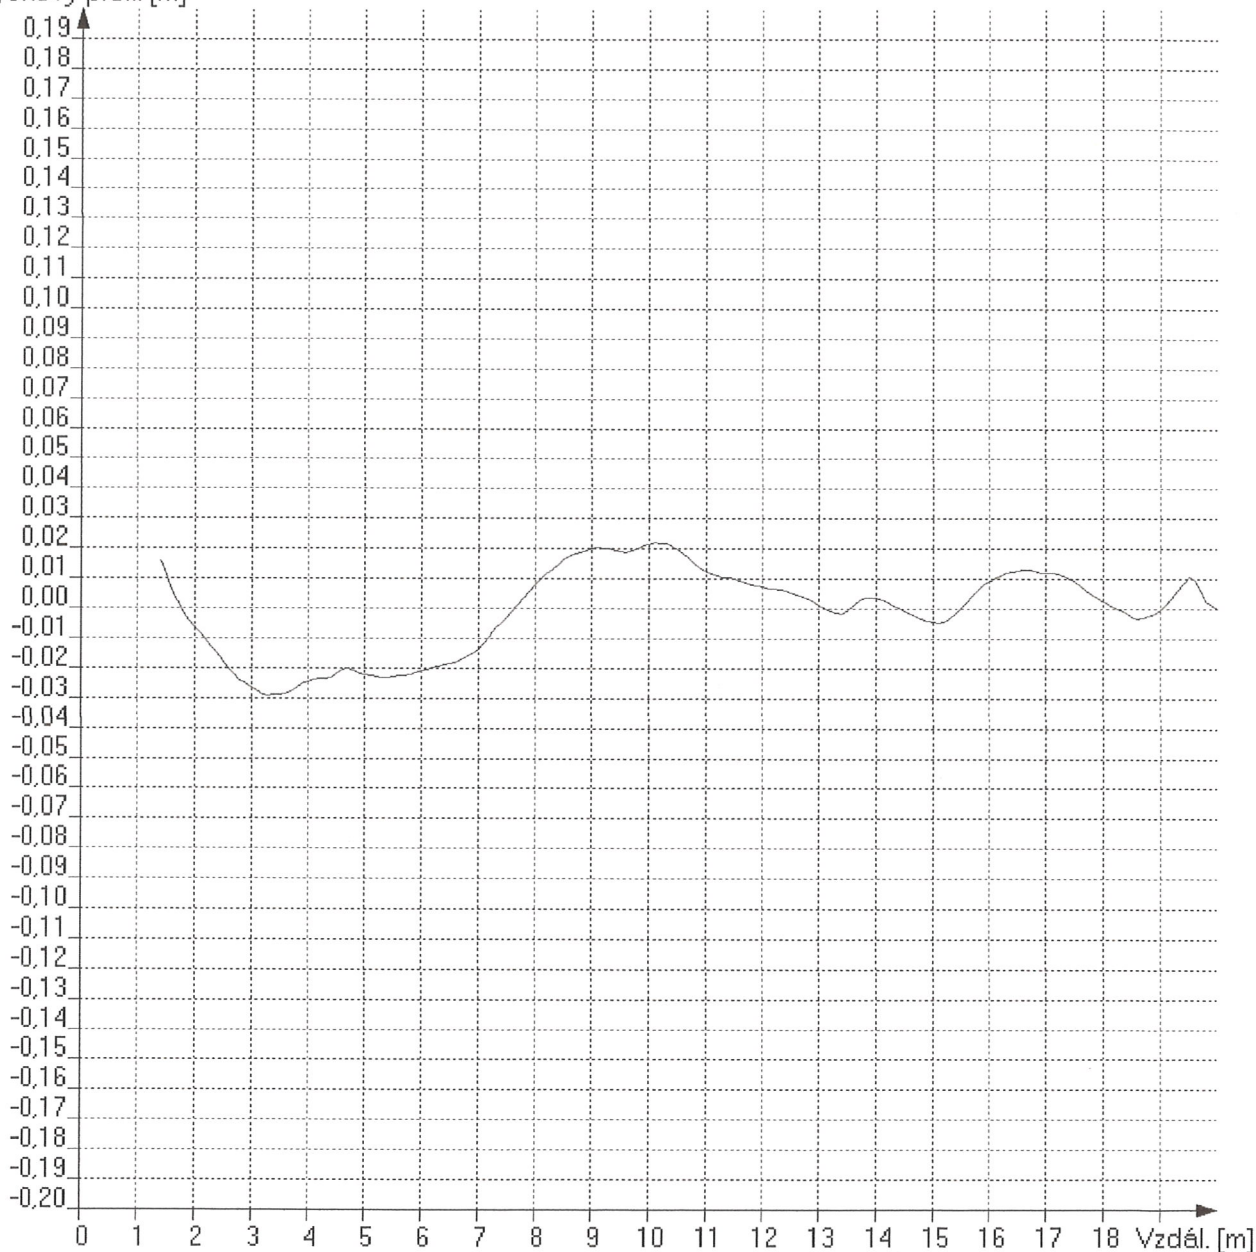
Kanalizační systém

KR

Datum

10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.


Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd35	Číslo prohlídky	10
KŠd31 - KŠd35	Spodní Šachta	KŠd31	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační systém	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Šířka (DN) 500 mm	Vnitřní ochrana	
Délka trubky	Poznámka	
Délka úseku 20,00 m	Komentář	
Délka prohlídky 20,00 m	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd31
	00:00:10	20,00	EH		Konec úseku; KŠd35

Foto	Video	Vzdál./mŠtáv	Popis
KŠd31			
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd31
00:00:10		20.00 EH	Konec úseku; KŠd35
KŠd35			

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO[®]

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd31 - KŠd35

Horní šachta

KŠd35

Spodní šachta

KŠd31

Délka prohlídky

20,00 m

Směr prohlídky

proti smeru toku

Číslo prohlídky

10

Délka úseku

20,00 m

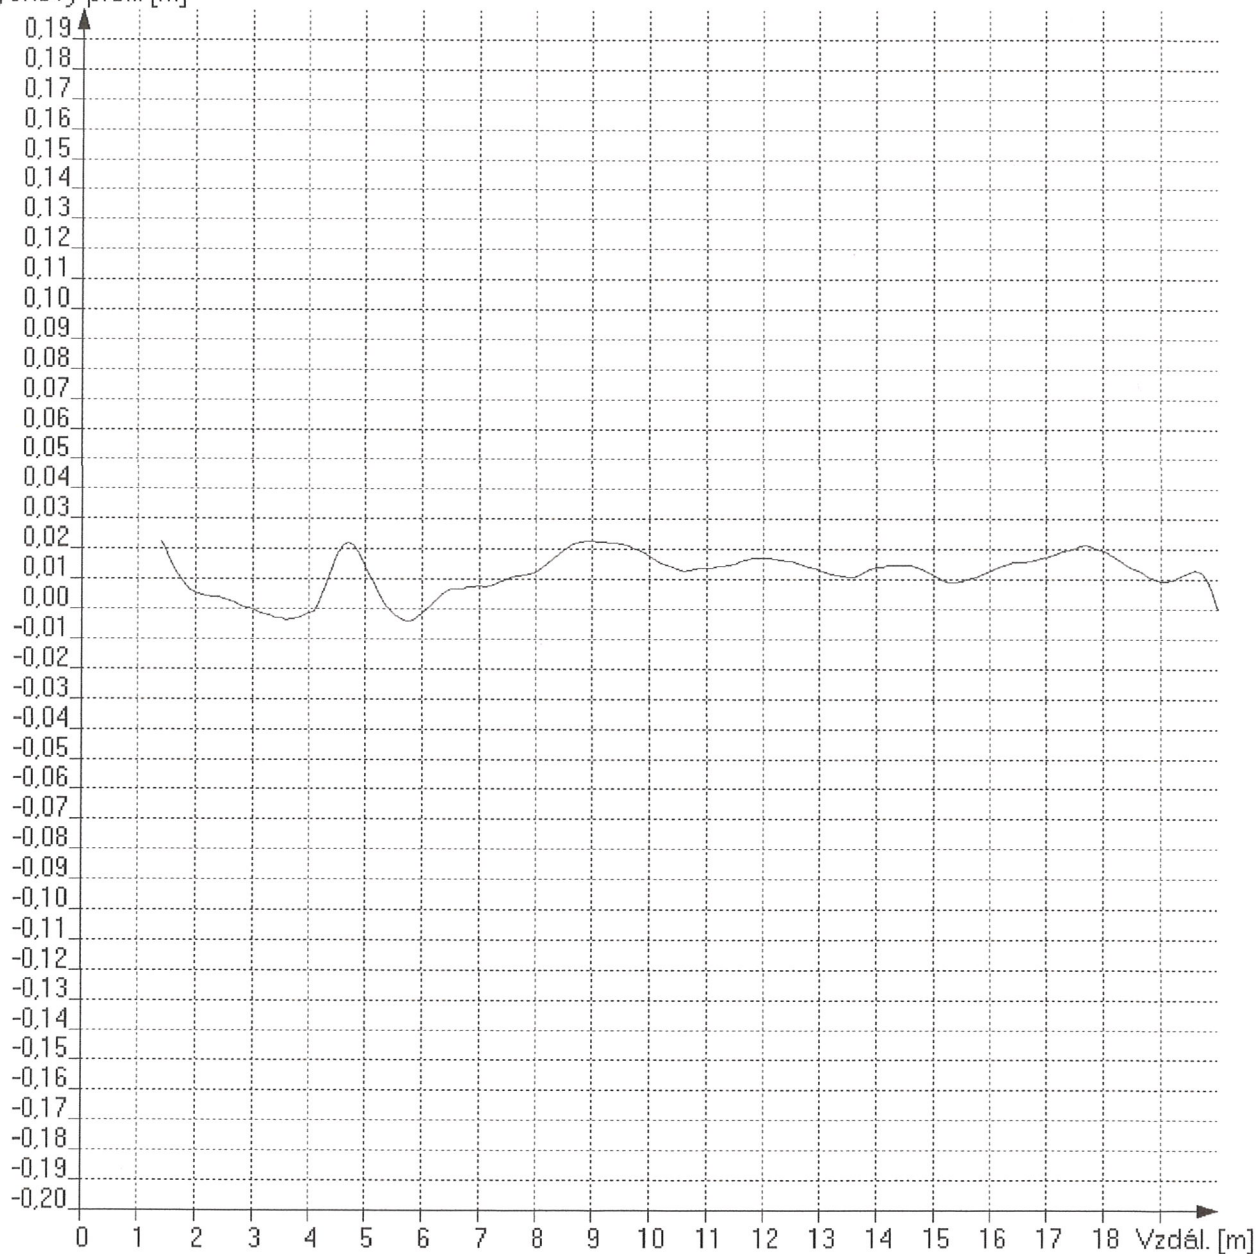
Kanalizační systém

KR

Datum

10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd27	Číslo prohlídky	11
KŠd31 - KŠd27	Spodní Šachta	KŠd31	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	systém	
Šířka (DN) 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Délka trubky	Vnitřní ochrana	
Délka úseku 10,00 m	Poznámka	
Délka prohlídky 10,00 m	Komentář	
	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd31
	00:00:10	10,00	EH		Konec úseku; KŠd27

Foto	Video	Vzdál./mŠtáv	Popis
		KŠd31	
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd31
00:00:10		10.00 EH	Konec úseku; KŠd27
		KŠd27	

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd31 - KŠd27

Horní šachta

KŠd27

Spodní šachta

KŠd31

Délka prohlídky 10,00 m

Směr prohlídky proti smeru toku

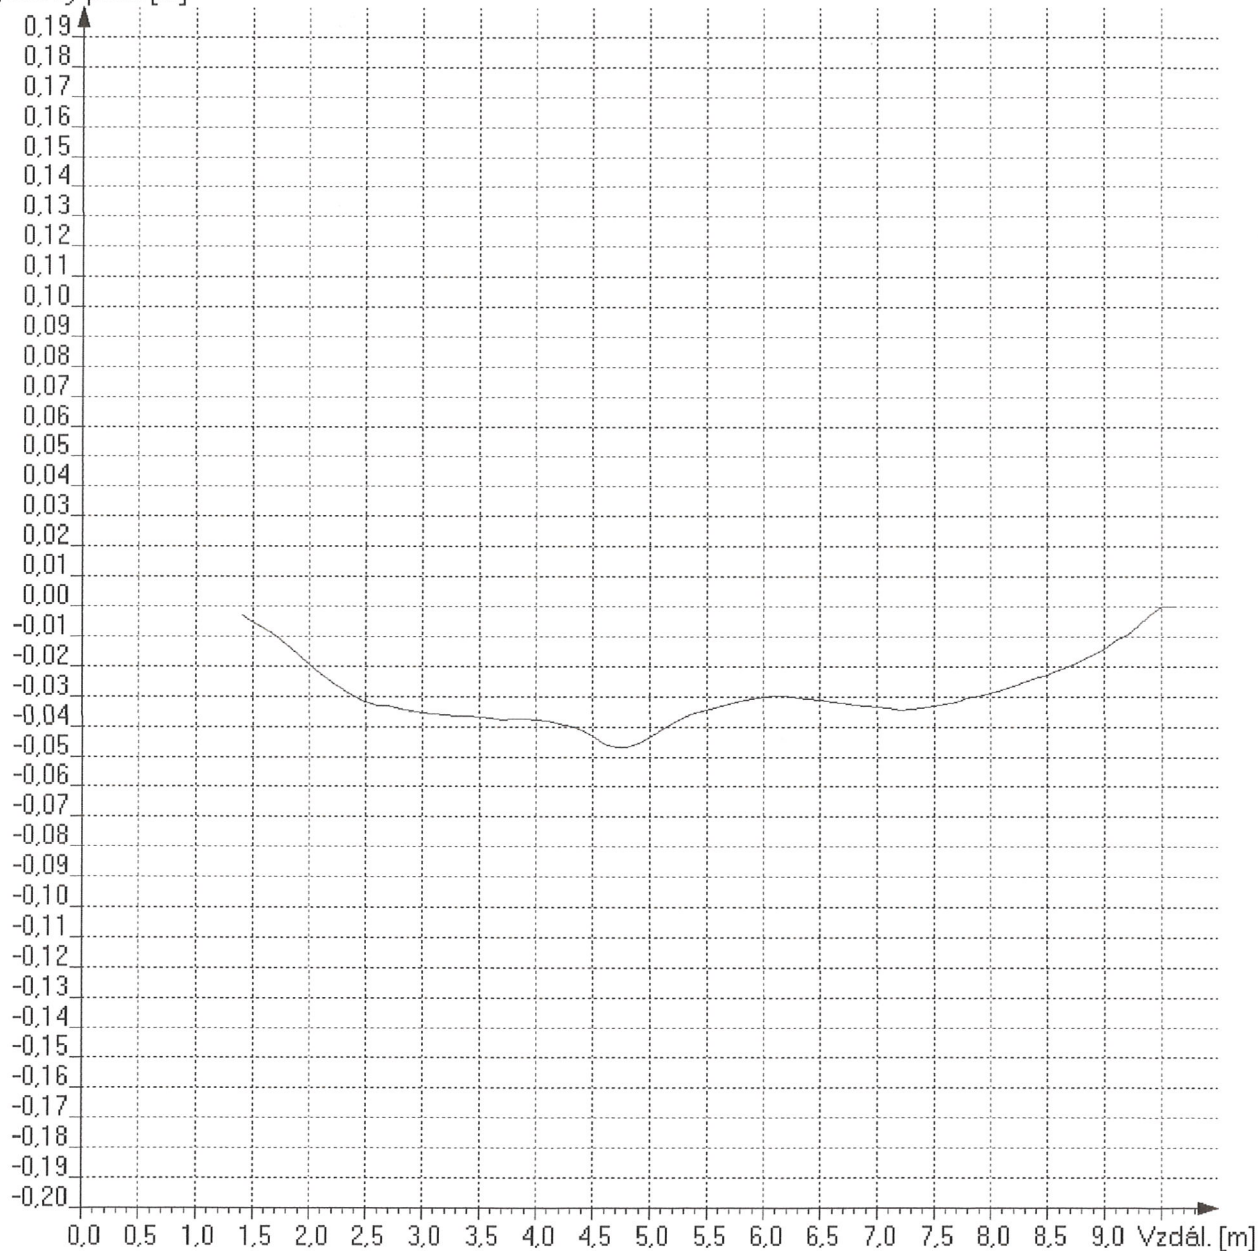
Číslo prohlídky 11

Délka úseku 10,00 m

Kanalizační systém KR

Datum 10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd34	Číslo prohlídky	12
KŠd30 - KŠd34	Spodní Šachta	KŠd30	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	systém	
Šířka (DN) 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Délka trubky	Vnitřní ochrana	
Délka úseku 20,00 m	Poznámka	
Délka prohlídky 20,00 m	Komentář	
	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd30
	00:00:10	20,00	EH		Konec úseku; KŠd34

[illegible]

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd30 - KŠd34

Horní šachta

Spodní šachta

KŠd34

KŠd30

Délka prohlídky 20,00 m

Směr prohlídky proti smeru toku

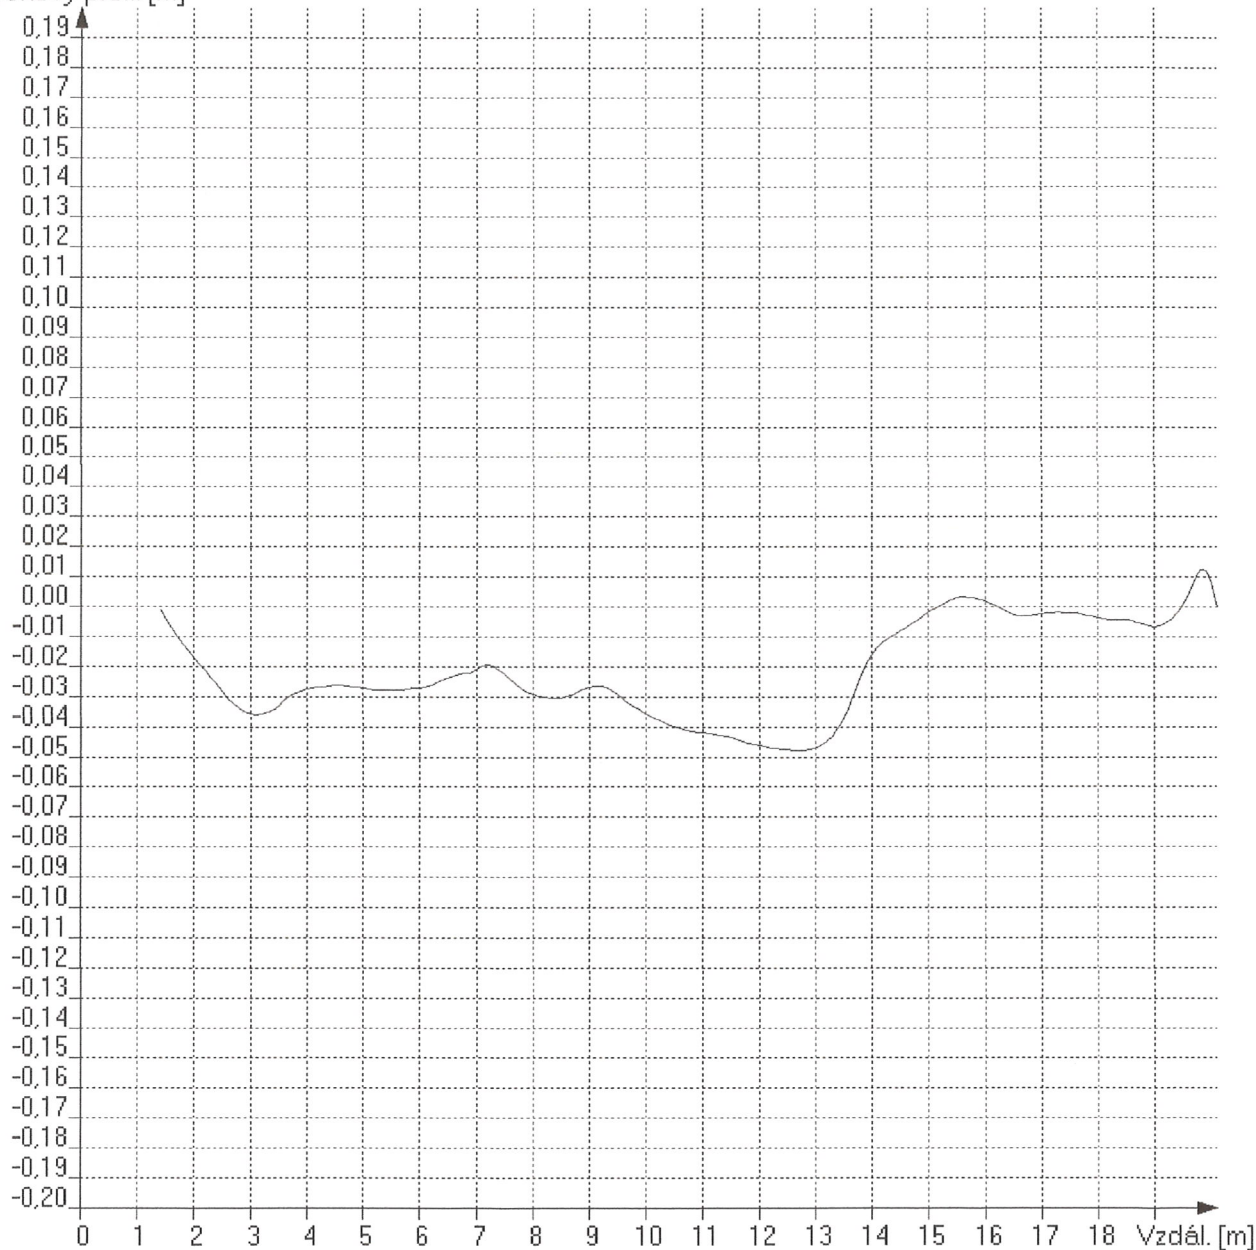
Číslo prohlídky 12

Délka úseku 20,00 m

Kanalizační systém KR

Datum 10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd26	Číslo prohlídky	13
KŠd30 - KŠd26	Spodní Šachta	KŠd30	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	systém	
Šířka (DN) 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Délka trubky	Vnitřní ochrana	
Délka úseku 10,00 m	Poznámka	
Délka prohlídky 10,00 m	Komentář	
	kmenových dat	


Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd30
	00:00:10	10,00	EH		Konec úseku; KŠd26

Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd26	Císlo prohlídky	13
KŠd30 - KŠd26	Spodní Šachta	KŠd30	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopáska	Č. kanálu
Tvar profilu	Místo
Výška	Ulice
Šírka (DN)	Operátor
Délka trubky	Kanal. systém
Délka úseku	Materiál
Délka prohlídky	Vnitřní ochrana

Merítko 1/ 75 Zobrazení ve smeru inspekce Strana grafiky 1

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
KŠd30				
00:00:00		0.00 HA	Začátek úseku; KŠd30	
00:00:10		10.00 EH		Konec úseku; KŠd26
KŠd26				

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

výpracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornení spádu

Úsek

KŠd30 - KŠd26

Horní šachta

KŠd26

Spodní šachta

KŠd30

Délka prohlídky

10,00 m

Směr prohlídky

proti smeru toku

Císlo prohlídky

13

Délka úseku

10,00 m

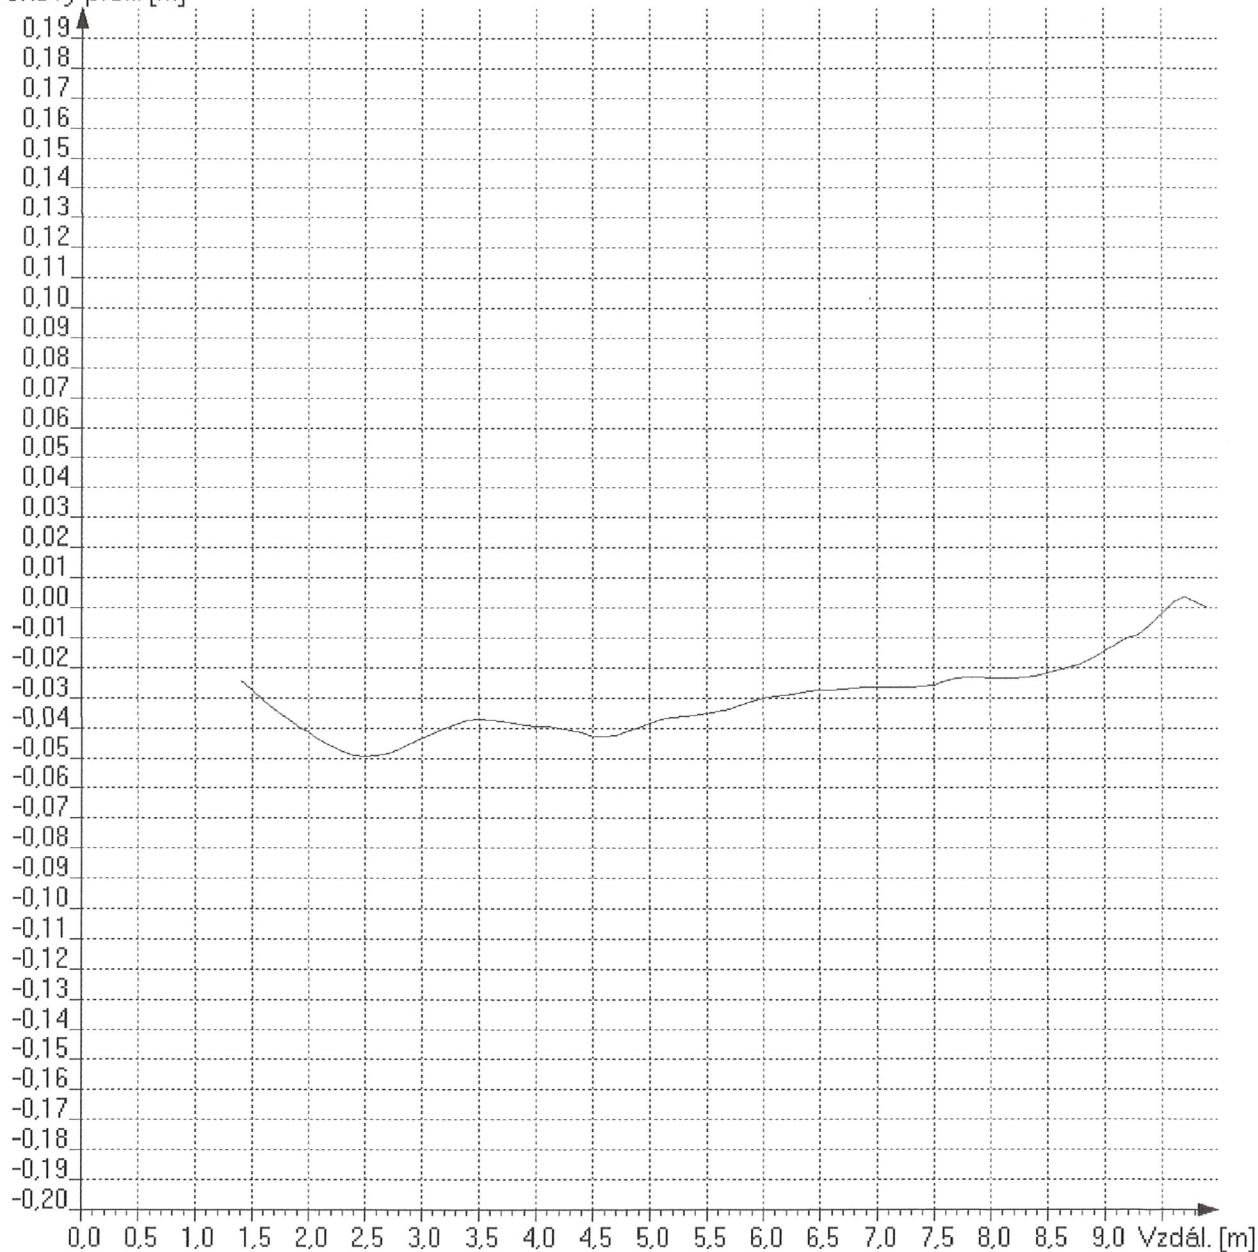
Kanalizační systém

KR

Datum

10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek

KŠd11 - KŠd25

Horní Šachta

Spodní Šachta

Směr prohlídky

KŠd25

KŠd11

proti smeru toku

Číslo prohlídky

14

Datum prohlídky 10.09.2018

Videopásky

Videos.-zacátek 00:00:00

Videos.-konec 00:00:30

Duvod insp.

Druh monitor. Optická prohlídka

Č. kanálu

Rok výroby

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 1.000 mm

Šířka (DN) 1.000 mm

Délka trubky

Délka úseku 50,20 m

Délka prohlídky 50,20 m

Místo

Doména

Ulice

Vlastník

Operátor

Přítomen

Poloha

Kanalizační

systém

Materiál

Vnitřní ochrana

Poznámka

Komentář

kmenových dat

Priemyselný park

Nitra

S.Kozár, N. Michalčík

Dešťová kanalizace

Polyvinylchlorid

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd11
	00:00:10	16,40	A--R		Pos: 2; Odbočka, Vpravo
	00:00:20	45,60	A--R		Pos: 2; Odbočka, Vpravo
	00:00:30	50,20	EH		Konec úseku; KŠd25

Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd25	Císlo prohlídky	14
KŠd11 - KŠd25	Spodní Šachta	KŠd11	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopáska	Č. kanálu
Tvar profilu	Místo
Výška	Ulice
Šírka (DN)	Operátor
Délka trubky	Kanal. systém
Délka úseku	Materiál
Délka prohlídky	Vnitřní ochrana

Merítko 1/ 380 Zobrazení ve smeru inspekce Strana grafiky 1

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	Popis
				KŠd11
	00:00:00	0.00	HA	Začátek úseku; KŠd11
	00:00:10	16.40	A--R	Poz: 2 - 0; Odbočka, Vpravo
	00:00:20	45.60	A--R	Poz: 2 - 0; Odbočka, Vpravo
	00:00:30	50.20	EH	Konec úseku; KŠd25
				KŠd25

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd11 - KŠd25

Horní šachta

KŠd25

Spodní šachta

KŠd11

Délka prohlídky 50,20 m

Směr prohlídky proti smeru toku

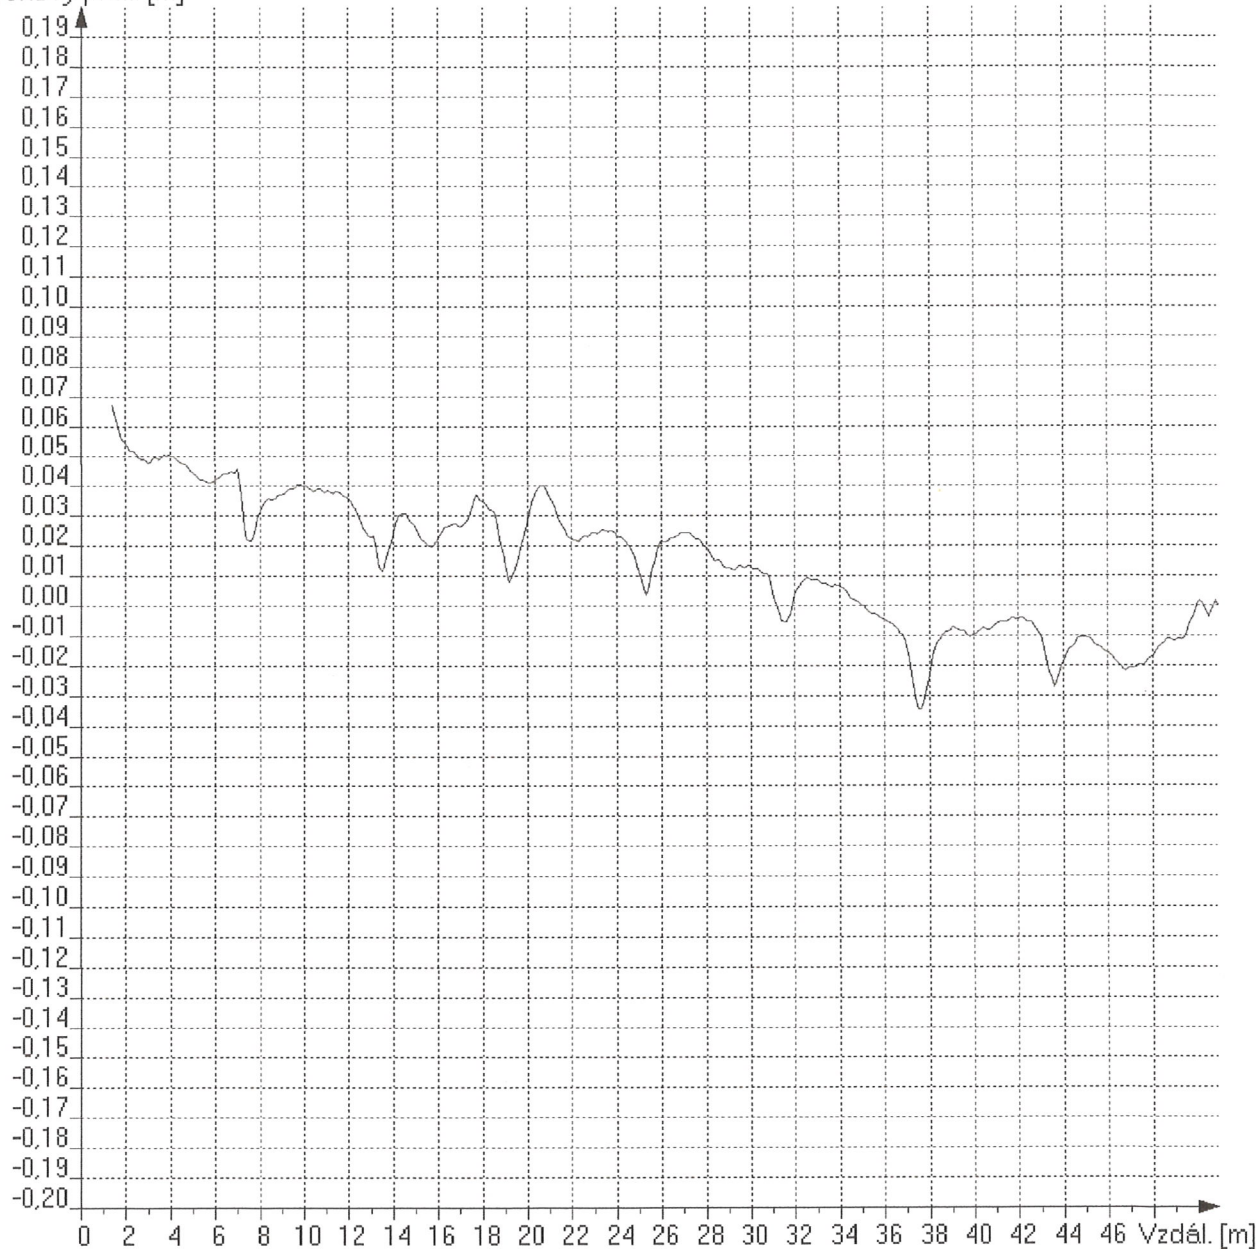
Číslo prohlídky 14

Délka úseku 50,20 m

Kanalizační systém KR

Datum 10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek	Horní Šachta	KŠd33	Číslo prohlídky	15
KŠd29 - KŠd33	Spodní Šachta	KŠd29	Datum prohlídky	10.09.2018
	Směr prohlídky	proti smeru toku		

Videopásy	Místo	Priemyselný park
Videos.-zacátek 00:00:00	Doména	
Videos.-konec 00:00:10	Ulice	Nitra
Duvod insp.	Vlastník	
Druh monitor. Optická prohlídka	Operátor	S.Kozár, N. Michalčík
Č. kanálu	Přítomen	
Rok výroby	Poloha	
Tvar profilu Kruhový profil	Kanalizační	Dešťová kanalizace
Výška 500 mm	systém	
Šířka (DN) 500 mm	Materiál	Polyvinylchlorid
Délka trubky	Vnitřní ochrana	
Délka úseku 20,00 m	Poznámka	
Délka prohlídky 20,00 m	Komentář	
	kmenových dat	

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd29
	00:00:10	20,00	EH		Konec úseku; KŠd33

Grafické zobrazení úseku

Úsek
KŠd29 - KŠd33Horní Šachta KŠd33
Spodní Šachta KŠd29
Směr prohlídky proti smeru tokuČíslo prohlídky 15
Datum prohlídky 10.09.2018**Videopáska**

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 500 mm

Šírka (DN) 500 mm

Délka trubky

Délka úseku 20,00 m

Délka prohlídky 20,00 m

Č. kanálu

Místo Priemyselný park

Ulice Nitra

Operátor S.Kozár, N. Michalčík

Kanal. systém Dešťová kanalizace

Materiál Polyvinylchlorid

Vnitřní ochrana

Merítko 1/ 151 Zobrazení ve smeru inspekce

Strana grafiky 1

Foto Video

Vzdál./nStav

Popis

KŠd29

00:00:00



0.00 HA

Začátek úseku; KŠd29

00:00:10



20.00 EH

Konec úseku; KŠd33

KŠd33

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd29 - KŠd33

Horní šachta

Spodní šachta

KŠd33

KŠd29

Délka prohlídky 20,00 m

Délka úseku 20,00 m

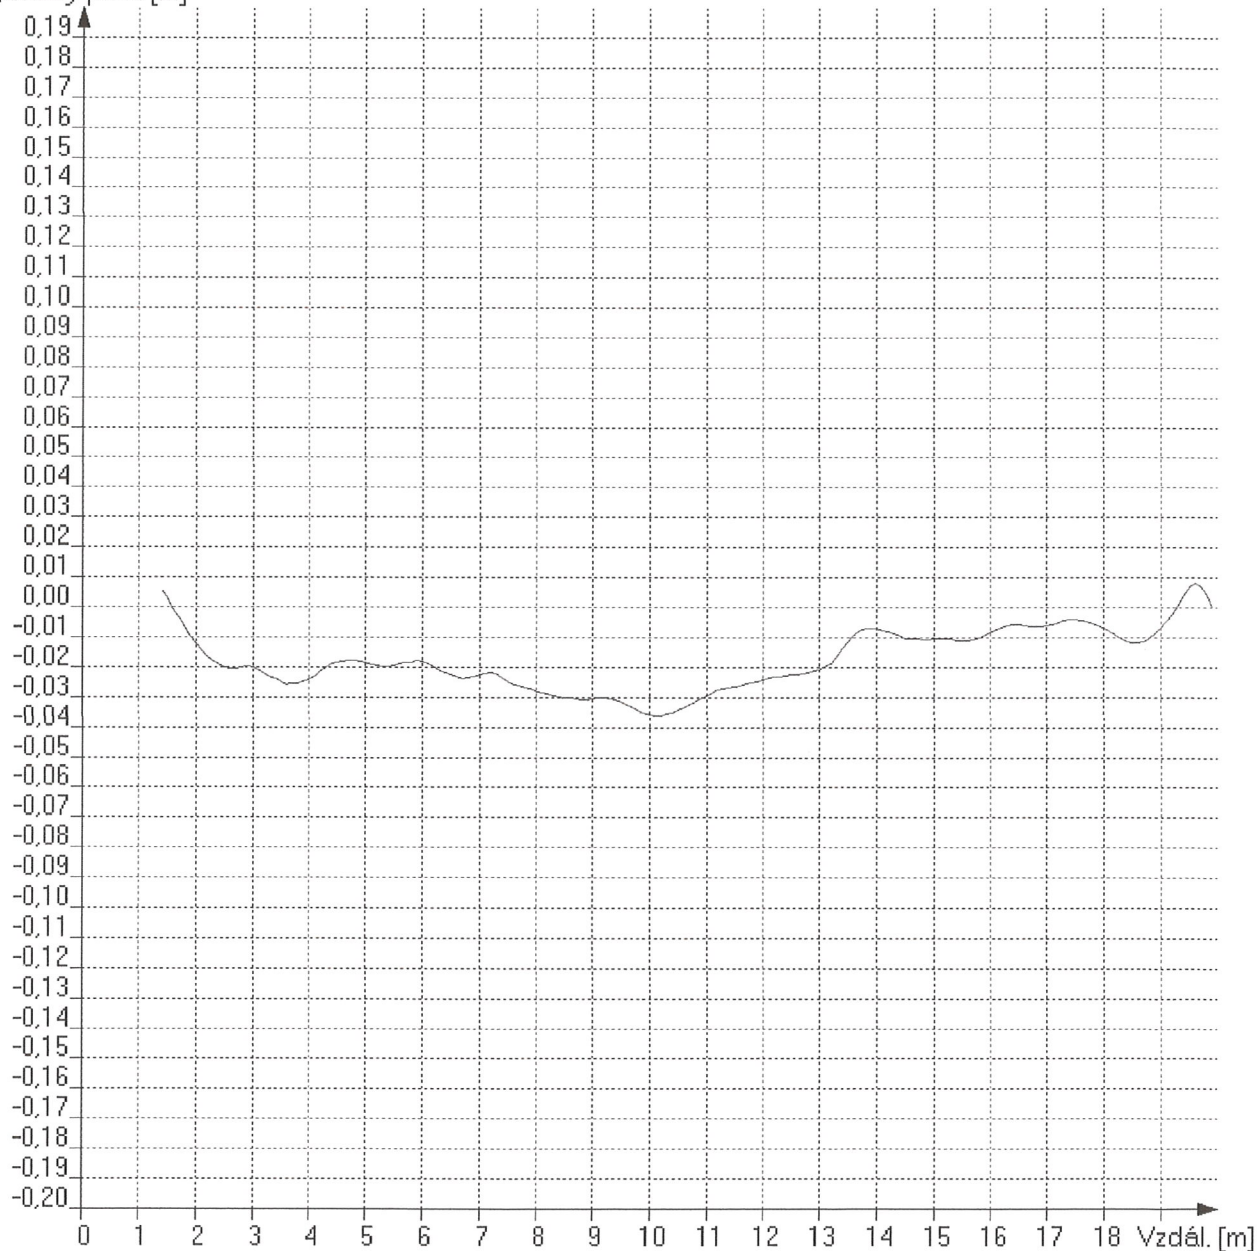
Směr prohlídky proti smeru toku

Kanalizační systém KR

Číslo prohlídky 15

Datum 10.09.2018

Výškový profil [m]



SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Zpráva o úseku

Úsek

KŠd29 - KŠd25

Horní Šachta

Spodní Šachta

Směr prohlídky

KŠd25

KŠd29

proti smeru toku

Číslo prohlídky

16

Datum prohlídky 10.09.2018

Videopásky

Videos.-zacátek 00:00:00

Videos.-konec 00:00:10

Duvod insp.

Druh monitor. Optická prohlídka

Č. kanálu

Rok výroby

Tvar profilu Kruhový profil

Výška 500 mm

Šířka (DN) 500 mm

Délka trubky

Délka úseku 10,00 m

Délka prohlídky 10,00 m

Místo

Doména

Ulice

Vlastník

Operátor

Přítomen

Poloha

Kanalizační

systém

Materiál

Vnitřní ochrana

Poznámka

Komentář

kmenových dat

Priemyselný park

Nitra

S.Kozár, N. Michalčík

Dešťová kanalizace

Polyvinylchlorid

Foto	Video	Vzdál./m	Kód	S	Popis
------	-------	----------	-----	---	-------

	00:00:00	0,00	HA		Začátek úseku; KŠd29
	00:00:10	10,00	EH		Konec úseku; KŠd25

Foto	Video	Vzdálenost KŠd29	Stav	Popis
	00:00:00	(+)	0.00 HA	Začátek úseku; KŠd29
		.		
		(+)	10.00 EH	Konec úseku; KŠd25

SEZAKO Trnava, s.r.o.

TV-Monitoring

Orešanská 11; 917 01 Trnava

tel., (fax): +421 33 534 40 30; dispečink: +421 910 998 573

vypracoval: Kozár +421 910 686 800

SEZAKO®

TRNAVA s.r.o.

Grafické znázornění spádu

Úsek

KŠd29 - KŠd25

Horní šachta

Spodní šachta

KŠd25

KŠd29

Délka prohlídky

10,00 m

Směr prohlídky

proti smeru toku

Císlo prohlídky

16

Délka úseku

10,00 m

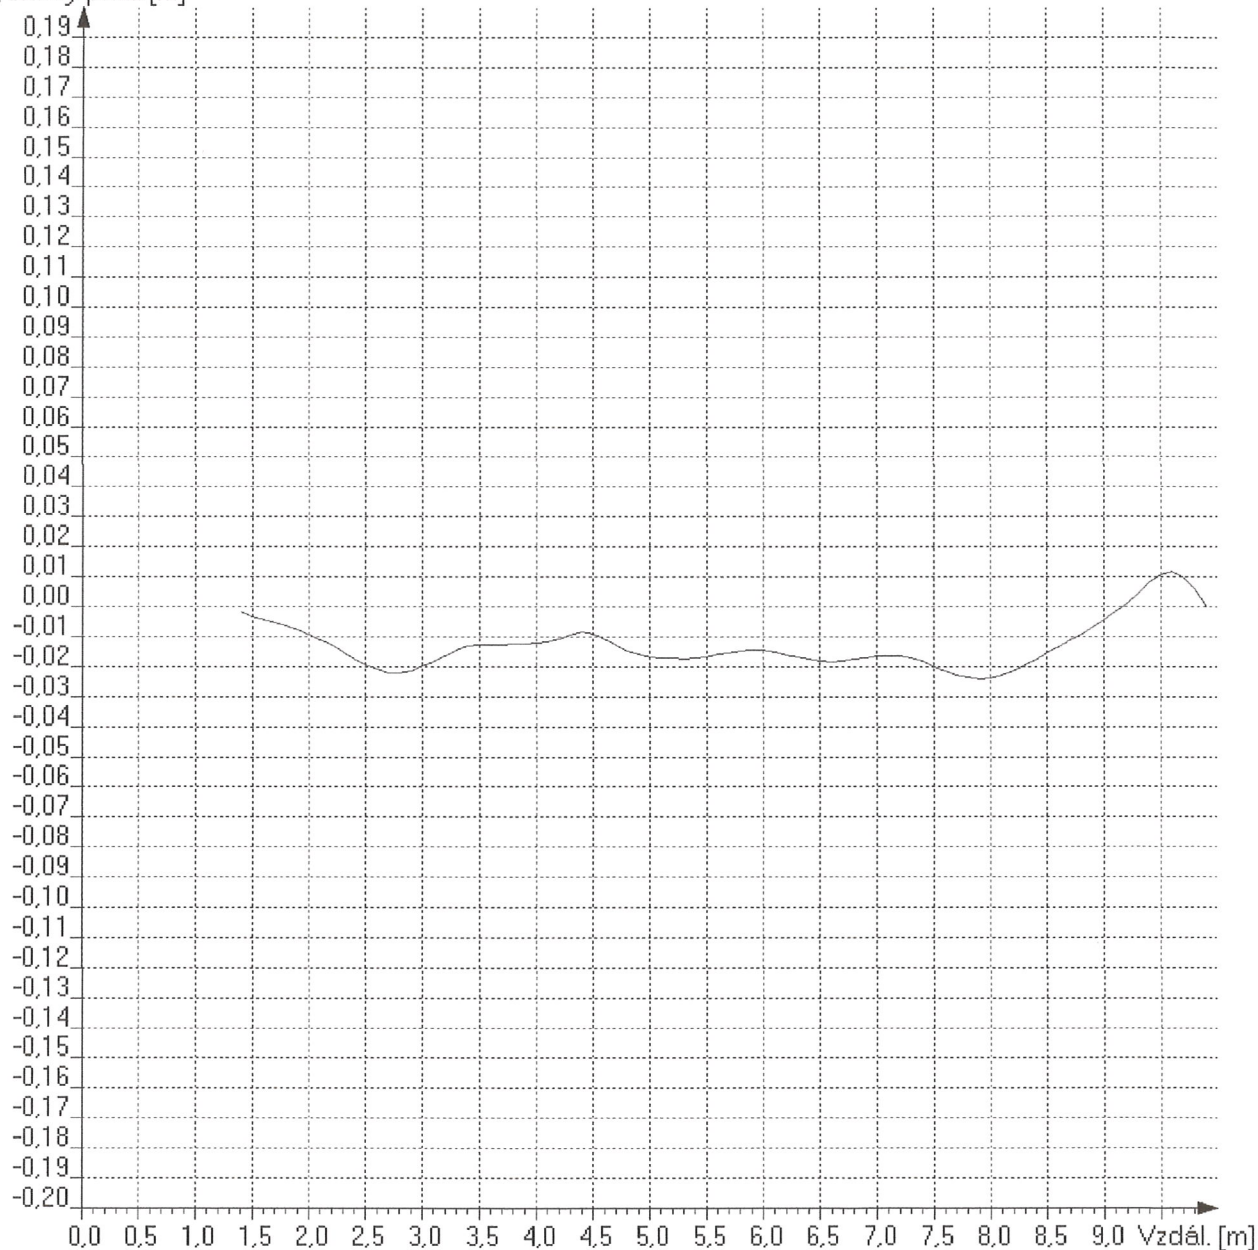
Kanalizační systém

KR

Datum

10.09.2018

Výškový profil [m]



Přípojky - statistika

31.07.2018 - 31.07.2018

Rozměr: 1000 mm / 1000 mm

Datum	Úsek	Ulice	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
31.07.2018	KSD13	SO 517	PE-polyetylen	48,10	1000 / 1000	0
31.07.2018	KSD33	SO 517	PE-polyetylen	54,30	1000 / 1000	0
31.07.2018	KSD34	SO 517	PE-polyetylen	50,10	1000 / 1000	0
31.07.2018	KSD35	SO 517	PE-polyetylen	53,50	1000 / 1000	0

Rozměry pro Rozměr: 1000 mm / 1000 mm

Počet	Úseky	4 ks	Součet délek	Úseky	206,00 m
	Inspekce	4 ks		Inspekce	206,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	16 ks			
	Fota	0 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	4 ks	Součet délek	Úseky	206,00 m
	Inspekce	4 ks		Inspekce	206,00 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	16 ks			
	Fota	0 ks			

Úseková protokol

Úsek KSD13

Horní šachta KSD33

Dolní šachta KSD13

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 48,10 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 1000 mm
Výška 1000 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 31.07.2018

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 48,10 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:07	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:03:14	10,60	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 1%
	00:07:28	41,10	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 1%
	00:09:08	48,10	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	KSD13	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD33	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Dolní šachta	KSD13		

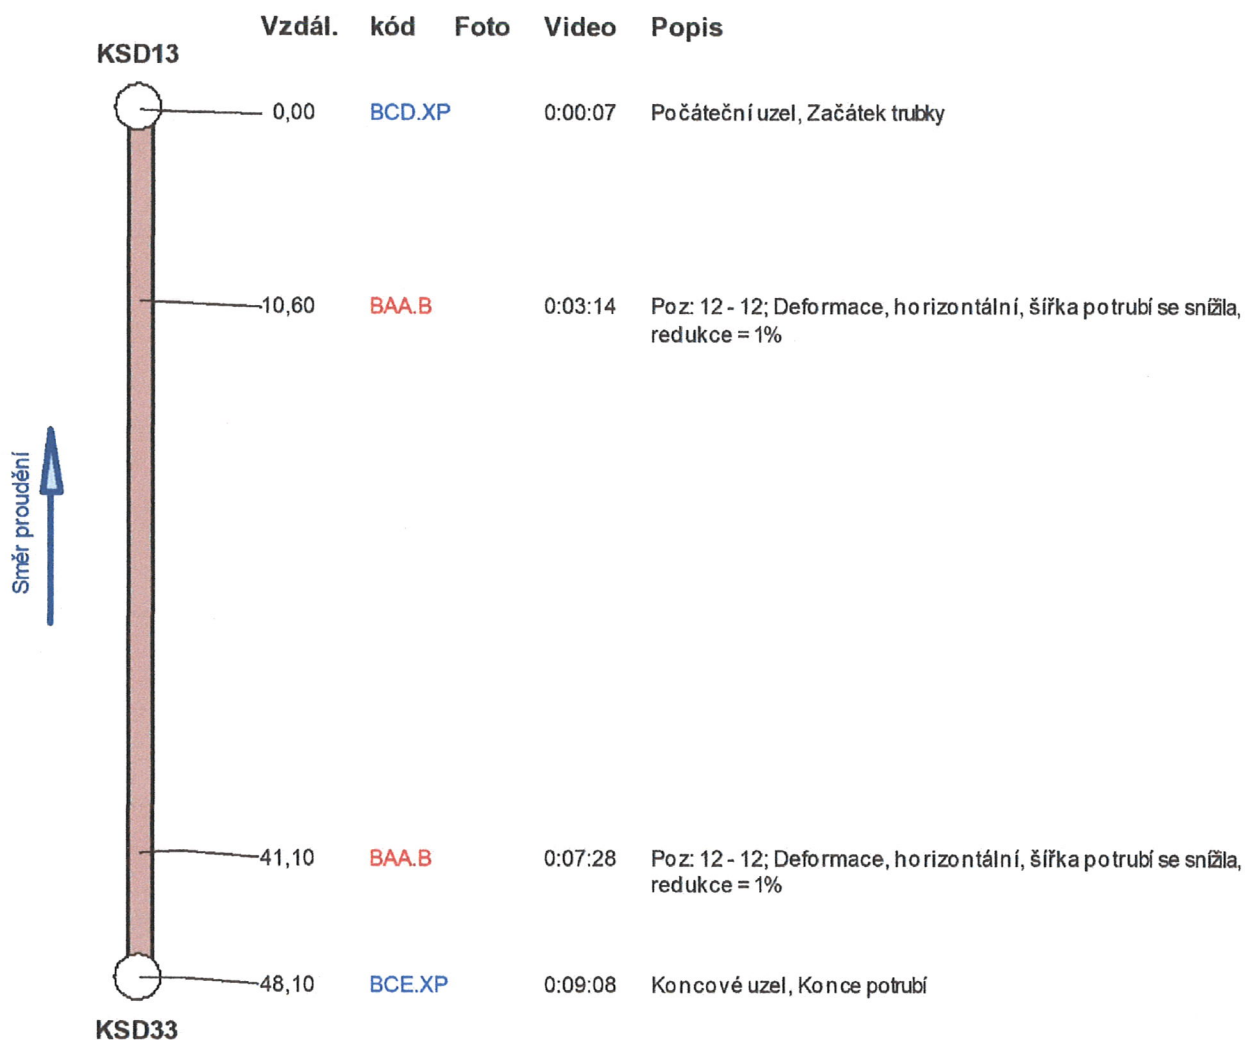
Kmenová data

Délka úseku	48,10 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	1000 / 1000

Inspekce

Insp. délka	48,10 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

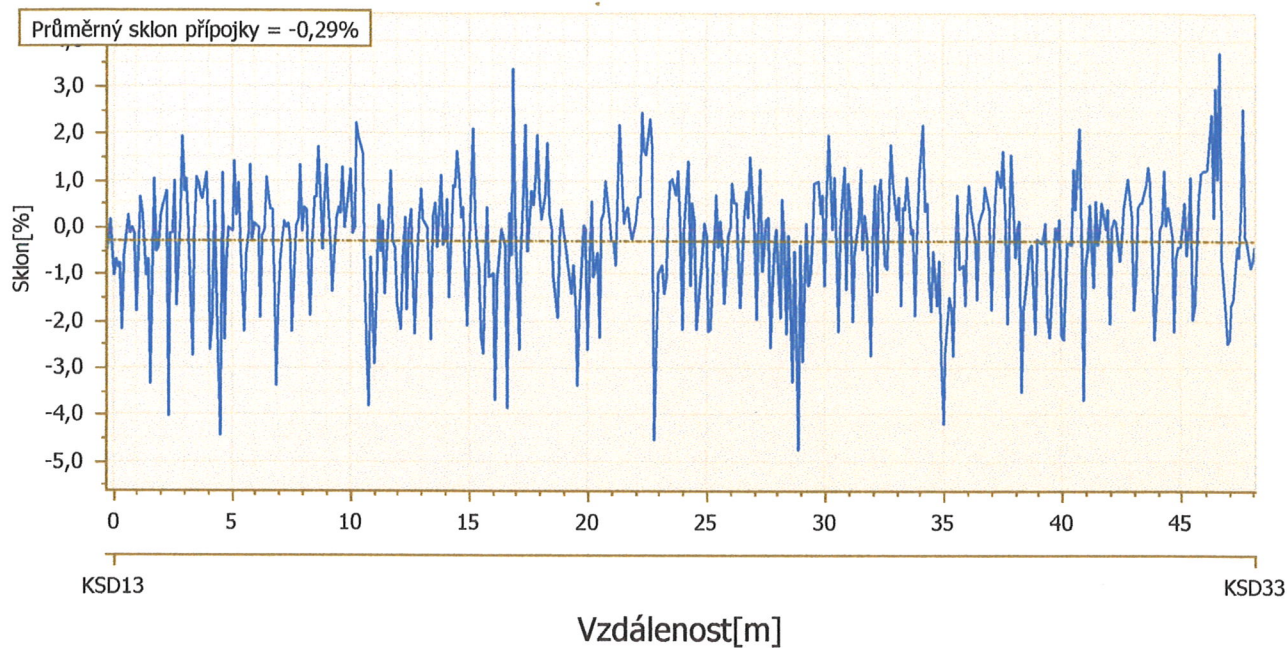
Směr pohledu: ve směru prohlídky



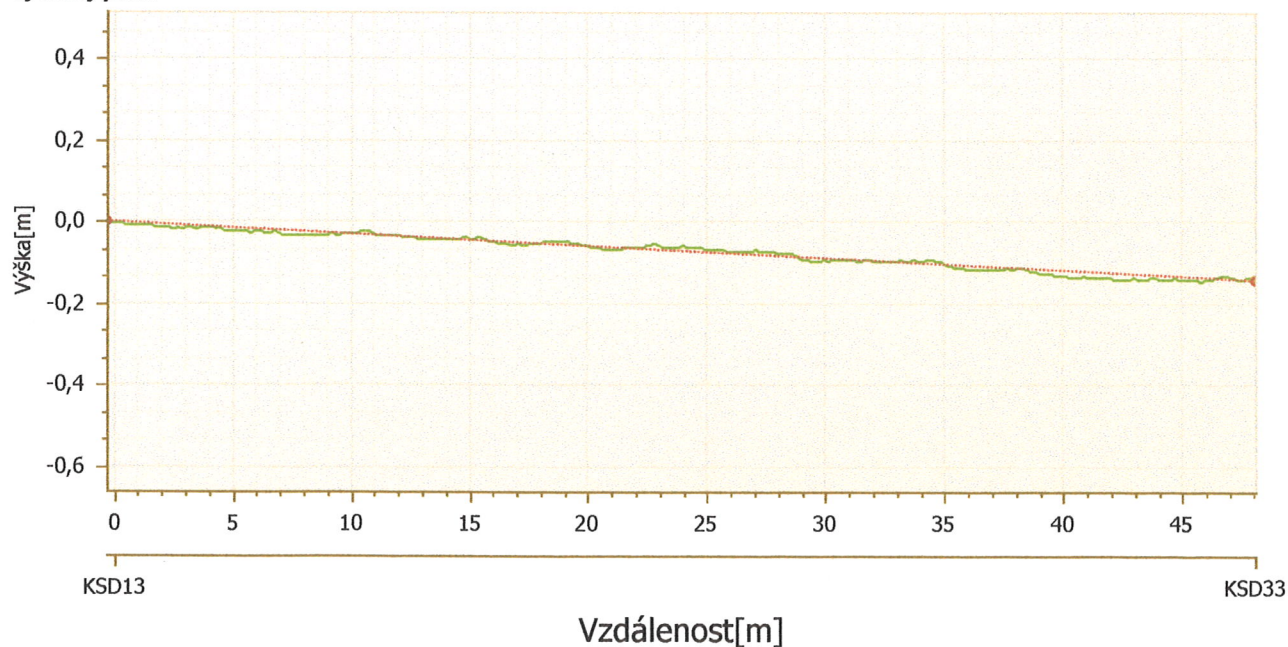
Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD13	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD33	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD13	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu		Operátor
Materiál	polyetylen	Délka úseku	Jakub Gajdacz
			48,10 m

Data sklonu

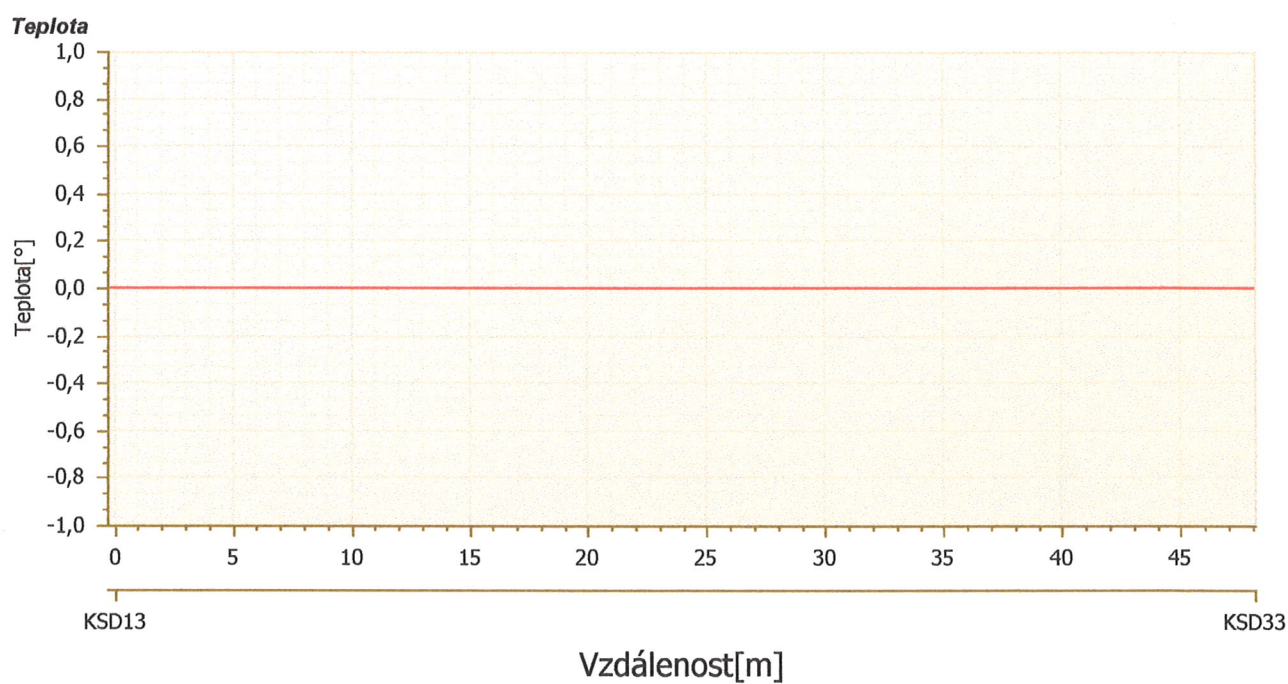


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD13	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD33	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD13	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	48,10 m



Úseková protokol

Úsek **KSD33**

Horní šachta KSD34

Dolní šachta KSD33

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 54,30 m
Druh kanálu systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 1000 mm
Výška 1000 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 31.07.2018

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 54,30 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpusť, atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:03:24	18,60	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 1%
	00:06:52	42,70	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 1%
	00:08:50	54,30	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	KSD33	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD34	Druh kanal	system deštové vody, odtok v otevřeném profilu
Dolní šachta	KSD33		

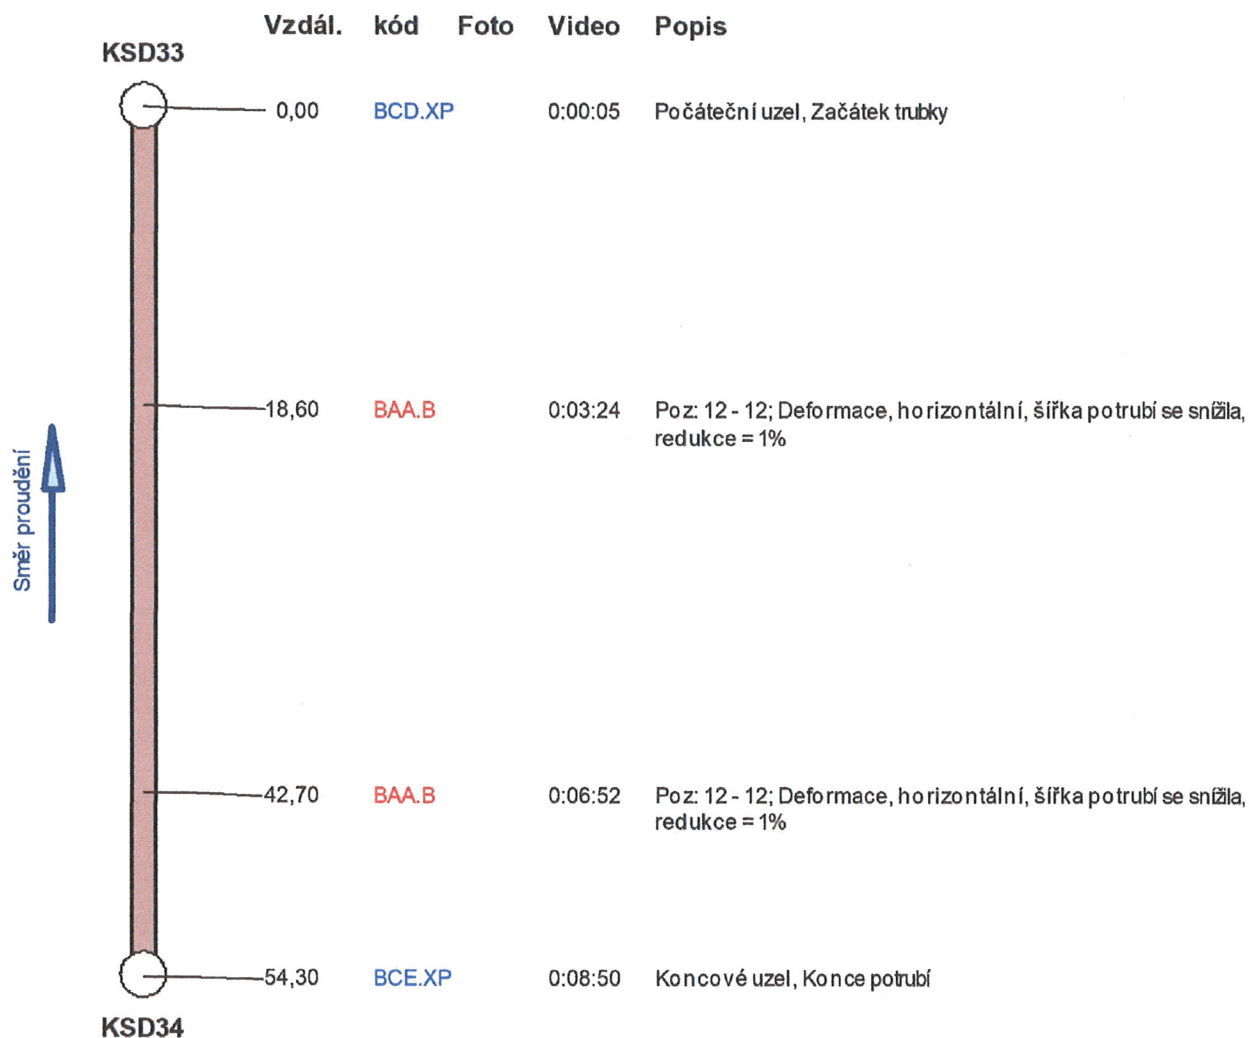
Kmenová data

Délka úseku	54,30 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	1000 / 1000

Inspekce

Insp. délka	54,30 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

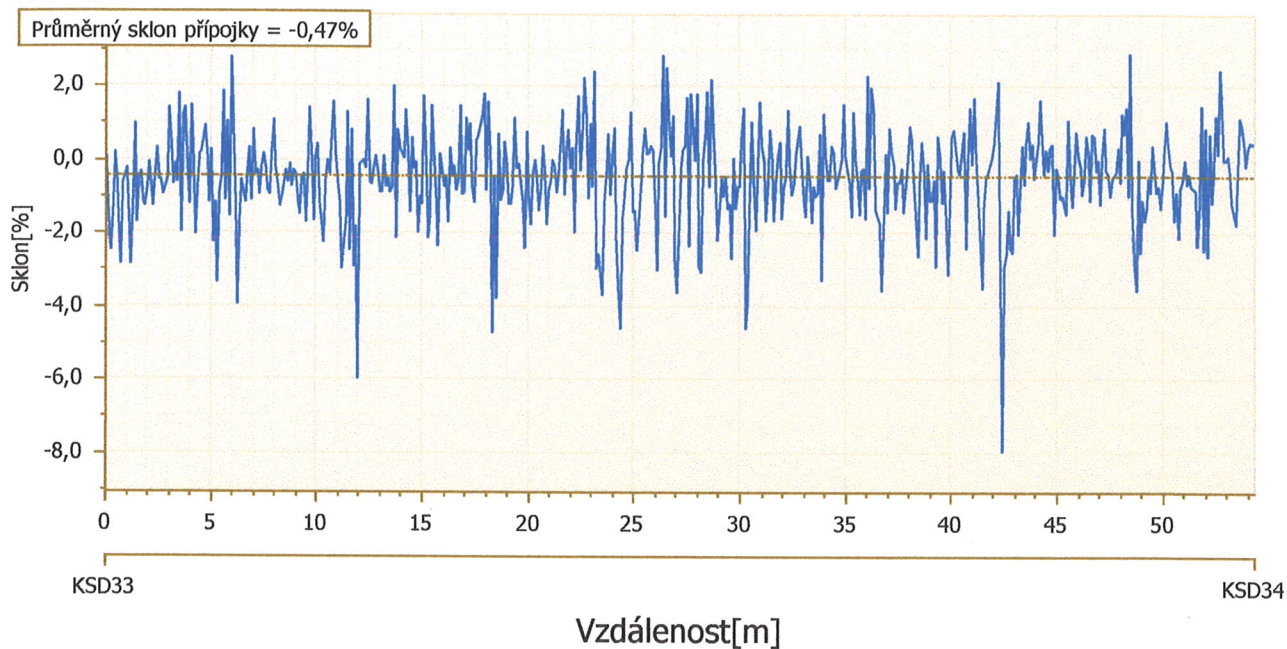
Směr pohledu: ve směru prohlídky



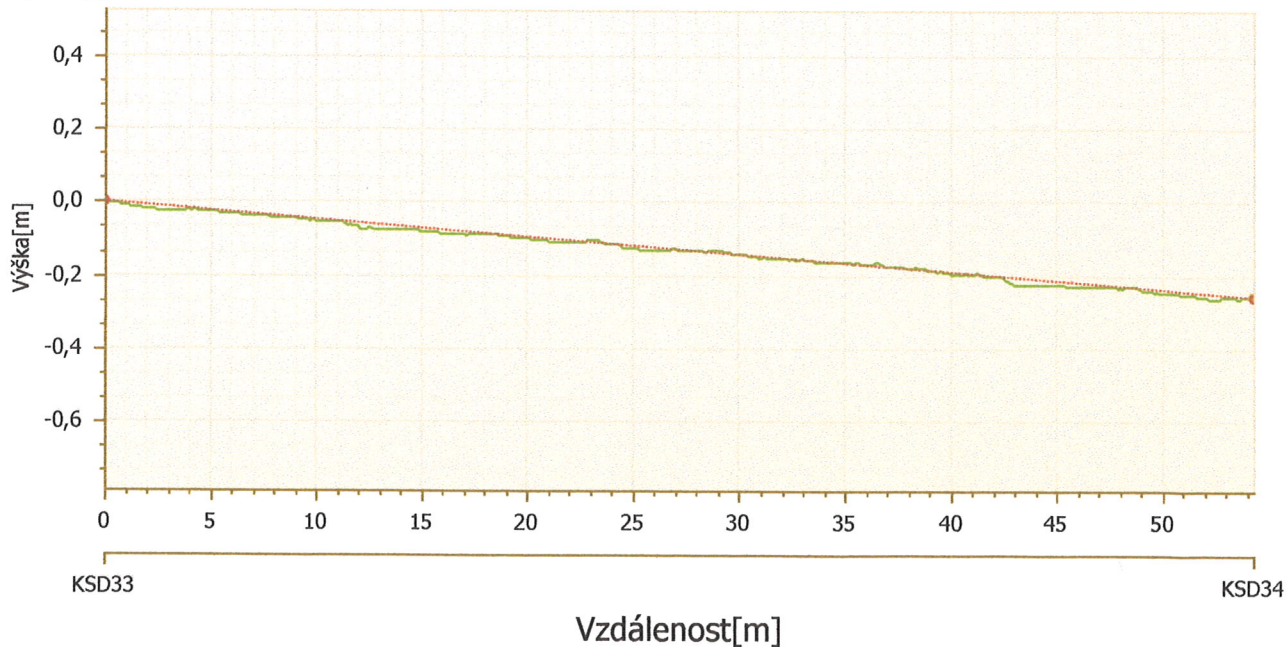
Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD33	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD34	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD33	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	54,30 m

Data sklonu

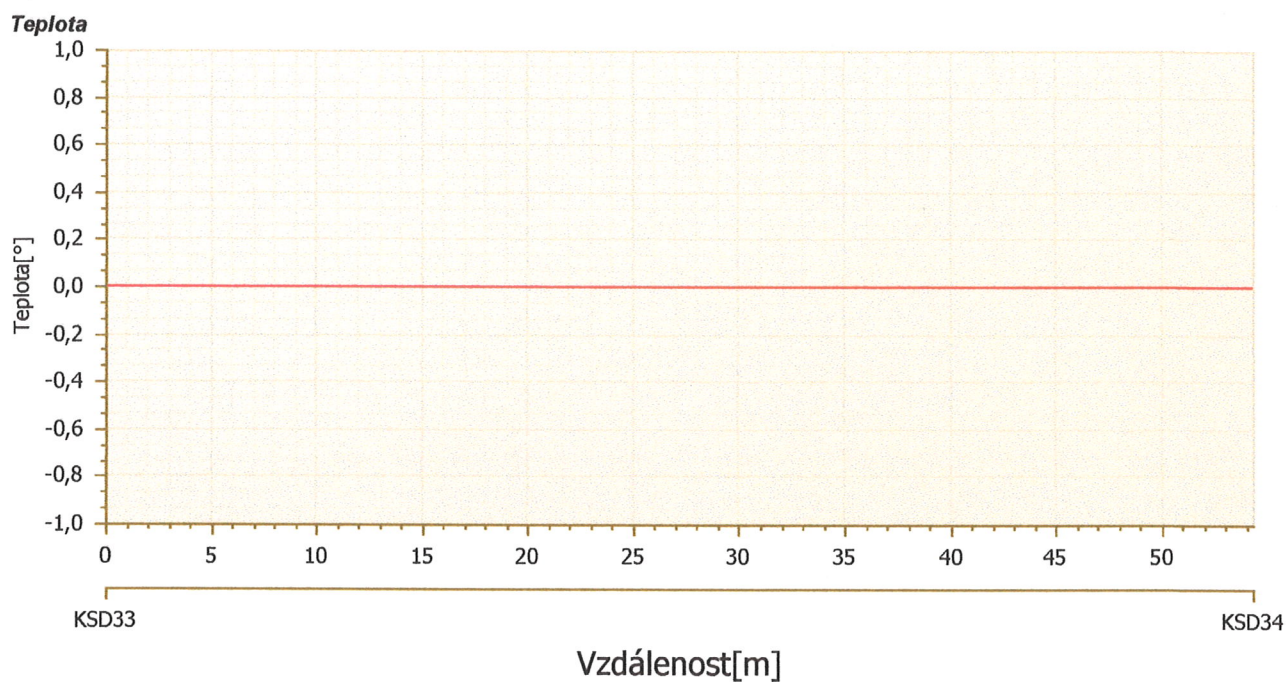


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD33	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD34	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD33	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	54,30 m



Úseková protokol

Úsek **KSD34**

Horní šachta KSD35

Dolní šachta KSD34

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 50,10 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 1000 mm
Výška 1000 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 31.07.2018

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 50,10 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpusť, atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:02:39	12,60	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 1%
	00:06:12	37,00	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 0%
	00:08:15	50,10	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	KSD34	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD35	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Dolní šachta	KSD34		

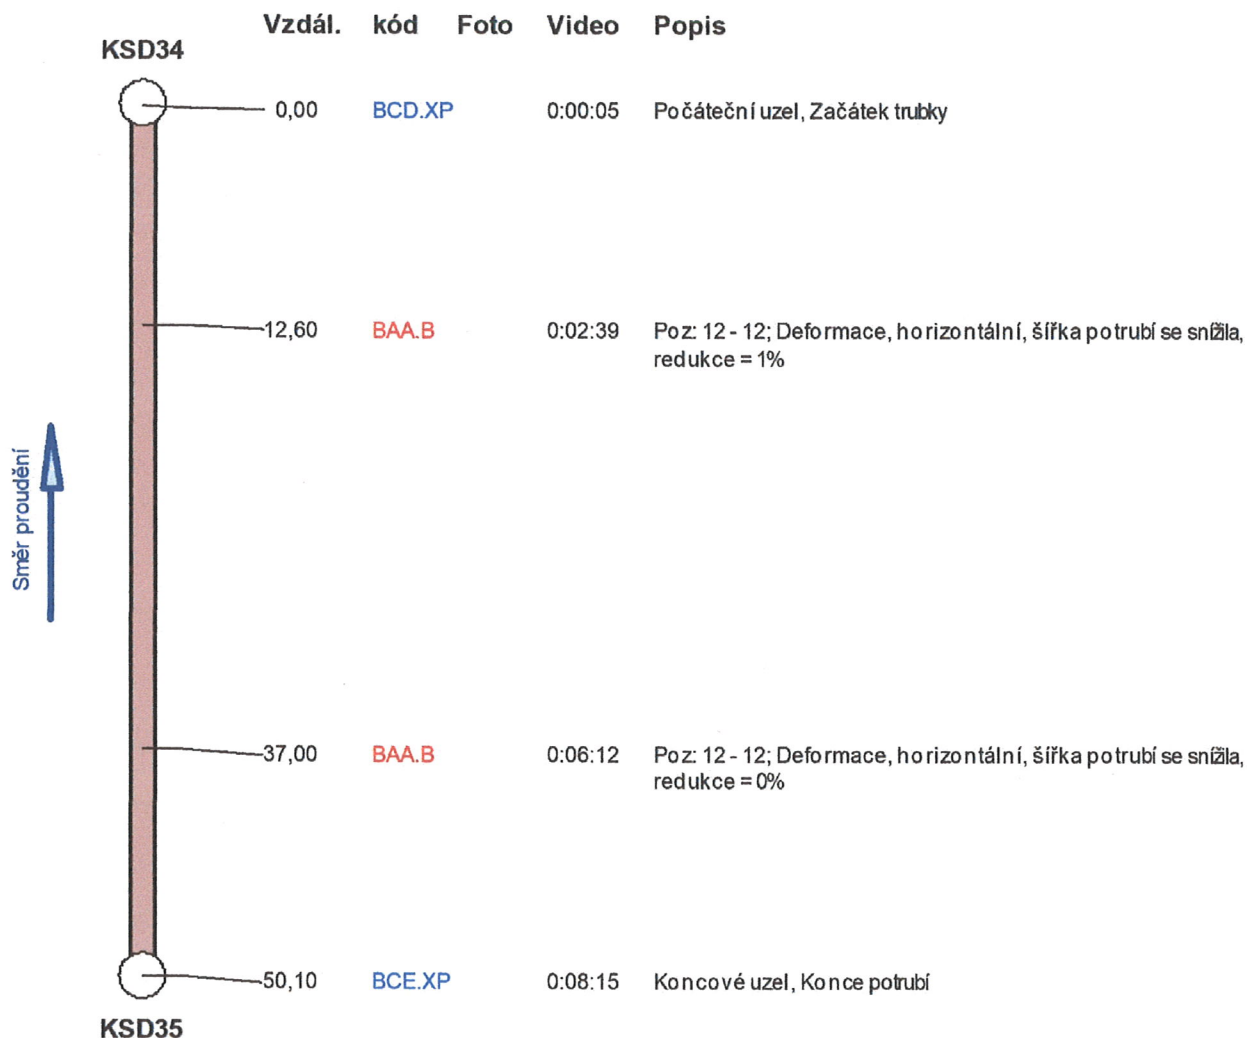
Kmenová data

Délka úseku	50,10 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	1000 / 1000

Inspekce

Insp. délka	50,10 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

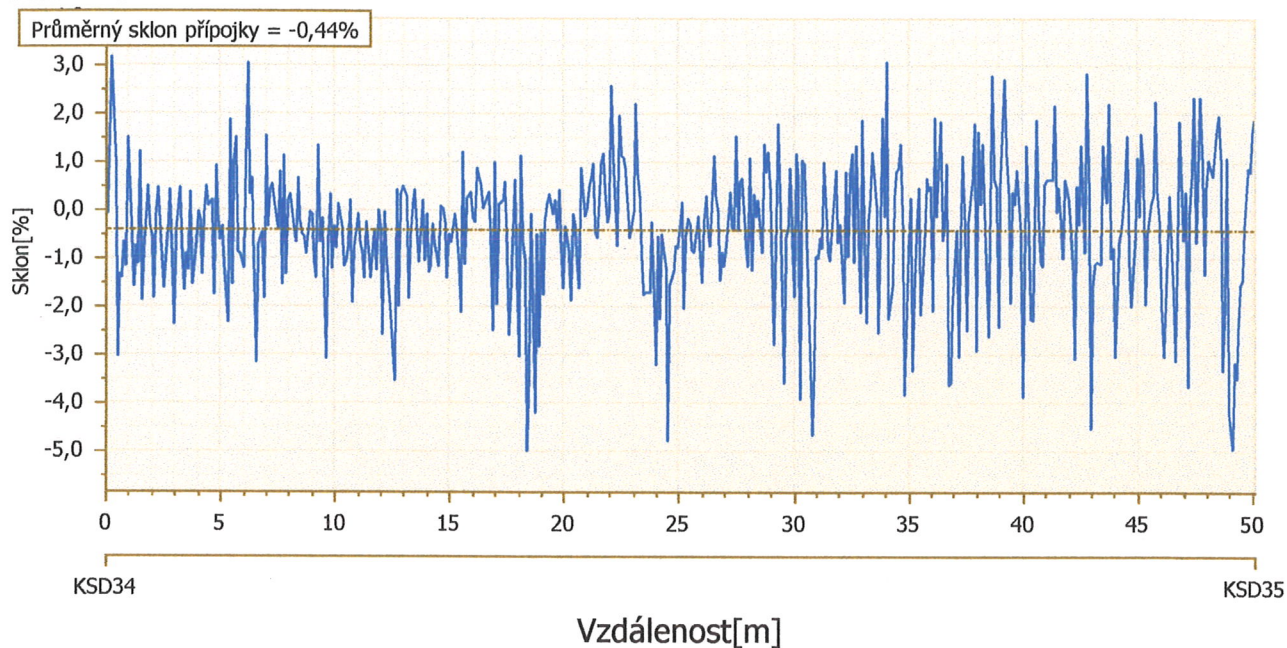
Směr pohledu: ve směru prohlídky



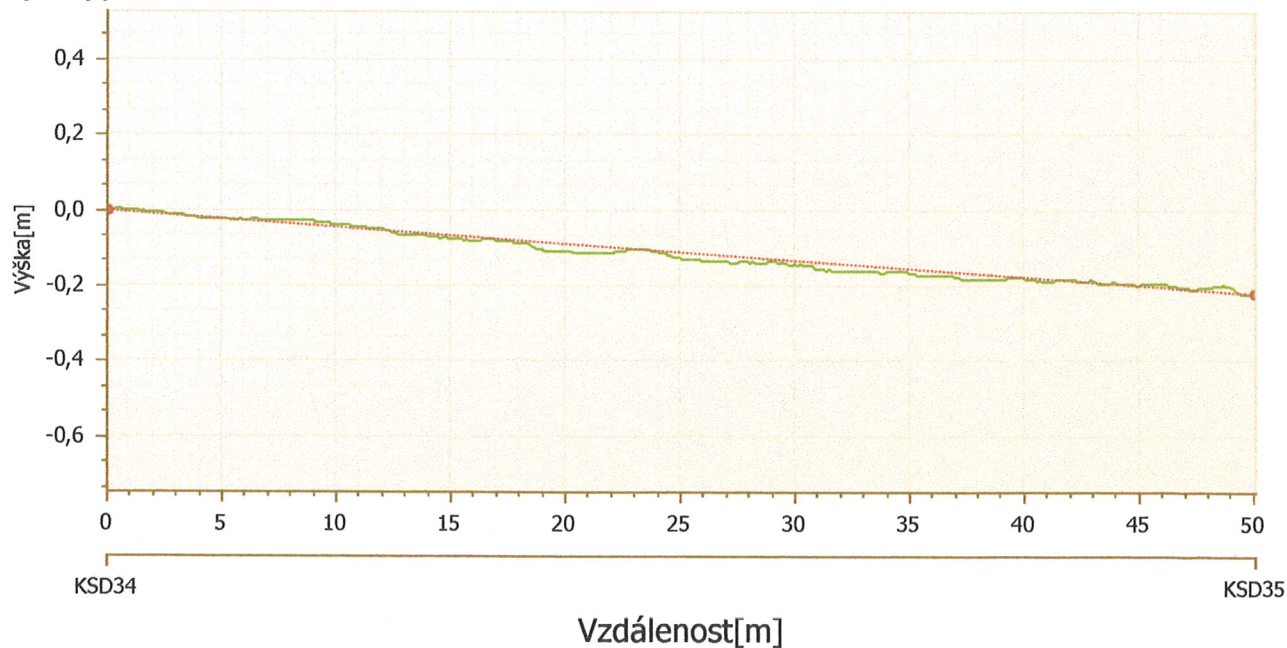
Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD34	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD35	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD34	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu		Operátor
Materiál	polyetylen	Délka úseku	Jakub Gajdacz
			50,10 m

Data sklonu

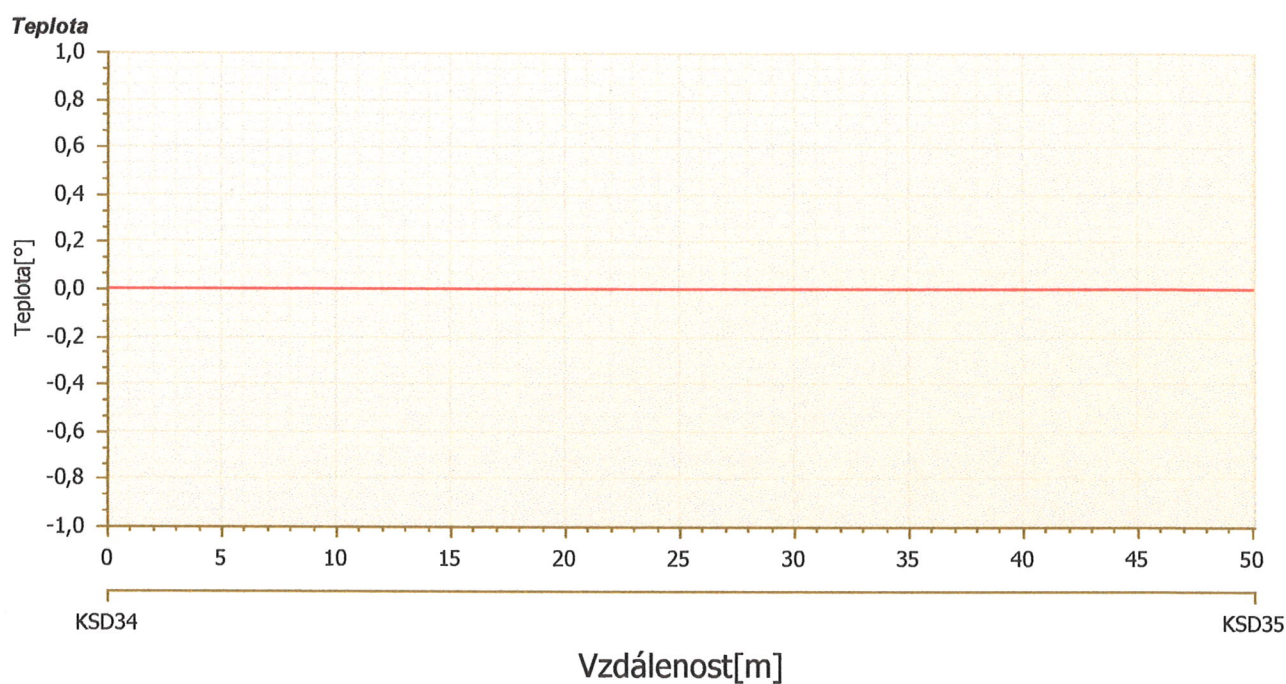


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD34	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD35	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD34	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	50,10 m



Úseková protokol

Úsek **KSD35**

Horní šachta KSD36

Dolní šachta KSD35

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 53,50 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 1000 mm
Výška 1000 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 31.07.2018

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 53,50 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpušť, atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:02:36	12,70	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 0%
	00:06:00	37,00	BAA.B		Poz: 12 - 12; Deformace, horizontální, šířka potrubí se snížila, redukce = 1%
	00:08:32	53,50	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	KSD35	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD36	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Dolní šachta	KSD35		

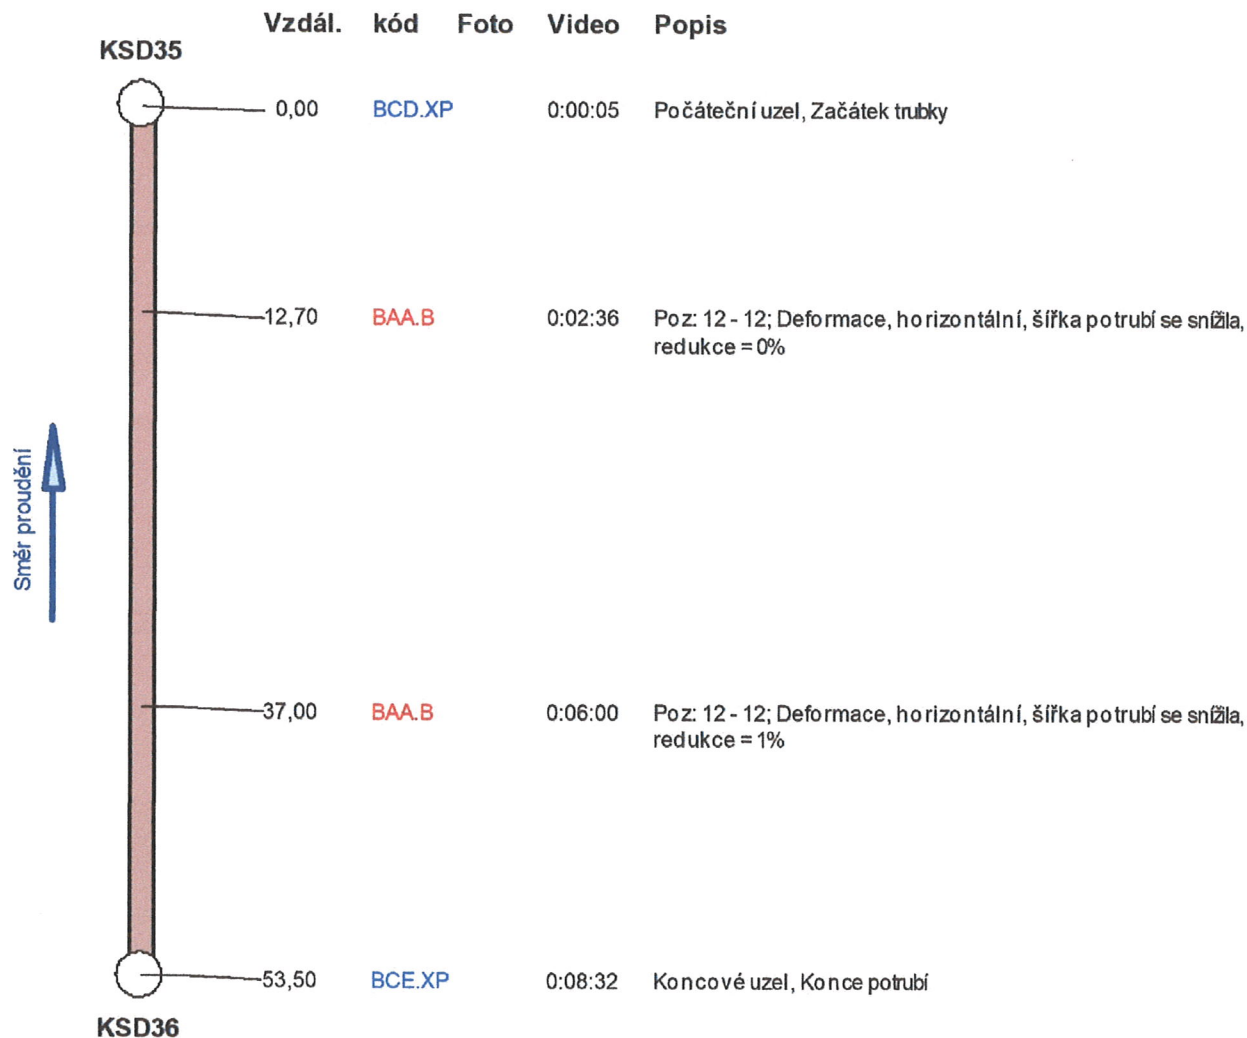
Kmenová data

Délka úseku	53,50 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	1000 / 1000

Inspekce

Insp. délka	53,50 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

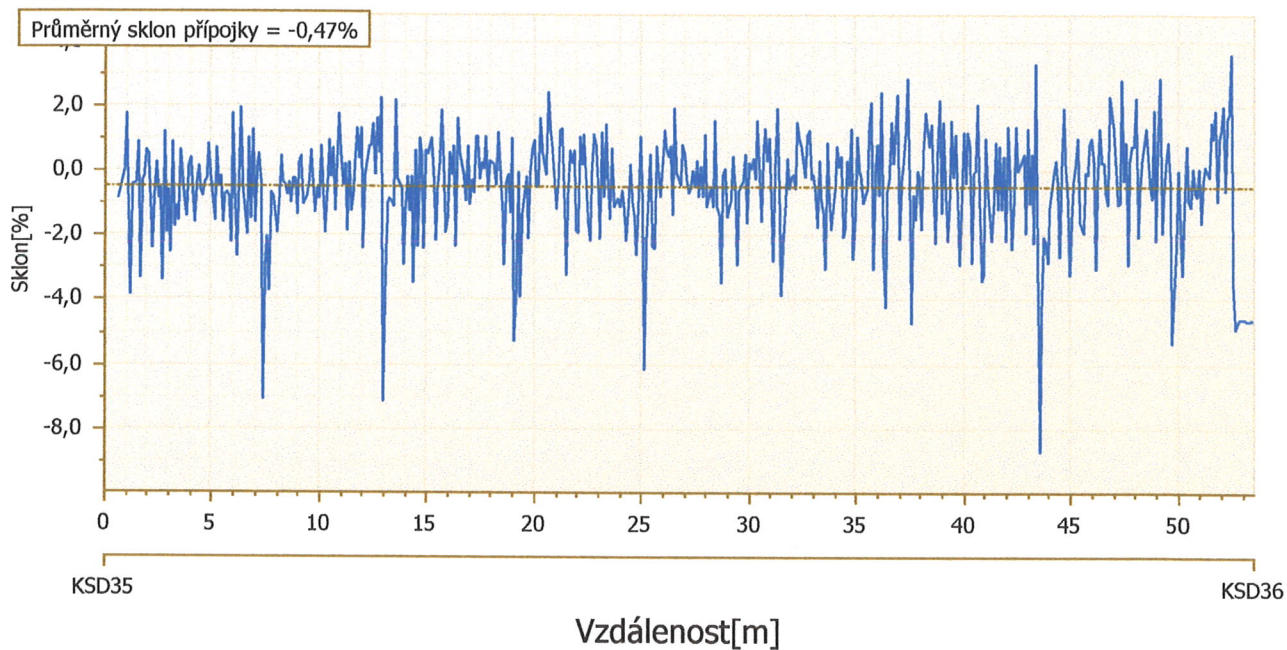
Směr pohledu: ve směru prohlídky



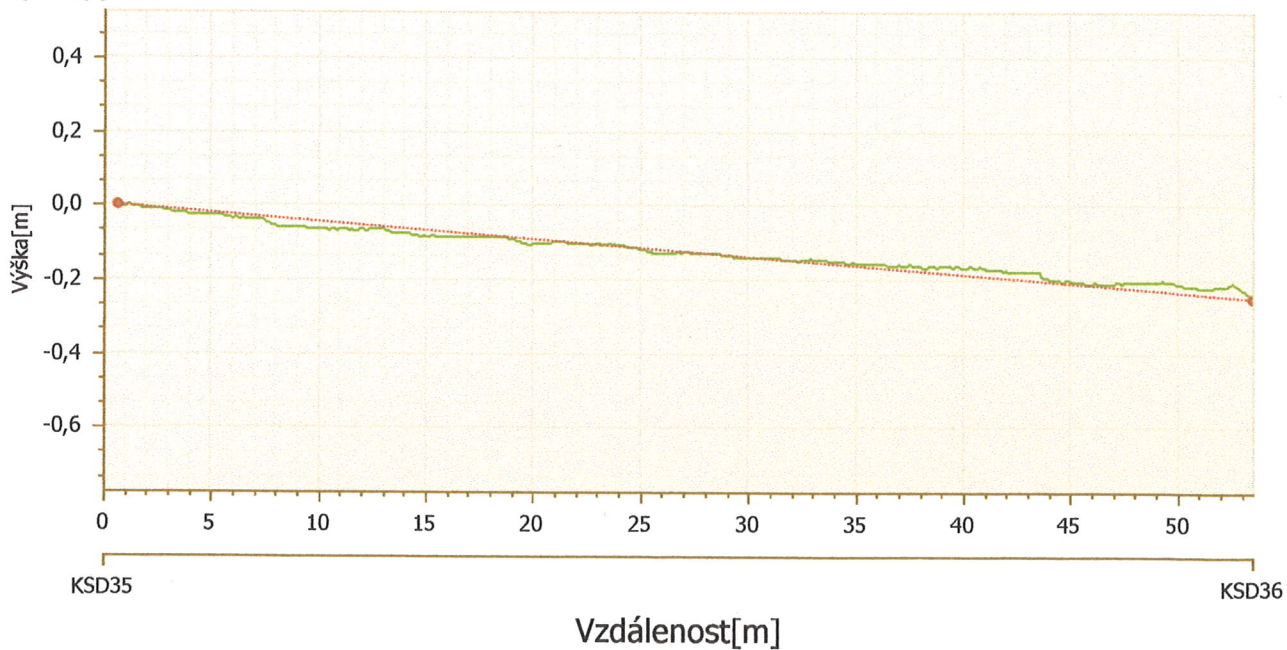
Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD35	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD36	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD35	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	53,50 m

Data sklonu

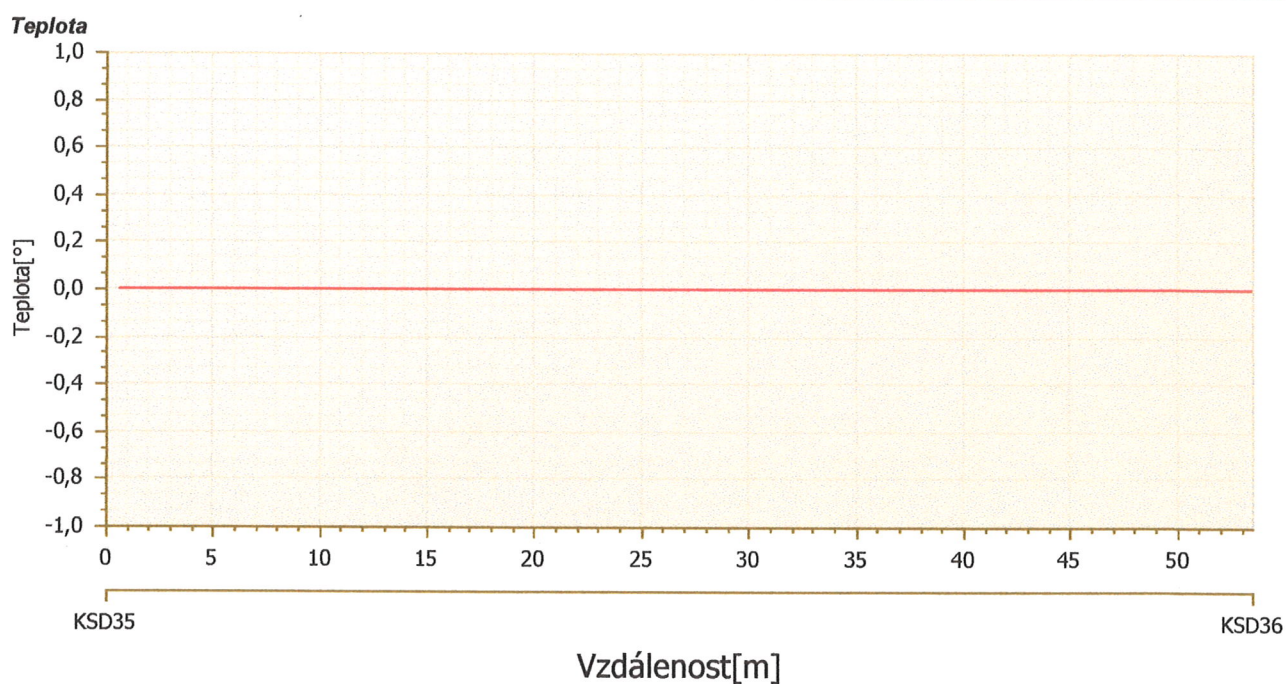


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	KSD35	Datum insp	31.07.2018
Horní šachta	KSD36	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD35	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	53,50 m



Přípojky - statistika

07.08.2018 - 07.08.2018

Rozměr: 500 mm / 500 mm

Datum	Úsek	Ulice	Materiál	Insp. délka [m]	Dim [mm]	Fota
07.08.2018	Kšd37	SO 517	PE-polyetylen	9,60	500 / 500	0
07.08.2018	Kšd38	SO 517	PE-polyetylen	9,40	500 / 500	0
07.08.2018	kšd39	SO 517	PE-polyetylen	9,80	500 / 500	0
07.08.2018	Kšd40	SO 517	PE-polyetylen	9,80	500 / 500	0

Rozměry pro Rozměr: 500 mm / 500 mm

Počet	Úseky	4 ks	Součet délek	Úseky	38,60 m
	Inspekce	4 ks		Inspekce	38,60 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	8 ks			
	Fota	0 ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	4 ks	Součet délek	Úseky	38,60 m
	Inspekce	4 ks		Inspekce	38,60 m
	Protilehlé monit.	0 ks		Protilehlé monit.	0,00 m
	Stanice	8 ks			
	Fota	0 ks			

Úseková protokol

Úsek
Horní šachta Kšd37
Dolní šachta KSD33

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 9,60 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 500 mm
Výška 500 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 07.08.2018

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 9,60 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:01:54	9,60	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	Kšd37	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd37	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok v
Dolní šachta	KSD33		otevřeném profilu

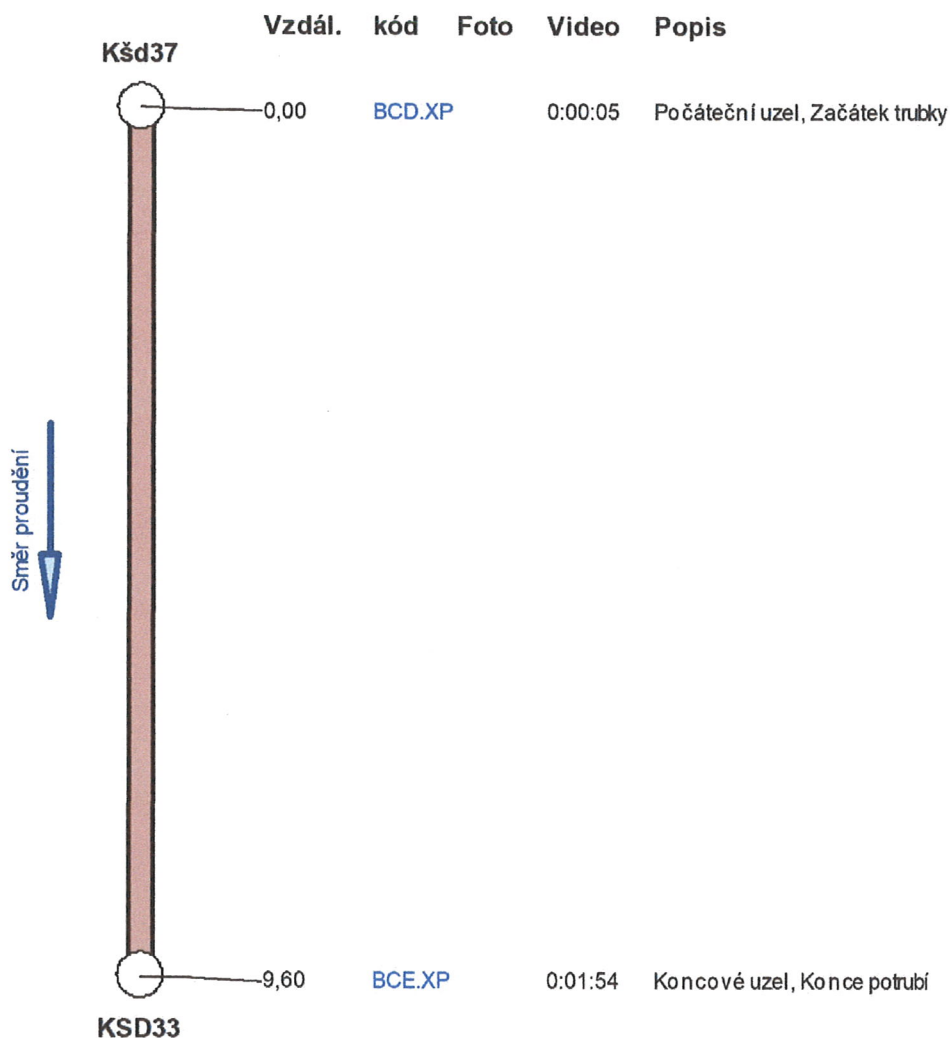
Kmenová data

Délka úseku	9,60 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	500 / 500

Inspekce

Insp. délka	9,60 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

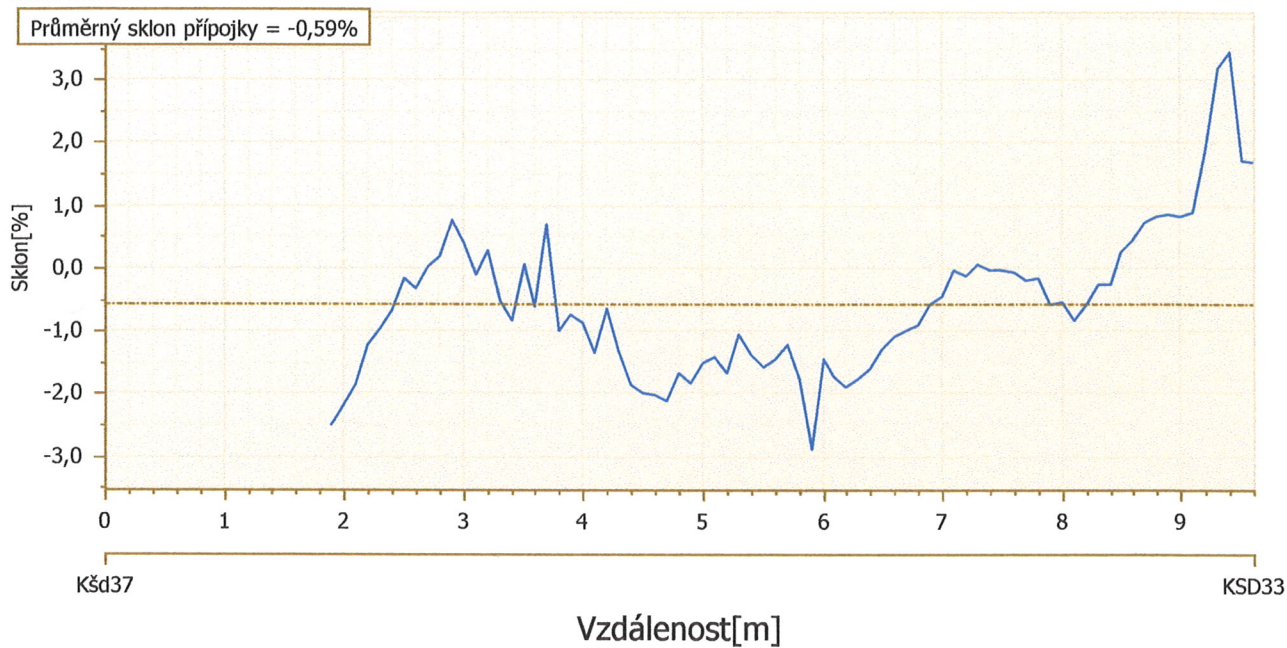
Směr pohledu: ve směru prohlídky



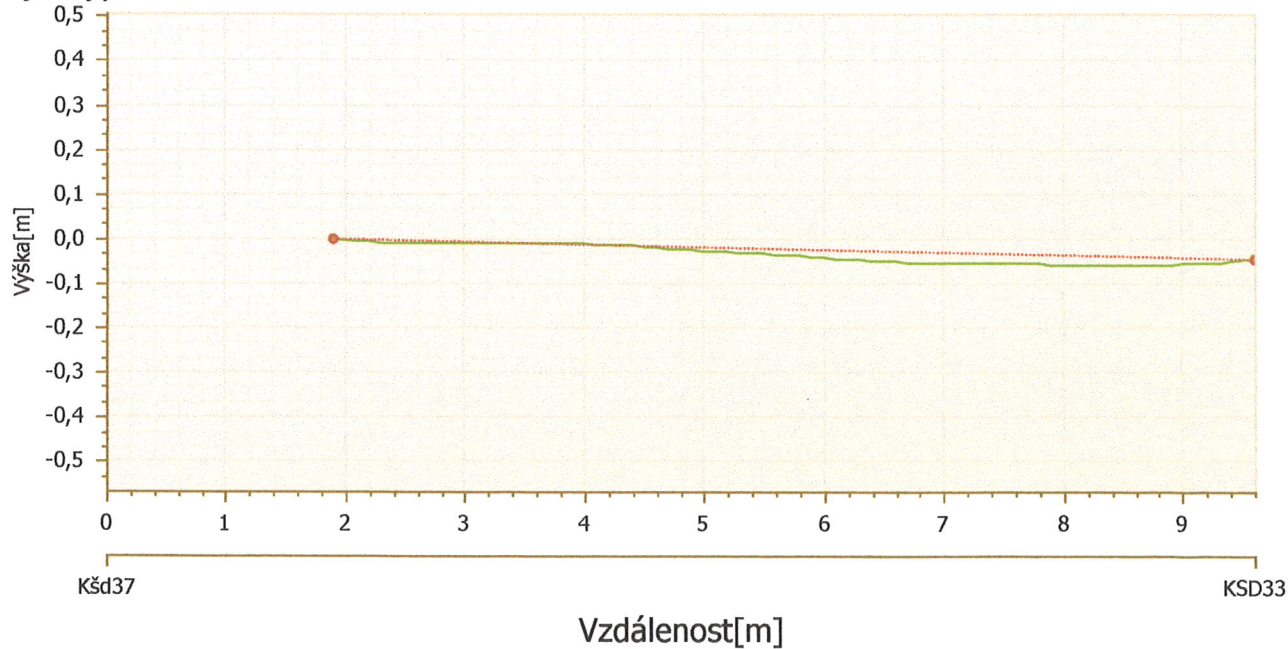
Měření sklonu a teploty

Úsek	Kšd37	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd37	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD33	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,60 m

Data sklonu

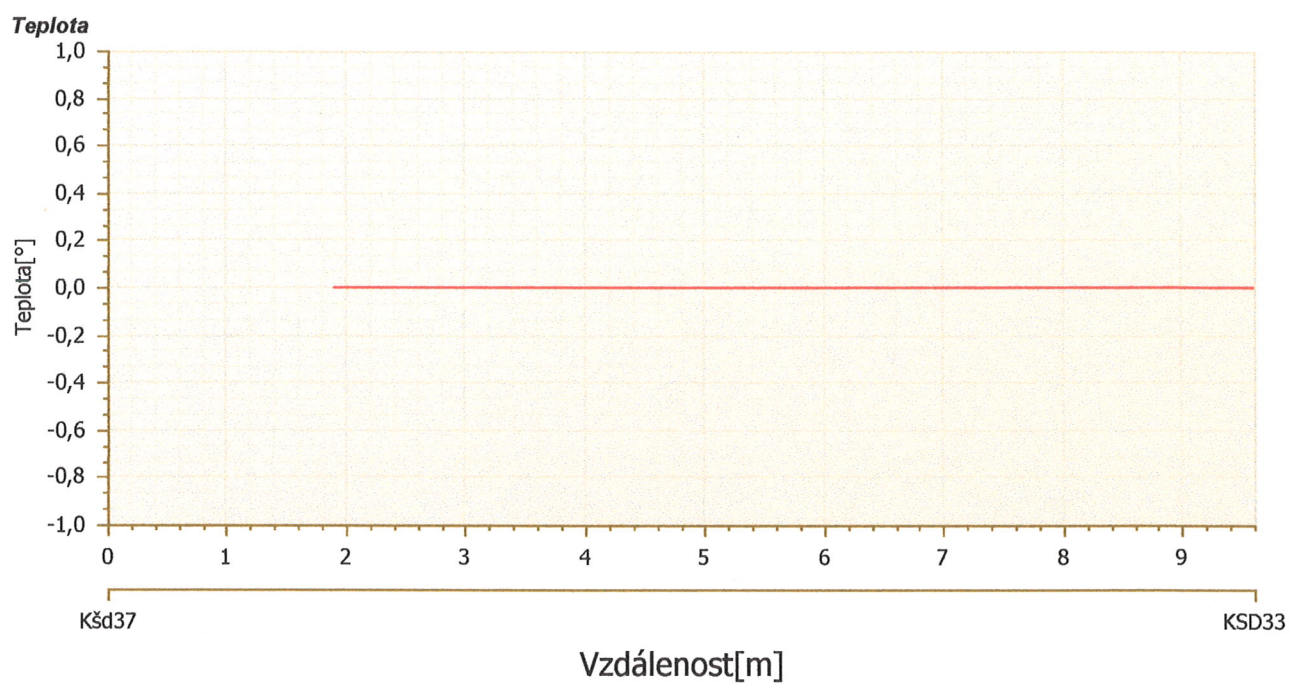


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	Kšd37	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd37	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD33	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,60 m



Úseková protokol

Úsek **Kšd38**
Horní šachta Kšd38
Dolní šachta KSD34

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 9,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 500 mm
Výška 500 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 07.08.2018

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 9,40 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust, atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:02:14	9,40	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	Kšd38	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd38	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok v
Dolní šachta	KSD34		otevřeném profilu

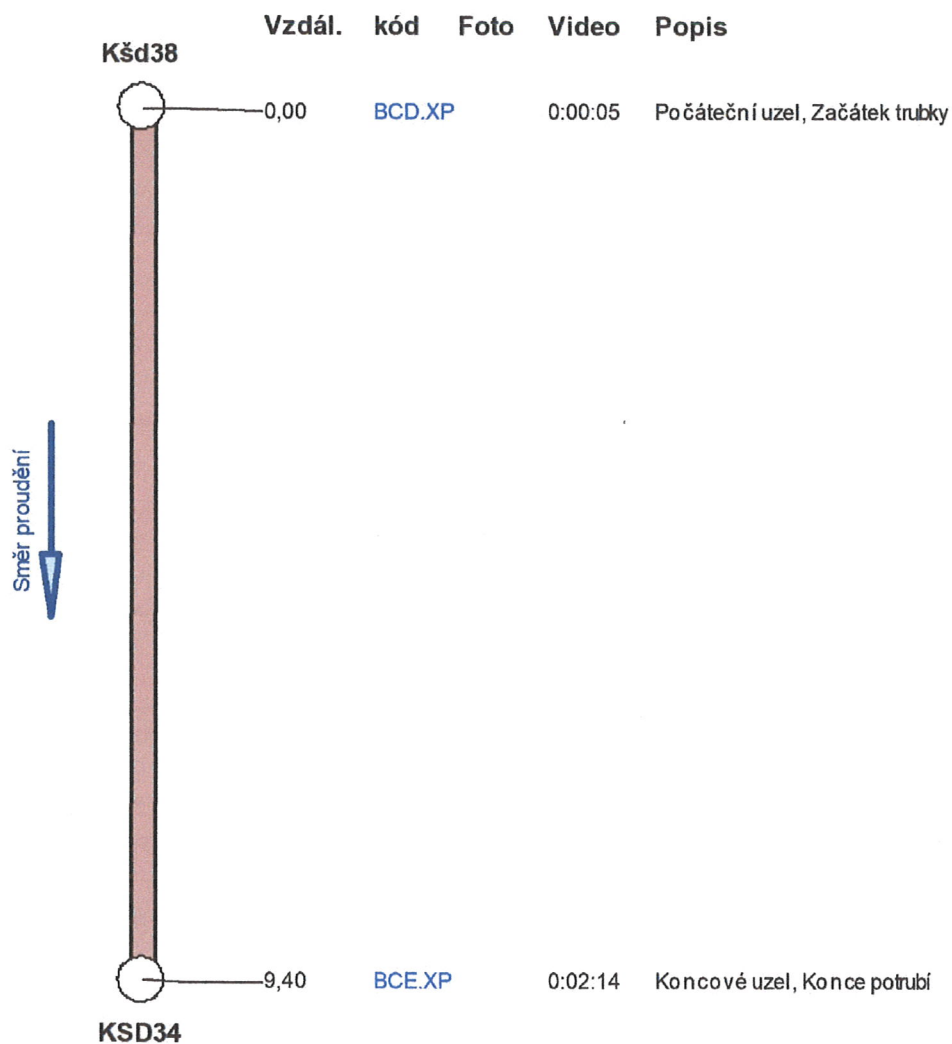
Kmenová data

Délka úseku	9,40 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	500 / 500

Inspekce

Insp. délka	9,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

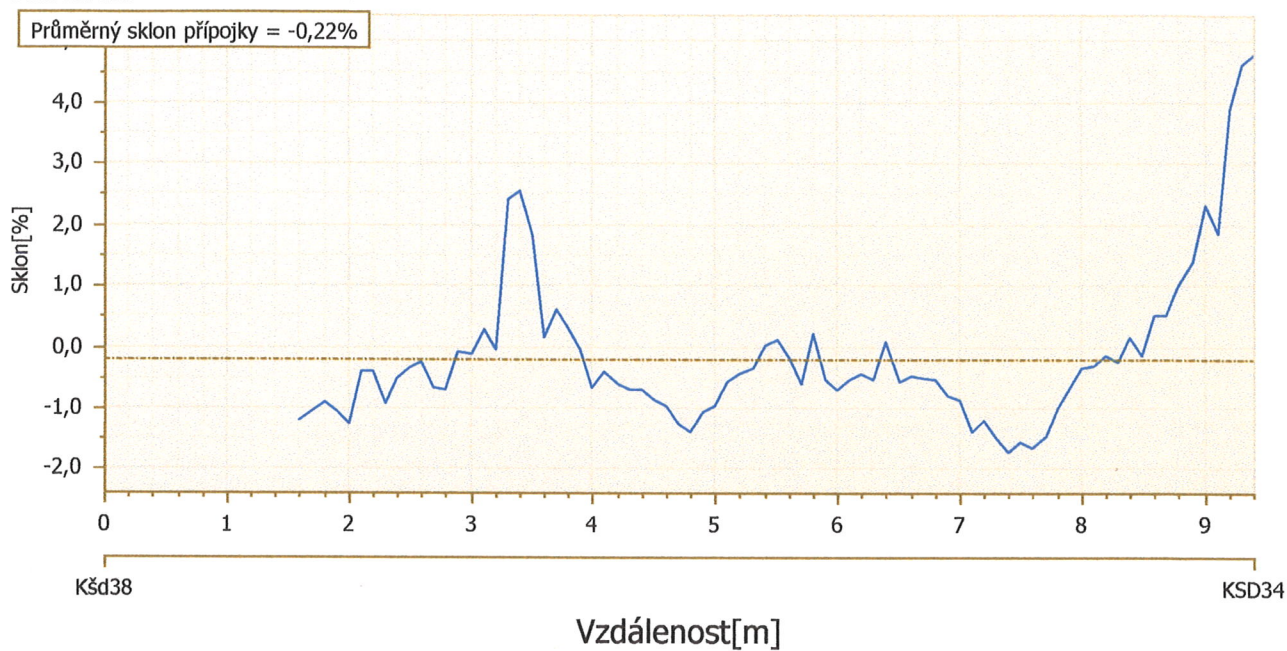
Směr pohledu: ve směru prohlídky



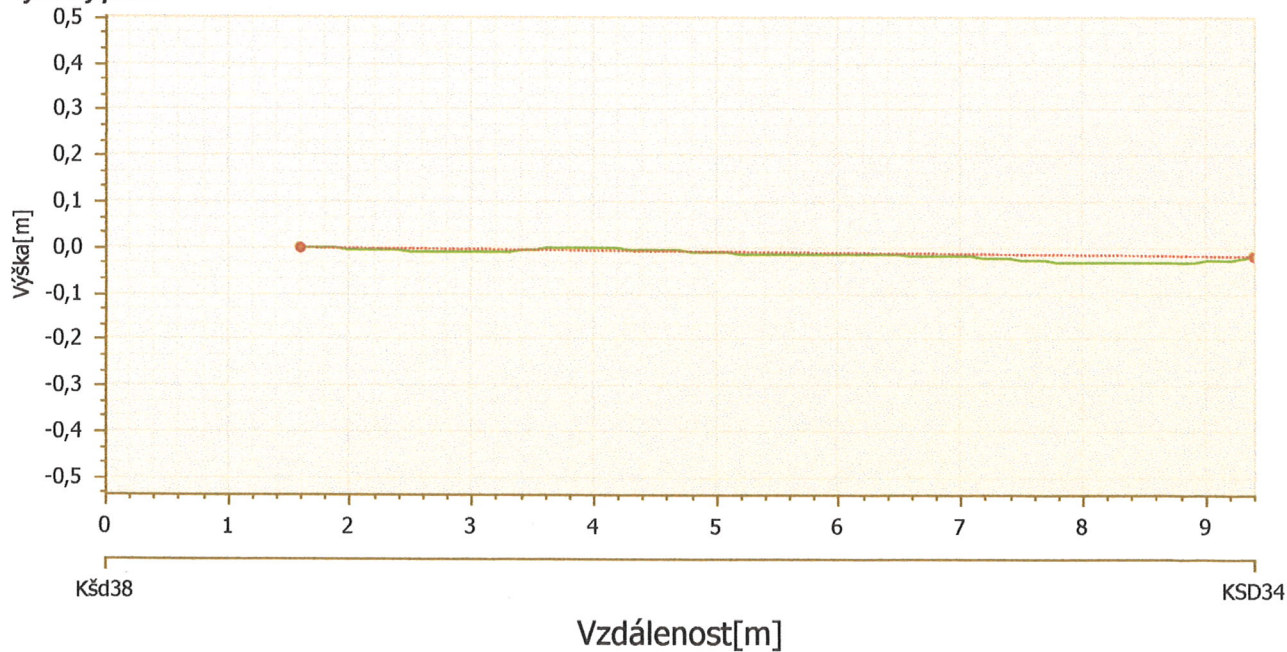
Měření sklonu a teploty

Úsek	Kšd38	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd38	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD34	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,40 m

Data sklonu

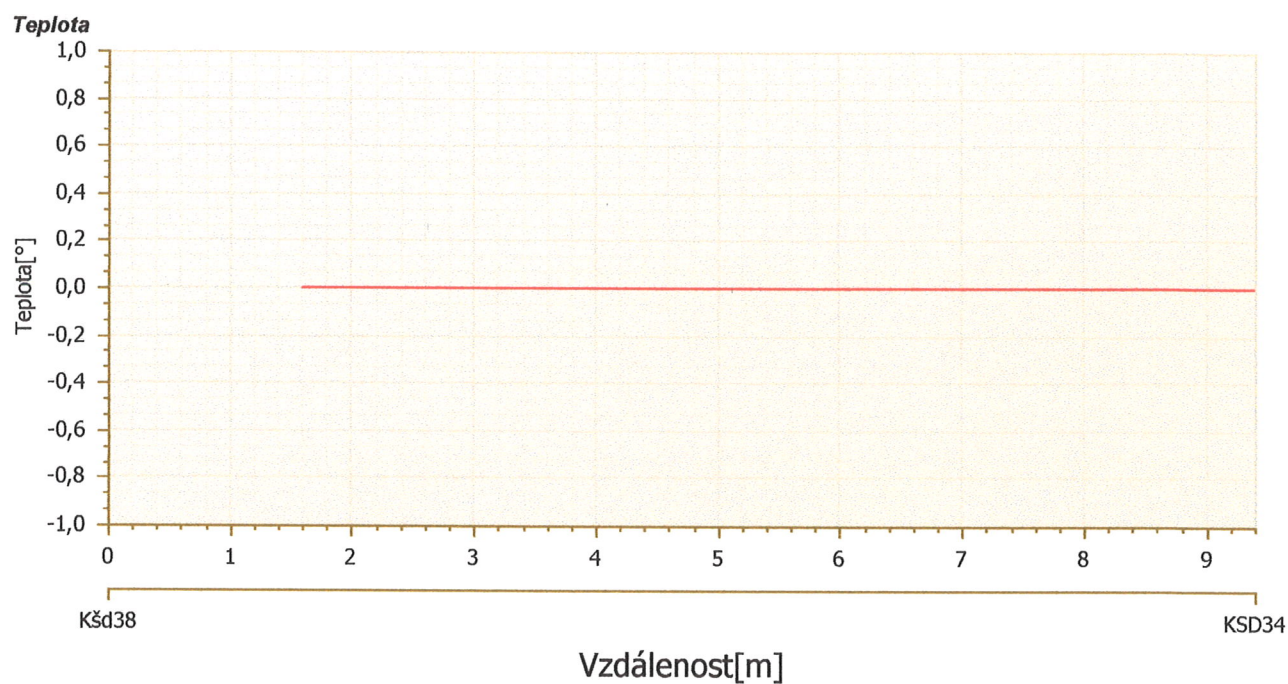


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	Kšd38	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd38	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD34	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,40 m



Úseková protokol

Úsek **kšd39**

Horní šachta kšd39

Dolní šachta KSD35

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 9,80 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 500 mm
Výška 500 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 07.08.2018

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 9,80 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpusť, atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:02:04	9,80	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	kšd39	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	kšd39	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Dolní šachta	KSD35		

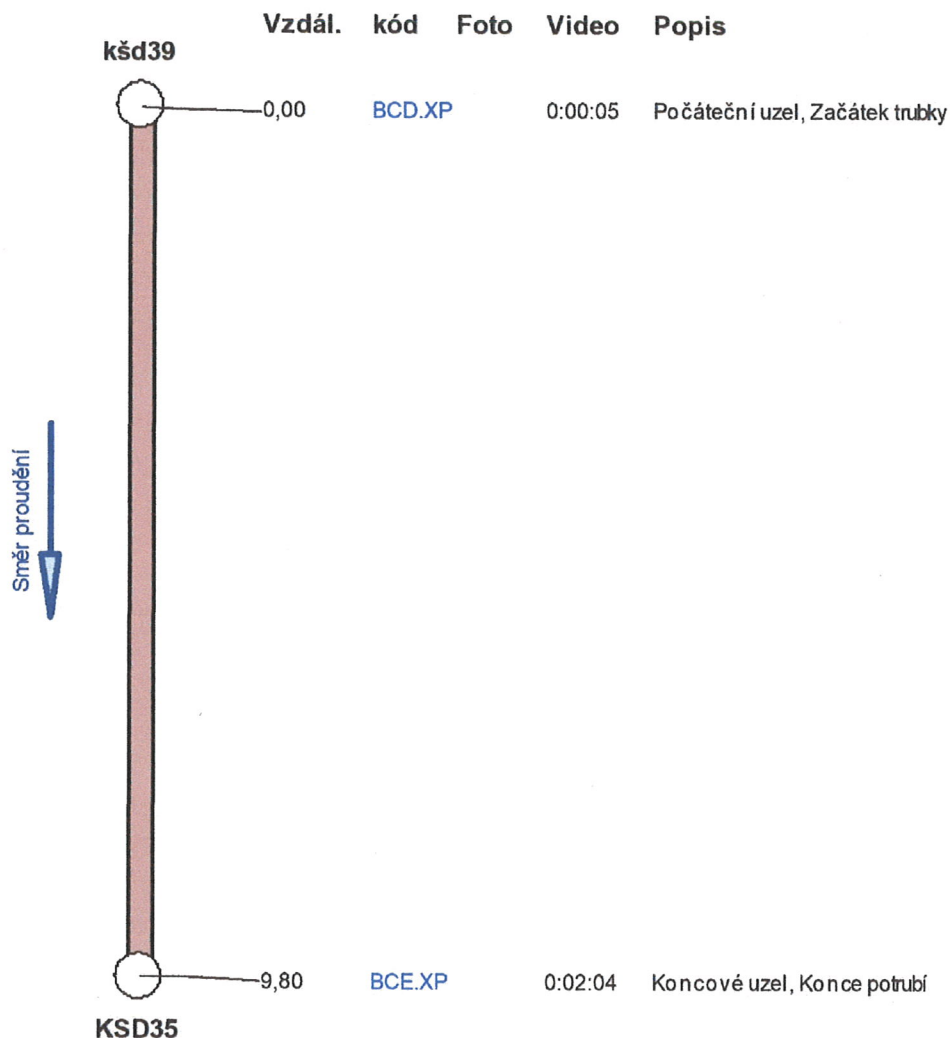
Kmenová data

Délka úseku	9,80 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	500 / 500

Inspekce

Insp. délka	9,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

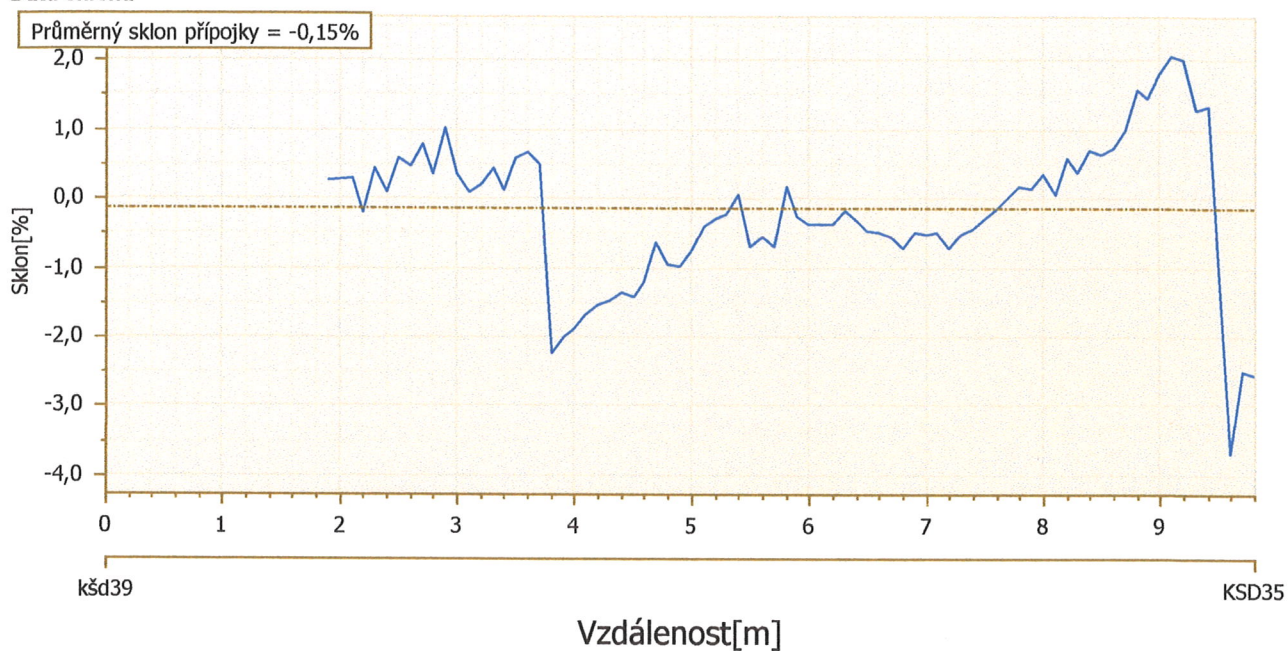
Směr pohledu: ve směru prohlídky



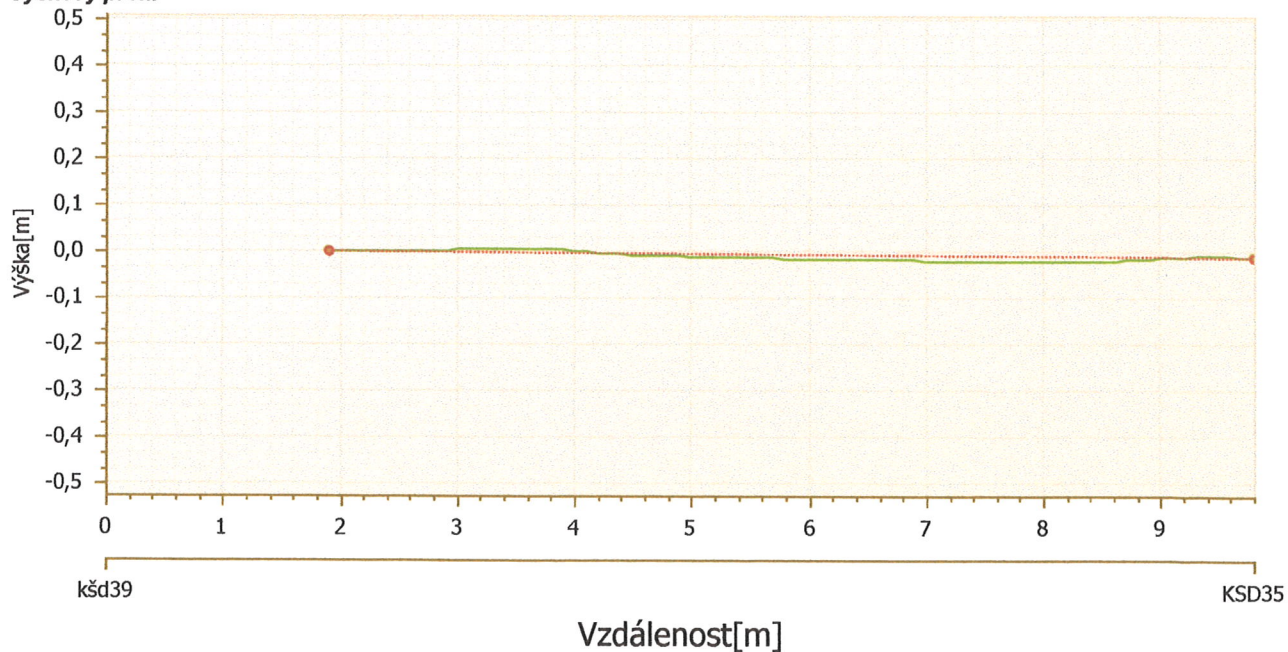
Měření sklonu a teploty

Úsek	kšd39	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	kšd39	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD35	Výška dna dole	
Druh kanal	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,80 m

Data sklonu

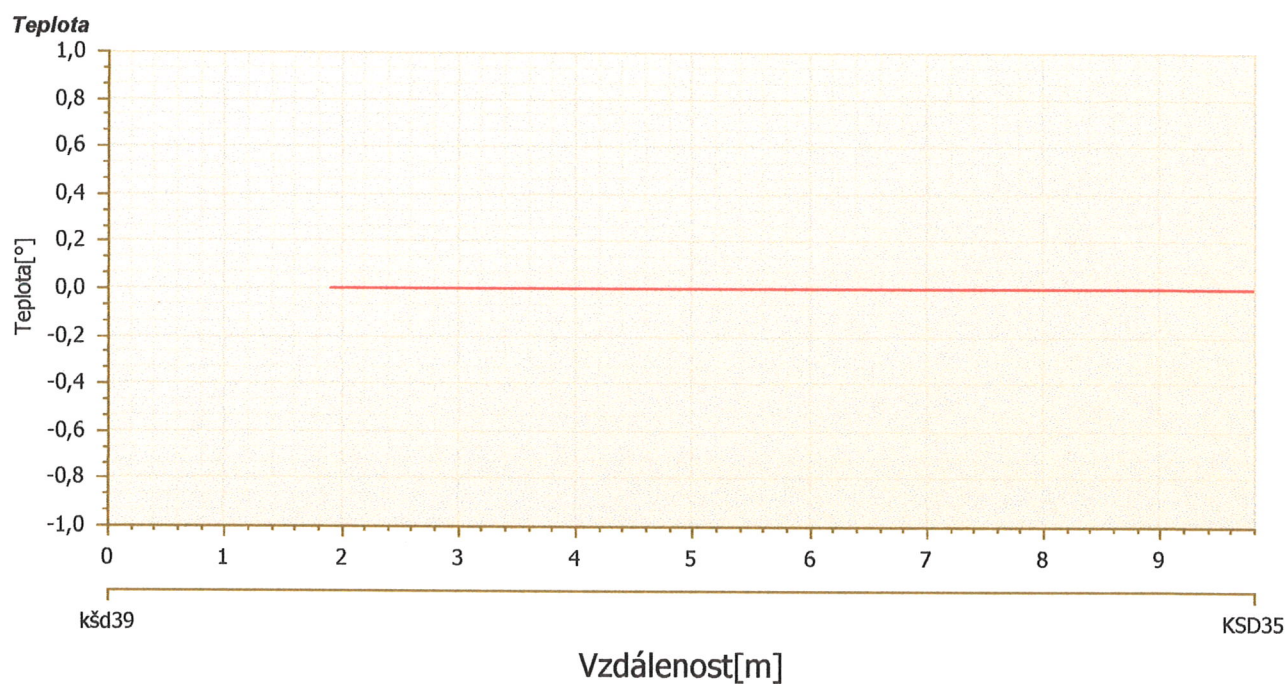


Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	kšd39	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	kšd39	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD35	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,80 m



Úseková protokol

Úsek Kšd40

Horní šachta Kšd40
Dolní šachta KSD36

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 9,80 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu
Rok výroby
Materiál polyetylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra, Dolné hony
Ulice SO 517
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 500 mm
Výška 500 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 07.08.2018

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 9,80 m
Vzdál. referenčního bodu vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpusť, atd.)
druh inspekce kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Jakub Gajdacz
Počasí bez srážek
Teplota
Čištění
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky
	00:01:59	9,80	BCE.XP		Koncové uzel, Konce potrubí

Grafika úseku

Úsek	Kšd40	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd40	Druh kanal	system dešťové vody, odtok v
Dolní šachta	KSD36		otevřeném profilu

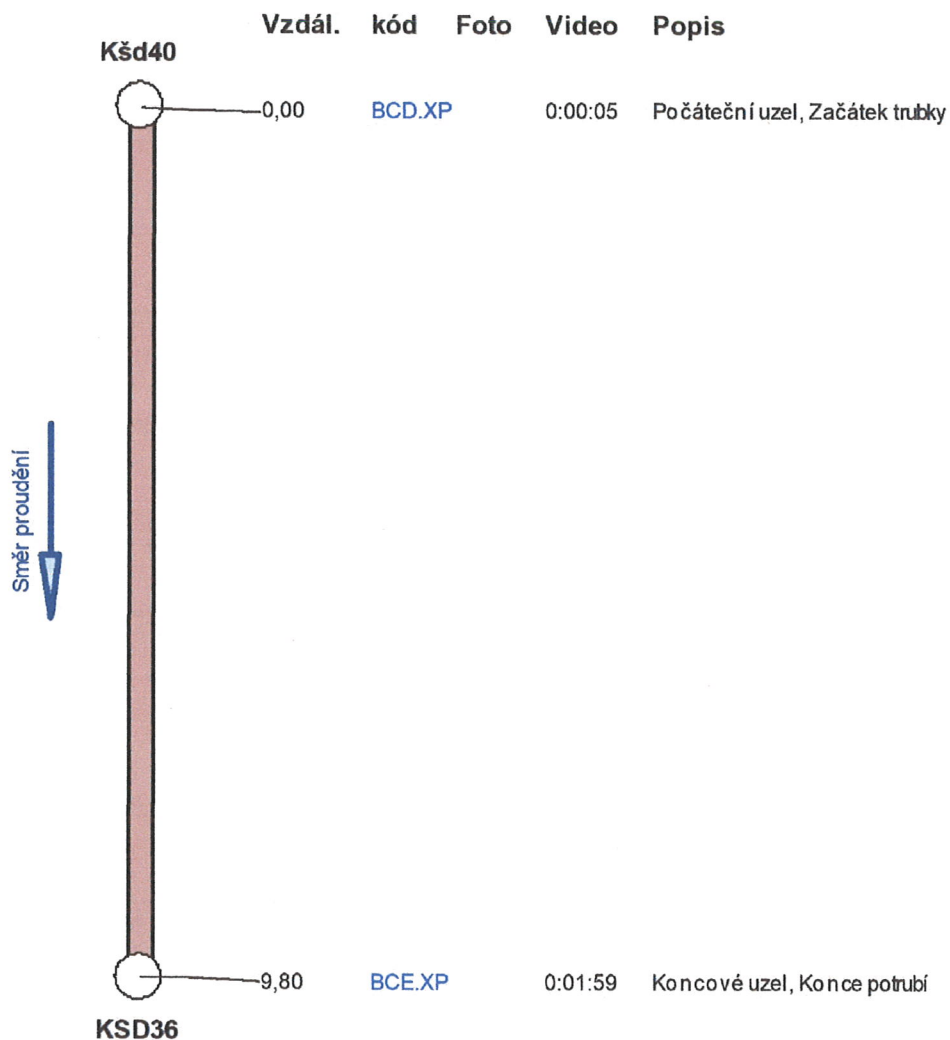
Kmenová data

Délka úseku	9,80 m
Místní část	Nitra, Dolné hony
Ulice	SO 517
Materiál	polyetylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	500 / 500

Inspekce

Insp. délka	9,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Jakub Gajdacz
Nosič dat	
Komentář	

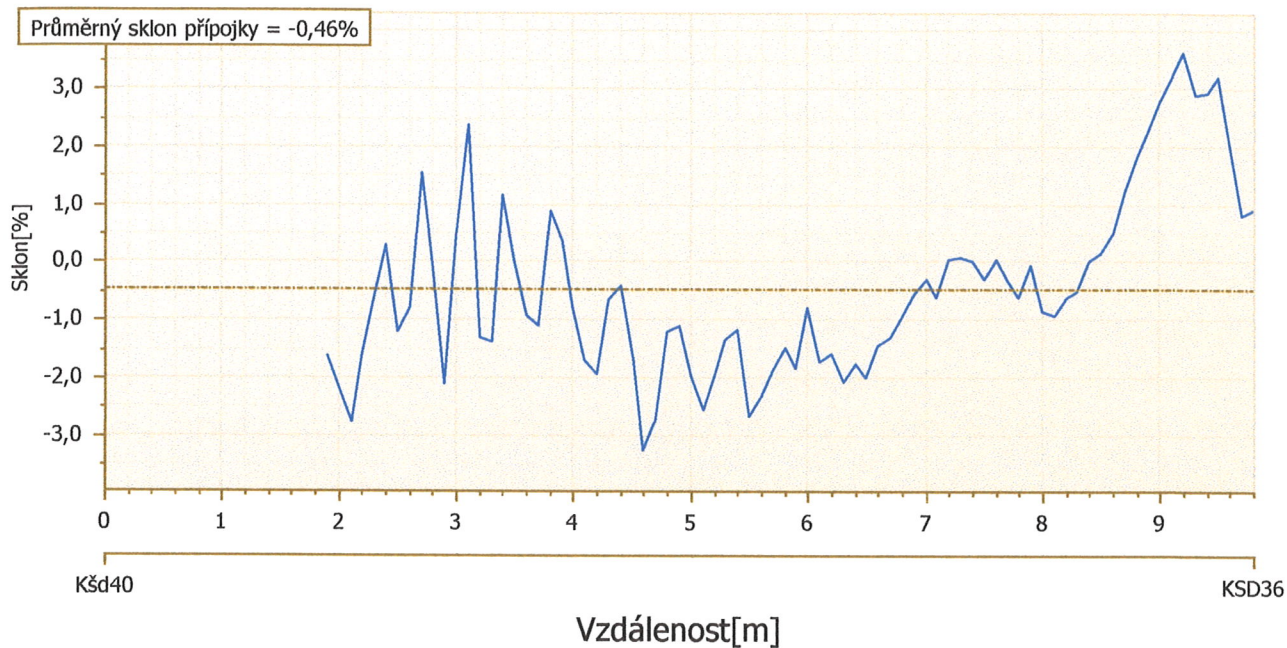
Směr pohledu: ve směru prohlídky



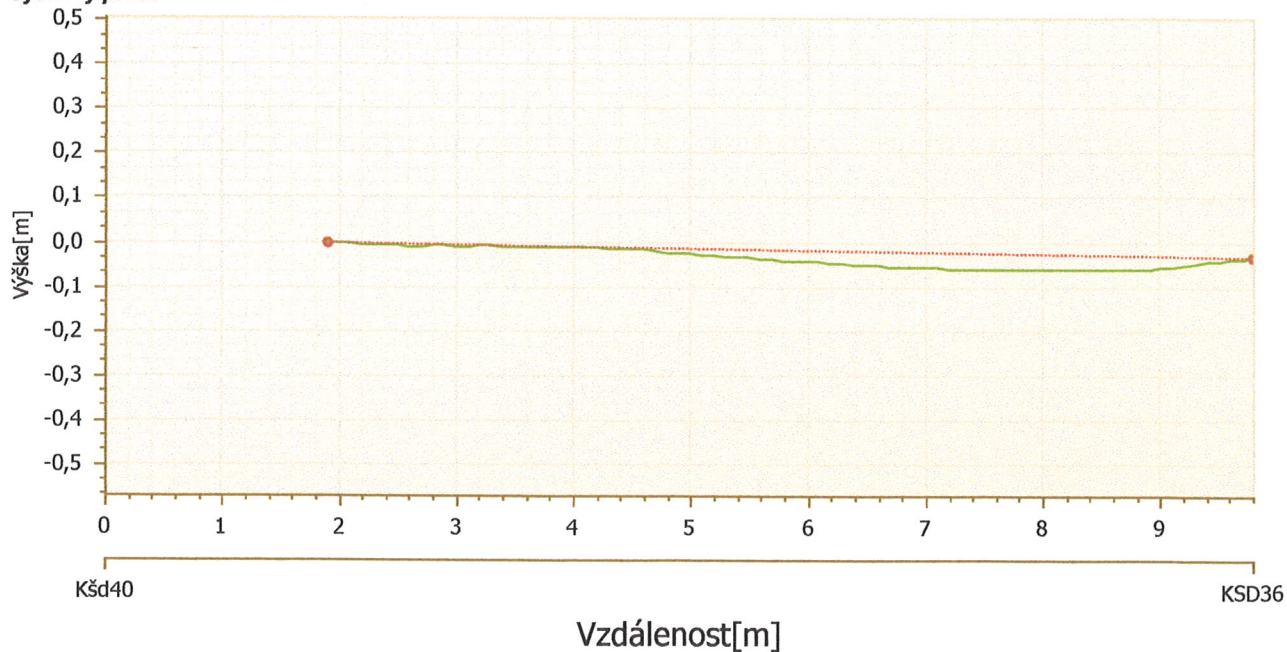
Měření sklonu a teploty

Úsek	Kšd40	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd40	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD36	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,80 m

Data sklonu



Výškový profil



Měření sklonu a teploty

Úsek	Kšd40	Datum insp	07.08.2018
Horní šachta	Kšd40	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	KSD36	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok v otevřeném profilu	Operátor	Jakub Gajdacz
Materiál	polyetylen	Délka úseku	9,80 m

